



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2015



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
Eğitilmesi olacaktır.”*

M. Atatürk



İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME.....	11
1-Misyon ve Vizyon.....	11
2-Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	12
3-Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	14
3.1-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi.....	14
3.2-2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	15
4-Yatırım Uygulamaları.....	21
4.1-Genel Yatırım Uygulamaları.....	21
4.2-Yetırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	22
III-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	23
1-Eğitim Sektörü.....	23
2-Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü.....	27
3-Sağlık Sektörü.....	27
4-DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü.....	28
IV-ÖNERİLER.....	29
V-TABLolar.....	30



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısarak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2014 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %58'i Eğitim, %28'i Sağlık, %14'ü Bilimsel Teknoloji Araştırma, ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2014 yılı yatırım programı ile üniversitemiz nezdinde yürütülen 8 proje karşılığı 31.720.000.- TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten hazine yardımı olarak 26.650.000.- TL, öz gelir karşılığı 5.070.000.- TL ödenek öngörülmüştür.

2014 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 8.776.000. TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden Hastane makine-teçhizat alımına 4.000.000.TL ödenek aktarılmıştır. Yılsonu toplam ödeneğimiz 44.496.000.- TL olmuştur. Ödeneğimizin 38.890.000.-TL'si harcanmış, 5.607.000.- TL si yılsonu itibarıyla harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 88'dir.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Faruk KOCACIK
Rektör



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II-GENEL DEĞERLENDİRME

Vizyon

Bölgenin geleceğinin şekillenmesinde rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktadır.

Misyon

Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, sorgulayan, araştıran, çözümleyen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2-Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Eğitim-öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek.

HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak

HEDEF 1.2: Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak

HEDEF 1.3: Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak

HEDEF 1.4: Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek

HEDEF 1.5: Eğitim programlarını modern üniversite eğitiminin gereklerine göre geliştirmek

Stratejik Amaç 2

Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak.

HEDEF 2.1: Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

HEDEF 2.2: Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek

HEDEF 2.3: Kütüphane imkanlarını ve elektronik yayınlara erişimi artırmak

HEDEF 2.4: Araştırma laboratuvarlarının altyapı ve donanımı geliştirilerek daha fazla ve daha kaliteli araştırma yapılmasına imkan sağlamak

Stratejik Amaç 3

Yüksek standartlara sahip Kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve Kampüsü kullanan diğer paydaşların yaşam kalitesini artırmak.

HEDEF 3.1: Kampüsteki sosyal, kültürel ve sportif olanakları geliştirerek kampüsün gerek öğrenci gerek çalışanlar için uygun bir yaşam ortamı olmasını sağlamak

HEDEF 3.2: Öğrencilerin ve çalışanların barınma ve ulaşım ihtiyaçlarına yaşanabilir bir kampüs içinde çözüm sunmak

HEDEF 3.3: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin kente, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Stratejik Amaç 4

Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Sivas Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel yapısının gelişimine katkıda bulunmak.

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak

Stratejik Amaç 5

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak.

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, belli alanlarda uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak

HEDEF 5.2: Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak

HEDEF 5.3: Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

Stratejik Amaç 6

Üniversitenin amaç ve hedeflerini hayata geçirecek kurumsal yönetim sistemini geliştirmek.

HEDEF 6.1: Bütünleşik yönetim bilgi sistemini ve bilgi işlem altyapısını geliştirmek suretiyle sunulan hizmetin etkinliğini artırmak

HEDEF 6.2: Çalışanların bilgi ve beceri gelişimini sağlamak ve katılımı geliştirmek suretiyle çalışma yaşamında memnuniyeti ve verimliliği artırmak

HEDEF 6.3: Üniversite kaynaklarının mali mevzuata uygun kullanılması yanında etkin, ekonomik ve verimli değerlendirilmesine yönelik mali yönetim sistemini şeffaf bir yönetim anlayışı içinde güçlendirmek



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3-Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Üniversitemiz 5.513 m² üniversite arazisi ve 9.827.694 m² hazinece tahsis edilen arazi üzerinde Merkez Yerleşkesinde; 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane)ile birlikte 23 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca ilçe yerleşkelerinde 52.828 m² kapalı alana sahip 11 Meslek Yüksek Okulu, 2 Yüksekokul ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Belediyesi sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 227 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpiik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık su arıtma tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

252.701m² eğitim, 99.757m² sağlık, 36.161m² barınma, 24.791m² beslenme, 14.725m² kültür, 42.729m² spor, 36.940m² diğer idari bina, tesis, kantin, depo v.b olmak üzere toplam 507.804m² kapalı alana sahip üniversitemizde; 56 adet toplantı salonu, 27 adet konferans salonu, 8 adet 50-250 kişilik amfi, 569 sınıf, 100 bilgisayar laboratuvarı, 174 adet diğer laboratuvarlar olmak üzere 669 adet derslik ile hizmet vermektedir.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2- 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2014 yılında Eğitim Sektörü *Kampus Altyapı* projesi kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için; Kanalizasyon ve Altyapı inşaatı işinde projesinde; Eğitim Fakültesi-İletişim Fakültesi-Cumhuriyet M.Y.O-Veteriner Fakültesi Klinik Binası önü-Sivas M.Y.O-Eczacılık ve Teknoloji Fakültesi-Dış Hekimliği Fakültesi önüne olmak üzere yaklaşık 700



araçlık otopark yapılmıştır. Kampusumuzun 30 yıldır kullanılan ve sorun teşkil etmeye başlayan kanalizasyon şebekesinde yaklaşık 1,5 km yenileme yapılmıştır. Arıtma Tesisi terfi merkezi yenilenmiş, Arıtma tesisi Terfi Merkezi çevre düzenlemesi ve yol bağlantılarının yapılması, ayrıca Arıtma tesisine jeneratör konulmuştur. Enerji

Tasarrufu Yönetmeliği çerçevesinde asansör direkli çevre aydınlatması yapılmıştır. Üniversitemizin 40.yıl Kuruluş yılı nedeniyle, kampusu güzelleştirmek adına bir kısım tretuvarlar, engelli rampaları düzenlenerek yenilenmiştir. Tüm Eğitim bloklarımızın tretuvarları yağmur suyu kanalları



yapılarak yenilenmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu-Lojman yolu arasına stabilize yol bağlantısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önüne yol bağlantısı, Veteriner Fakültesi yol bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca, Bilimsel Araştırma Merkezi Laboratuar binasının etrafına çevre düzenleme ve yol bağlantısı yapılmıştır.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 yılında Eğiti Sektörü *Derslik ve Merkezi Birimler* projesinde 2013 yılında inşaatına başlanılan 3625 m² İlahiyat Fakültesi, 4200 m² Yemekhane Binası ve 6100 m² Edebiyat Fakültesi Ek Bina İnşaatı ile 2012 yılında inşaatına başlanılan 10400 m² Merkezi Araştırma Laboratuar İnşaatı 2014 yılında tamamlanmıştır.

Ayrıca, 2014 yılında ihalesi yapılan 6000 m² Rektörlük Ek Bina, 9000

m² Merkezi Kütüphane ve 6500 m² Mimarlık Fakültesi İnşaatlarının yapımı devam etmektedir. 13000 m² Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İnşaat ihalesi 2014 yılında yapılmış olup, 2015 yılında ihale sonuçlandırılarak yapımına başlanılacaktır. Üniversitemiz toplam kapalı alanı ise yukarıda belirtilen inşaatlar tamamlanarak 507.804 m²'ye ulaşmıştır.



2014 yılında Eğiti Sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında *Büyük Onarım* işinde, Engelsiz bir Üniversite oluşturmak amacıyla, Tüm Fakülteler ile Üniversite Merkez yerleşkesi içerisinde bulunan Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokullarına engelli wc ve rampalar yapımına başlanılmış olup, % 70 aşamasında tamamlanmıştır. 2015



ve 2016 yılında da engelliler yönelik çalışmalar devam edecektir. Ayrıca, engelli öğrencisi bulunan Fakülteler ve Yüksekokullara engelli asansörleri yapımına başlanılmış olup, tamamlanması yıllar itibariyle yapılacaktır.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



İlçelerde bulunan Yüksekokullardan Suşehri Sağlık Yüksek Okulu binasına tadilat yapılarak, öğrencilerin Suşehri'nde eğitim-öğretimlerini yapmaları sağlanmıştır. Tüm ilçeler Meslek Yüksekokulları binalarının ısı yalıtımları tamamlanmış olup, 2015 ve 2016 yılları bütçe ödenekleri doğrultusunda merkez kampüste bulunan yalıtımsız binaların yalıtımları yapılacaktır.

Üniversitemiz Merkez yerleşkesi içinde bulunan Lojmanlar 5 blok'unda çatı kaplamaları yenilenmiştir. Engelli kişilerin oturdukları bloklara öncelik verilerek 2 adet engelli asansörü yapılmış olup, lojmanlarda asansör sayısı 4 adet'e ulaşmıştır.

2014 yılında Beden Eğitimi Spor Sektörü *Açık ve Kapalı Spor Tesisleri* projesi kapsamında; 2014 yılında ihalesi yapılan 1500 seyirci kapasiteli (7.000m²) Kapalı Spor Salonu inşaatının yapımı devam etmekte olup, % 15 seviyesine ulaşmıştır. Spor Tesisleri Onarım kapsamında 1 adet Kapalı Futbol sahası yapılmıştır. Cumhuriyet Spor Salonu pencereleri değiştirilmiştir. Açık Spor tesislerine otopark düzenlenmesi ve Kapalı Futbol sahasının aydınlatılması yapılmıştır.

2014 yılında Eğitim Sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında yar alan *Rektörlük Makine-Teçhizat* alımları kapsamında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır. Devlet malzeme ofisinden 1 adet T11a (En az 40 Kişilik) otobüs alınmıştır. 50 adet yazıcı, 20 adet üçlü bekleme koltuğu, 250 adet konferans koltuğu, 400 adet seminer tipi sandalye, 10 bilgisayar, 100 sehpa, 100 adet dosya dolabı, 5 adet toplantı masası, 140 adet çalışma koltuğu, 320 adet misafir koltuğu, 5 adet büro takımı alınmıştır. Ayrıca Fen Fakültesi,



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu laboratuvarları için toplam 156 Kalem cihaz alımı yapılmıştır.

2014 yılında Eğitim sektörünün altında bulunan Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan *Yayın Alımları* projesinde bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca 25 adet Elektronik Ortamda Yayın alımı ve 19 konu başlıklı 1890 adet basılı yayın alımı yapılmıştır.

2014 yılında Eğitim sektörünün altında bulunan Muhtelif İşler Projesi kapsamında *Öz Gelir Karşılığı Makine-Teçhizat* alımlarında yer alan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca çeşitli hammadde alımları ve demirbaş eşya alımı yapılmıştır.

2014 yılında Eğitim Sektörünün altında bulunan Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan *Bilgi Teknolojileri Alımlarında* Teknoloji Fakültesine 43 bilgisayarlık (i7/8GB All inOne + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon) Bilgisayar Destekli Çizim (CAD/CAM) Laboratuvarı kurulmuştur. Eğitim



Fakültesine 41 bilgisayarlık (i7/8GB All inOne + Masa + Sandalye + Wireless AP +

Projeksiyon) Yabancı Dil Laboratuvarı kurulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesine 14 bilgisayarlık (i7/8GB Ram) Nota Yazım Laboratuvarı kurulmuştur. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna 51 bilgisayarlık (i5/8GB All inOne + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon) Bilgisayar Eğitimi Laboratuvarı kurulmuştur. Enformatik Bölümüne 46 bilgisayarlık (i7/8GB All inOne + Masa + Tabure + Wireless AP + Projeksiyon) Bilgisayar Eğitimi Laboratuvarı kurulmuştur. Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na 12 adet (i7/8GB Ram) kapasiteli bilgisayar alınmıştır. Muhtelif birimlere 11 adet (i5/4GB Ram) notebook alınmıştır. Muhtelif birimlere 69 adet (i5/4GB Ram) bilgisayar alınmıştır. Muhtelif birimlere 28 adet projeksiyon+perde alınmıştır. Uygulama Oteline 16 adet indoor wireless (HP MSM460WW) erişim cihazı alınmıştır. Muhtelif birimlere 4 adet indoor wireless (HP MSM460WW) erişim cihazı alınmıştır. Muhtelif birimlere 4 adet



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

fotokopi (Toshiba e306S) cihazı alınmıştır.Muhtelif birimlere 22 adet lazer yazıcı (Xerox 3610n) alınmıştır.İletişim Fakültesine CCTV Güvenlik Kamera Sistemi (LG DVR+16 Cam) kurulmuştur. Eğitim Fakültesine CCTV Güvenlik Kamera Sistemi (LG DVR+16 Cam) kurulmuştur.Rektörlük binasına ilave 2 adet güvenlik kamerası kurulmuştur.İnternet alt yapısına 30 adet Switch (Huawei S2600-52P-EI-AC) alınmıştır.Kütüphane Daire Başkanlığına 2 adet Doküman Tarayıcı (Xerox 4830) alınmıştır.Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimine 2 adet Video Kamera (Sony HXR-NX30) ve 1 adet Fotoğraf Makinesi (Canon EOS 5D Mark III Body) alınmıştır.Uzaktan Öğretim birimi için Adobe Connect yazılımı V7'den V9'a yükseltilmiştir.Microsoft Kampüs Anlaşması 2014 yılı için yenilenmiştir.Sunucular için SSL sertifikası (domain üzerine 5 yıllık) alınmıştır.SPSS İstatistiksel Analiz Programı V14'den V22'ye yükseltilmiştir.Muhtelif birimlerde kullanılmak üzere SMS Kısa Mesaj Hizmeti satın alınmıştır.Labris E.Posta Otomasyonu 2014 yılı kullanım hakkı alımı yapılmıştır.Hukuk Müşavirliği için Sinerji Mevzuat, İcra ve Dava Takip Programı 2014 yılı kullanım hakkı alımı yapılmıştır.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı için Yordam Kütüphane Otomasyonu 2014 yılı kullanım hakkı alımı yapılmıştır.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için Amp Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı 2014 yılı kullanım hakkı alımı yapılmıştır.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı için Diyos E-İhale Otomasyonu 2014 yılı kullanım hakkı alımı yapılmıştır.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için Diyos E-İhale Otomasyonu 2014 yılı kullanım hakkı alımı yapılmıştır.Enstitü Öğrenci İşleri ve Personel İşleri Otomasyonu için ÜNİPA Otomasyonu 2014 yılı kullanım hakkı alımı yapılmıştır.

2014 yılında Sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi Kapsamında *Makine -Teçhizat alımları* için ayrılan ödeneklerle belirtilen malzeme ve cihazlar alınmıştır. Genel cerrahi ve nöroloji Y.B. ve yanık tedavi merkezi hijyenik klima ve havalandırma sistemi alımı, ameliyathane paket hijyenik klima sistemleri ve tıbbi cihaz alımları, tüp bebek ünitesi cihaz alımı, nöroloji ENG cihaz alımı, hasta başı monitörü alımı, korter cihazı alımı, cerrahi aletler alımı, bilgisayarlı radyografi CR alımı, partükül indirgeme ve iklimlendirme cihazı alımı, taş kırma cihazı alımı, santrifüj alımı, bifazik defibrilatör alımı,



kamera sistemi alımı, fototerapi cihazı alımı, baskı makinesi, ritim holter sistemi alımı, radyasyon doz hızı ölçer cihazı alımı, inverter klima alımları yapılmıştır.

2014 yılında Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında Hastane *Büyük Onarım* işinde, laboratuvarlar



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hale getirilmiştir. Hastane içerisinde bulunan mevcut arşiv başka bir mahalle taşınması için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Arşivin yerine ise Hematoloji Laboratuvarı yapılmıştır. Acil servise daha rahat ulaşımın sağlanması için gerekli tadilatlar yapılmıştır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi atık su kanalları yenilenmiştir. Giriş markizi ve bozulan kapı pencereler değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre servislerde boya ve zemin kaplamaları ile ıslak hacimlerde tadilatlar yapılmıştır.

2014 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında; 2014 yılı içinde 151 adet yeni proje desteklemeye alınmış önceki yıllardan devreden 136 projeye birlikte toplam 382 adet proje mevcut olup, bu projelerden 2014 yılın da 95 adedi sonuçlandırılmış ve 287 adet proje ise sonraki yıllara devrettirilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 31/05/2013 tarihli yazısıyla Projenin 3390 m² inşaat karakteristiğinin 10400m² ye çıkarılması uygun görülmüş ve ortaya çıkan 5.368.000,00.-TL ek maliyetin Üniversite öz gelirlerinden karşılanması kaydıyla projenin tamamlanma yılı da 2014



olarak proje revize edilmiştir. C.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında merkezi laboratuvar inşaatı yapımı tamamlanmış olup, yıl içerisinde geçici kabulü yapılmış ve Sağlık Bilimleri ve Kanseri Araştırma (AR-GE) Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimi, Mühendislik Bilimleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimlerinin kurulabilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için cihaz ve makine teçhizatın temini amacıyla ihaleleri ve satınalma işlemleri yapılmış ve bir kısmı tamamlanmıştır ayrıca sarf malzemeler temin edilmiştir. Projenin 2014 yılı toplam harcama tutarı 468.370,93 TL olmuştur.

2014 yılında Eğitim, Sağlık, Spor, Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında hedeflenen amaçlar doğrultusunda tamamlanmıştır.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4- Yatırım Uygulamaları

4.1-Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin Eğitim-Spor Sektöründe toplam proje tutarları 208.657.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2013 yılı katlanmış harcama tutarı ise, 141.024.000.- TL olmuştur. 2014 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 21.500.000.-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 2.254.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 23.754.000.- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 22.729.000.- TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.


Üniversitemizin Sağlık Sektöründe toplam proje tutarları 5.000.000 TL iken yıl içerisinde Yıl içerisinde likit karşılığı olarak 6.522.000.- TL ödenek eklenmiştir. Kalkınma Bakanlığınca Yatırımları hızlandırma ödeneğinden 4.000.000.-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 15.522.000.-TL olmuştur. 2014 yılı sonu itibariyle 10.941.000.- TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Döner sermaye işletmemiz tarafından 1.258.000.-TL lik harcama yapılmıştır.

Üniversitemizin DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe toplam proje tutarları 21.860.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2013 yılı katlanmış harcama tutarı ise, 16.640.000.- TL olmuştur. 2014 yılı sonu itibariyle 5.220.000.-TL özel hesaba aktarılmıştır.

Sektör	2014 Yılı Ödeneği	2014 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Eğitim	22.254.000	21.236.000	95
Sağlık	15.522.000	10.941.000	70
Spor	1.500.000	1.493.000	99
Sosyal Teknolojik	5.220.000	5.220.000	100
Toplam	44.496.000	38.890.000	87



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

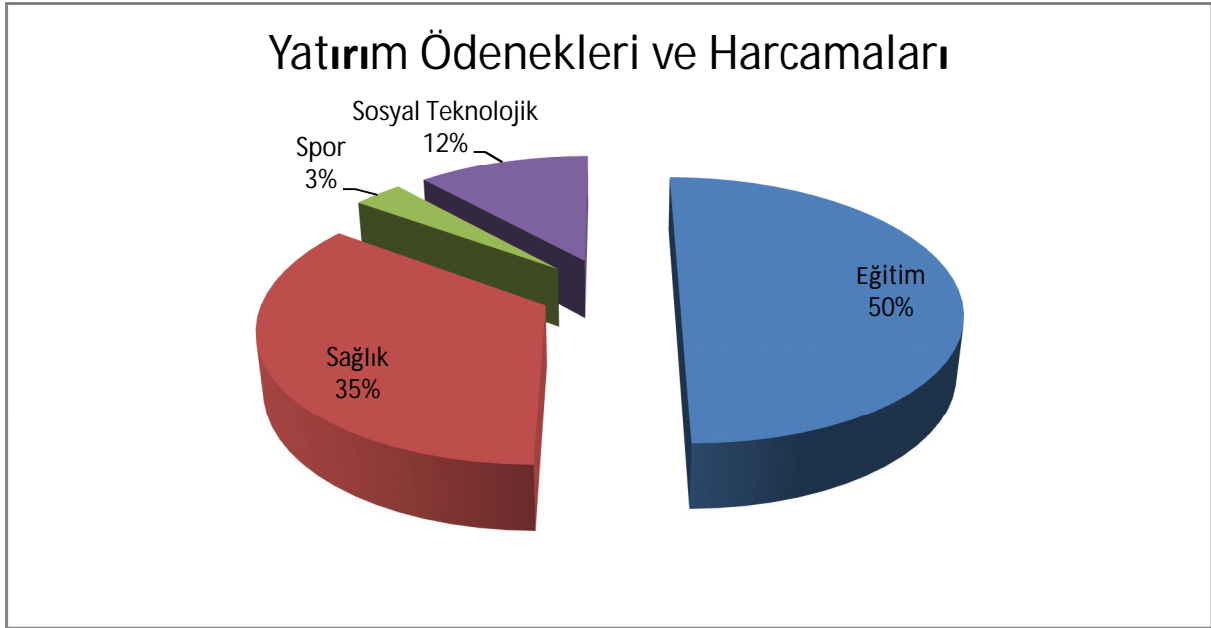

4.2-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Yatırım ödeneklerinin yetersiz olması, serbest ödeneklerin kullanılması Maliye Bakanlığınca ayrıntılı finansman programını uygun olarak üçer aylık dönemler halinde yapılması, yatırım ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca serbest ödeneklerin revizesinin (sonraki aylara ait ödeneklerin serbest bırakılması) ihtiyaç olduğu aylarda yapılmaması, 4734 sayılı kanunun ihale ilanları ile ilgili sürelerin (Bellî miktarın üzerindeki yaklaşık maliyete Göre) 40 gün olması, 4734 sayılı kanun çerçevesinde yapılan ihalelerde idareye itiraz süresi ve kamu ihale kurumuna itiraz gibi hallerde ihale sürecinin uzaması ve kamu ihale kurumunca ihaleye itiraz süresinde karar aşamasının uzun süre alması, kurumlarda uzman ve deneyimli personelin yetersizliği, başlıca karşılaşılan sorunlardır.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II- 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

1-Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2014H032560 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2014 yılı yatırım programı kapsamında 100.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 100.000,00 TL harcama yapılmıştır.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

1.2- Proje No: 1974H030250 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2014 yılı yatırım programı kapsamında 3.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde likit karşılığı 1.300.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 4.300.000.-TL olmuştur. Bu ödenekten 2014 yılı sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, kampus asfalt, yol ve iş makinesi alımı için 4.299.841,52.- TL harcanmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 75.000.000.-TL olup, 2013 yılı kümülatif harcama tutarı 66.280.000.- TL dir.

2013 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

1.3- Proje No: 2003H030480 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz detay programına göre bu projeden, Edebiyat Fakültesi Ek bina inşaatı, İlahiyat Fakültesi Ek bina inşaatı, Yemekhane inşaatı tamamlanmıştır. İnşaatı devam eden Rektörlük Ek Binası, ihalesi yapılmış olup yer teslimi aşamasında Veteriner fakültesi inşaatı, Mimarlık Fakültesi inşaatı devam etmektedir. 2014 yılı yatırım programında Derslik ve Merkezi Birimler projesine 12.900.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 2.800.000.TL ödenek aktarma yapılmıştır. 1.300.000.-TL Kampus Alt yapı projesine, 1.500.000.-TL si Muhtelif İşler projesi Büyük onarım giderleri için yapılmıştır. Toplam ödenek 10.100.000.-TL olmuştur. 2014 yılı sonu itibariyle proje kapsamında 9.716.674,64.- TL. harcama gerçekleştirilmiştir.


Bu projenin toplam tutarı 122.000.000.- TL. olup, 2013 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 74.744.000.- TL. dir.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 96 olmuştur.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Eğitim Sektörü Projeler	2014 Yılı Ödeneği	2014 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100
Kampus Alt Yapı	4.300.000	4.299.841	100
Derslik ve Merkezi Birimler	10.100.000	9.716.674	96
Muhtelif İşler	7.754.000	7.118.513	92
Toplam	22.254.000	21.235.028	95

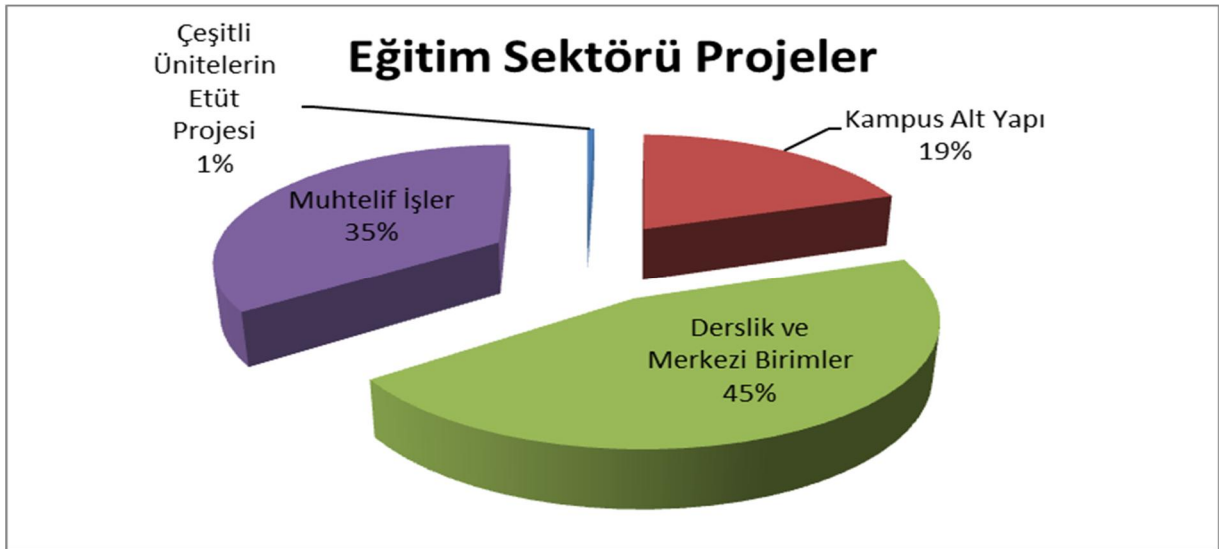

1.4- Proje No: 2013H030800 Proje Adı: Muhtelif İşler

a-)Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 700.000.- TL'si hazine yardımı, 650.000.- TL öz gelir olmak üzere toplam 1.350.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak Diş hekimliği Fakültesi için 130.000.-TL ödenek eklenmiştir. Derslik Merkezi Birimler projesinden 1.500.000.-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 2.980.000.-TL olmuştur. 2014 yılı sonu itibarıyla üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 2.541.306,68.-TL harcama gerçekleştirmiştir.

2014 yılında bu proje kapsamında nakdi gerçekleşme oranı % 85 olmuştur.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

b-)Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 700.000.-TL hazine yardımı karşılığı, 200.000.- TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 900.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelirden, 1.344.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 2.244.000.-TL olmuştur.

Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Rektörlük Makine teçhizat alımları için 2.084.531,69.-TL, lik harcama yapılmıştır.

2014 yılı için akreditif hariç nakdi gerçekleşme oranı % 92 olmuştur.

c-)Yayın Alımları

Üniversitemiz kütüphane yayın alımları olarak Muhtelif İşler projesi Kapsamında 2014 yılında 600.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı, on-line veri tabanı olarak 587.332,12.-TL harcama gerçekleşmiştir.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.

d-)Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2014 yılında 702.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 650.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 1.352.000.-TL olmuştur. 2014 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanımı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 1.328.454,07.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.

e-)Taşıt Alım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim bütçesinde 1 adet T11b otobüs (sürücü dahil en az 41 kişi) 448.000,00.-TL, Merkezi Yönetim Bütçesinden 1 adet T08 pick-up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) arazi hizmetleri için 57.000.-TL Yurt içi Hibe ödenek öngörülmüştür. Toplam ödenek 448.000,00.-TL'dir. Yurt iç hibe ödeneğe dahil değildir. Hibe gerçekleşmemiştir. Yıl içerisinde vergi giderleri için 130.000.-TL'lik, likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 578.000.-TL olmuştur.


2014 yılı içinde söz konusu hizmet araçların satın alımı yapılmış 576.890,79.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Muhtelif İşler	2014 Yılı Ödeneği	2014 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	2.980.000	2.541.306	85
Makine Teçhizat Alımı	2.244.000	2.084.531	92
Yayın Alımı	600.000	587.332	98
Bilgi Teknolojileri	1.352.000	1.328.454	98
Taşıt Alımı	578.000	576.890	100
Toplam	7.754.000	7.118.513	92

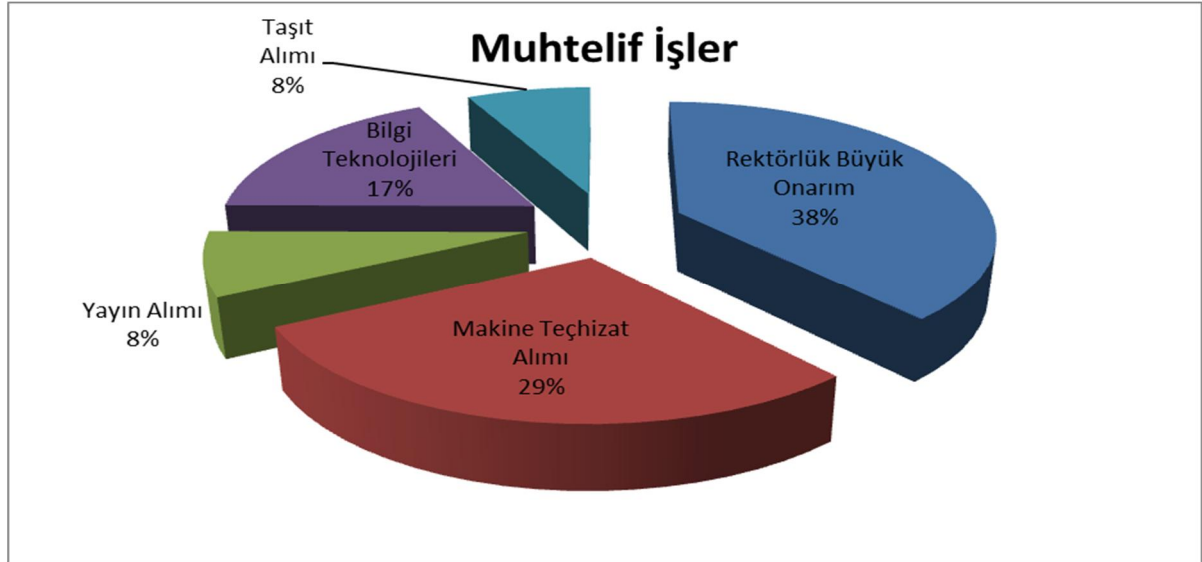



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2-Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

Proje No: 2014H050040 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilin de 1.500.000.-TL ödenek verilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle 1.492.968,19.-TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 7.500.000.- TL. olup, 2013 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 0.00.-TL'dir.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

3-Sağlık Sektörü

Proje No:2013I000140 Proje Adı: Muhtelif İşler

3.1-Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Büyük Onarım için, 500.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde likit karşılığı 2.022.000,00.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 2.522.000,00-TL olmuştur. 2014 yılı sonu itibariyle Hastane Büyük Onarımı için 1.956.541,95.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 77 olmuştur

3.2-Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında makine teçhizat alımları için 4.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit karşılığı olarak 4.500.000.-TL'lik ödenek eklemesi yapılmıştır. Kalkınma Bakanlığınca yılsonunda yatırımları hızlandırma ödeneğinden 4.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 13.000.000,00-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle harcaması 8.984.846,40.- TL'dir. 2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 69 olmuştur.

Ayrıca Yatırım Programında Döner sermaye gelirlerinde harcanmak üzere 1.000.000.- TL yatırım harcaması yapılması planlanmış, Döner sermaye işletme müdürlüğümüzün bütçe olanakları kullanılarak bu projeye yılsonu itibariyle döner sermaye gelirlerinden 1.257.756,68.- TL lik harcama yapılmıştır.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 125 olmuştur.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4-DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje No: 2013K120210 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 4.220.000,00 TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2014 yılında toplam bütçe aktarması 4.220.000,00.- TL'dir. 2014 yılında özel hesaptan yatırım programı dâhilinde harcanan tutar 2.668.274,40.- TL olmuştur.

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %63 olmuştur.

Proje No: 2011K120250 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kalkınma Bakanlığınca desteklenen bu projemize 2014 yılında 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 1.000.000.-TL özel hesaba aktarılmıştır. 2014 yılında özel hesaptan bu projeye toplam 468.370,93.- TL harcama yapılmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 17.640.000.- TL. olup, 2013 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 16.640.000.- TL'dir

2014 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 46 olmuştur.



2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV-ÖNERİLER

Yatırım ödeneklerinin kullanımı yıl içinde blokeler ile kesilmemesi, yeterli yatırım ödeneklerinin kurumların ihtiyaçları amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsis edilmemektedir. Projeler arası aktarmalarda bürokratik yazışmaların aza indirilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılması sırasında ihale işlemlerinin yapılış, ilan, itiraz sürelerinin azaltılması gibi hususların; göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yatırımlar verilen ödenekler ölçüsünde yapılmaktadır. Ancak verilen ödenekler yenilik ve yenileştirme yatırımları için yetersiz kalmaktadır. Aşağıda listelenen işler için mutlaka ödenek ayrılmalıdır. Aşağıda yatırım yapılması gereken bilişim alanları listelenmiştir. Yatırımlar için bütçe tahsisi yapılırken, süregelen işlerin yansıra bir kereye mahsus projeler ait öneriler dikkate alınmalı ve bunlar için ilave ödenekler tahsis edilmelidir. İnternet iletişimini sağlayan merkez omurga cihazımız (backbone switch) 13 seneden beri çalışmaktadır ve her an arızalanma ihtimali olabilecek cihazdır. Arızalandığı takdirde yenisini almak aylar sürmektedir. Bu nedenle cihaz çalışırken yenisini ile değiştirilmesi gereklidir. Web, E.Posta, Üniversite Bilgi Sistemine ait öğrenci işleri, maaş, personel dataları ve 5651 sayılı internet kanununa göre alınması gereken çok büyük miktarda log kayıtları ve daha nice bilişim verisi için güvenilir disk üniteleri ve bunların anında (online) yedeklenebilir yapının kurulması gereklidir. Modern bir sistem odasına ihtiyaç vardır. Ancak bunun için daire başkanlıklarının yer sorunu çözümlenmelidir. Öğrenci laboratuvarları eskimiştir. Bu laboratuvarlara azar azar bilgisayar vermek yerine anahtar teslim laboratuvar kurup en az 5 yıl bu laboratuvarlara geri dönülmemelidir. Sivas merkez yerleşkede fakülte laboratuvarları yerine enformatik bölümü laboratuvarları desteklenmelidir.

2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı	CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ										
Sektör Adı	EĞİTİM										(BİN TL)
YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
417	2014H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	7.500	0	0	1.500		1.493
417	2014H032560	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Sivas	100	0	0	100		100
417	1974H030250	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	75.000	66.280	0	4.300		4.300
417	2003H030480	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	122.000	74.744	0	10.100		9.717
417	2014H032570	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Sivas	4.057	0	0	7.754		7.119
417	2014H032570	Muhtelif İşler	ÖZ GELİR	2014	Sivas	4.057	0	2.065	3.104		0
417	2014H032570	Muhtelif İşler	TAŞIT HİBE	2014	Sivas	4.057	0	0	57		0
TOPLAM						208.657	141.024	2.065	23.754	1.500	22.729

Sektör Adı	SAĞLIK										
YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
417	2013I000140	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Sivas	5.000	0	6.522	15.522	4.000	10.941
417	2013I000140	Muhtelif İşler	DONER SERMAYE	2014	Sivas	1.000	0	0	1.000		0
TOPLAM						6.000	0	6.522	15.522	4.000	10.941
Sektör Adı	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA										
YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
417	2013K120240	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2014	Sivas	4.220	0	0	4.220		4.220
417	2014K120240	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZ GELİR	2014	Sivas	4.220	0	0	4.220		4.220
417	2011K120250	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	ÖZEL BÜTÇE	2014	Sivas	17.640	16.640	0	1.000		1.000
417	2011K120250	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	İNŞAAT (10400M2)	2013	Sivas	7.148	7.148	0	0		0
417	2011K120250	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	MAK.TEÇ.	2014	Sivas	10.492	9.492	0	1.000		1.000
TOPLAM						21.860	16.640	0	5.220	0	5.220

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	5		208.657			141.024			21.500			23.754			22.729
Sağlık	1		5.000						5.000			15.522			10.941
D.Kamu Hizm.	2		21.860			16.640			5.220			5.220			5.222
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>	2		21.860			16.640			5.220			5.220			5.222
TOPLAM	8		235.517			157.664			31.720			44.496			38.890

32

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1		1.000						1.000			1.258		0	1.258
TOPLAM	1		1.000						1.000			1.258		0	1.258

