



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2016



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
Eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME	11
1. Misyon ve Vizyon	11
1.1. Vizyon	11
1.2. Misyon.....	11
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	12
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	14
3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi.....	14
3.2. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	15
4. Yatırım Uygulamaları.....	20
4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	20
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	21
III- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	22
1. Eğitim Sektörü.....	22
1.4.1. Rektörlük Büyük Onarım	23
1.4.2. Makine ve Teçhizat Alımı	24
1.4.3. Bilgi Teknolojileri.....	24
1.4.4. Taşıt Alım.....	24
2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	26
3. Sağlık Sektörü	26
3.1.1. Büyük Onarım	26
3.1.2. Makine ve Teçhizat Alımı	26
4. DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü	27
IV-ÖNERİLER.....	28



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısararak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleştir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2015 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %55'i Eğitim, %9 Beden Eğitimi Spor, % 21'i Sağlık, %15'ü Bilimsel Teknoloji Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2015 yılı yatırım programı ile üniversitemiz nezdinde yürütülen proje karşılığı 38.680.000.- TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten hazine yardımı olarak 33.350.000.- TL, öz gelir karşılığı 5.330.000.- TL ödenek öngörülmüştür.

2015 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 10.150.000. TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden Hastane makine-teçhizat alımına 4.000.000.TL ödenek aktarılmıştır. Yılsonu toplam ödeneğimiz 52.830.000.- TL olmuştur. Ödeneğimizin 40.154.000.-TL'si harcanmış, 12.676.000.- TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 76'dır.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Faruk KOCACIK
Rektör



II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

1.1. Vizyon

Bölgenin geleceğinin şekillenmesinde rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktadır.

1.2. Misyon

Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, sorgulayan, araştıran, çözümleyen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Eğitim-öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek.

- HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak
HEDEF 1.2: Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak
HEDEF 1.3: Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak
HEDEF 1.4: Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek
HEDEF 1.5: Eğitim programlarını modern üniversite eğitiminin gereklerine göre geliştirmek

Stratejik Amaç 2

Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak.

- HEDEF 2.1: Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak
HEDEF 2.2: Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek
HEDEF 2.3: Kütüphane imkanlarını ve elektronik yayınlara erişimi artırmak
HEDEF 2.4: Araştırma laboratuvarlarının altyapı ve donanımı geliştirilerek daha fazla ve daha kaliteli araştırma yapılmasına imkan sağlamak

Stratejik Amaç 3

Yüksek standartlara sahip Kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve Kampüsü kullanan diğer paydaşların yaşam kalitesini artırmak.

- HEDEF 3.1: Kampüsteki sosyal, kültürel ve sportif olanakları geliştirerek kampüsün gerek öğrenci gerek çalışanlar için uygun bir yaşam ortamı olmasını sağlamak
HEDEF 3.2: Öğrencilerin ve çalışanların barınma ve ulaşım ihtiyaçlarına yaşanabilir bir kampüs içinde çözüm sunmak
HEDEF 3.3: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin kente, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak



2015 YILLI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Stratejik Amaç 4

Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Sivas Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel yapısının gelişimine katkıda bulunmak.

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak

Stratejik Amaç 5

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak.

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, belli alanlarda uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak

HEDEF 5.2: Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak

HEDEF 5.3: Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

Stratejik Amaç 6

Üniversitenin amaç ve hedeflerini hayata geçirecek kurumsal yönetim sistemini geliştirmek.

HEDEF 6.1: Bütünleşik yönetim bilgi sistemini ve bilgi işlem altyapısını geliştirmek suretiyle sunulan hizmetin etkinliğini artırmak

HEDEF 6.2: Çalışanların bilgi ve beceri gelişimini sağlamak ve katılımı geliştirmek suretiyle çalışma yaşamında memnuniyeti ve verimliliği artırmak

HEDEF 6.3: Üniversite kaynaklarının mali mevzuata uygun kullanılması yanında etkin, ekonomik ve verimli değerlendirilmesine yönelik mali yönetim sistemini şeffaf bir yönetim anlayışı içinde güçlendirmek



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Üniversitemiz 5.513 m² üniversite arazisi ve 9.827.694 m² hazinece tahsis edilen arazi üzerinde yaklaşık 53.000 öğrencimiz ve 3.500 akademik-idari çalışanımız ve 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuar, 5 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 23 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Belediyesi sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 227 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık su arıtma tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

252701m² eğitim, 99757m² sağlık, 36161m² barınma, 24739m² beslenme, 14725m² kültür, 42729m² spor, 36940m² diğer idari bina, tesis, kantin, depo v.b olmak üzere toplam 507752m² kapalı alana sahip üniversitemizde; 56 adet toplantı salonu, 27 adet konferans salonu, 8 adet 50-250 kişilik amfi, 569 sınıf, 100 bilgisayar laboratuvarı, 174 adet diğer laboratuvarlar olmak üzere 669 adet derslik ile hizmet vermektedir.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2015 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi için **Kampus altyapı projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için; Kanalizasyon ve Altyapı inşaatı işinde projesinde; Eğitim Fakültesi-İletişim Fakültesi-Cumhuriyet M.Y.O-Veteriner Fakültesi Klinik Binası önü-Sivas M.Y.O-Eczacılık ve Teknoloji Fakültesi-Dış Hekimliği Fakültesi önüne olmak üzere yaklaşık 1500 araçlık otopark yapılmıştır. Kampüsümüzün 30 yıldır kullanılan ve sorun teşkil etmeye başlayan kanalizasyon şebekesinde yaklaşık 3 km yenileme yapılmıştır. Arıtma Tesisi terfi merkezi yenilenmiş, Arıtma tesisi Terfi Merkezi çevre düzenlemesi ve yol bağlantılarının yapılması, ayrıca Arıtma tesisine jeneratör konulmuştur. Enerji Tasarrufu Yönetmeliği çerçevesinde asansör direkli çevre aydınlatması yapılmıştır. Kampüsü güzelleştirmek adına kaldırım ve tretuvarların büyük kısmı yapılmış ve engelli rampaları düzenlenerek yenilenmiştir. Tüm Eğitim bloklarımızın tretuvarları yağmur suyu kanalları yapılarak yenilenmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu-Lojman yolu arasına stabilize yol bağlantısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önüne yol bağlantısı, Veteriner Fakültesi yol bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca, Bilimsel Araştırma Merkezi Laboratuvar binasının etrafına çevre düzenleme ve yol bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca birçok fakülte binası önüne ahşap perguleler yapılmıştır.

C.Ü. Alt Yapı (Trafo-Jeneratör, Arıtma Tesisi Otm.Izgara-Doğalgaz Dönüşüm) İnşaatı kapsamında; Yeni Rektörlük binasının yan kısmında yeni bir 2000 KVA'lık O.G trafo merkezi oluşturulmuş ve 875 KVA'lık 2 adet jeneratör konulmuştur. Mekanik Tesisat olarak Atıksu Arıtma tesisi otomatik ızgara ve pompa merkezi ile Rektörlük İdari bina doğalgaz dönüşüm işi tamamlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler projesinde 2015 yılında inşaatına başlanılan 2014 yılında ihalesi yapılan 6000 m² Rektörlük Ek Bina, 6500 m², Mimarlık Fakültesi ve 13000 m² Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İnşaatlarının yapımı devam etmektedir. Ayrıca, 9000 m² Merkezi Kütüphane İnşaatı yüklenicinin vefatı nedeniyle tasfiye edilmiş ve tekrar ihalesi yapılmış olup, yapımı devam etmektedir. Üniversitemiz toplam kapalı alanı ise 2015 yılsonu itibariyle 507752 m²'ye ulaşmıştır.

2015 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Büyük Onarım işinde**; Engelsiz bir Üniversite oluşturmak amacıyla, Tüm Fakülteler ile Üniversite Merkez yerleşkesi içerisinde bulunan Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokullarına engelli wc ve rampalar yapımına başlanılmış olup, % 80 aşamasında tamamlanmıştır. 2016 yılında da engelliler yönelik çalışmalar devam edecektir. Ayrıca, engelli öğrencisi bulunan Fakülteler ve Yüksekokullara engelli asansörleri yapımına başlanılmış olup, tamamlanması yıllar itibariyle yapılacaktır.

İlçelerde çatı onarımları, özürü ve normal WC tadilatları, özürü rampaları, okulların çevre çitleri ve boya işleri yapılmıştır. Tüm ilçeler Meslek Yüksekokulları binalarının ısı yalıtımları tamamlanmış olup, 2016 ve 2017 yılları bütçe ödenekleri doğrultusunda merkez kampüste bulunan yalıtımsız binaların yalıtımları



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

yapılacaktır.

Üniversitemiz Merkez yerleşkesi içinde bulunan Lojmanlar 5 blok'unda çatı kaplamaları yenilenmiştir. Engelli kişilerin oturdukları bloklara öncelik verilerek 6 adet engelli asansörü yapılmış olup, lojmanlarda asansör sayısı 6 adet'e ulaşmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri proje kapsamında; 2014 yılında ihalesi yapılan Kapalı Spor Salonu İnşaatının yapımı devam etmekte olup, % 60 seviyesine ulaşmıştır. Spor Tesisleri Onarım kapsamında ise; Yarı Olimpik Yüzme havuzuna topraklama yapılmış, led projektörler takılmış, elektrik tesisatına bakım yapılmıştır. Kapalı tenis kortuna yeni pano yapılmış kolon hattı çekilmiştir.

2015 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yar alan **Rektörlük Makine-Teçhizat** alımları kapsamında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır. Devlet Malzeme Ofisinden 50 adet misafir koltuğu, 50 adet çalışma koltuğu, 100 adet sandalye, 13 adet hasta karyolası, 1 adet Toyota Corolla otomobil, 1 adet kabinli kamyonet alımı yapılmış olup; Fen Fakültesi için 1 Kalem Laboratuar Malzemesi Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversite hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi için 6 kalem laboratuar malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi için 25 kalem laboratuar malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İletişim Fakültesi için 1 kalem web TV kurulumu ihalesi gerçekleştirilmiştir. Mühendislik Fakültesi için 40 Kalem Laboratuar Malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Teknoloji Fakültesi için 8 Kalem Laboratuar Malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Öz Gelir Karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; 2 adet led TV, 3 adet dosya dolabı, 3 adet toplantı masası, 310 adet yemek masası, 12 adet sehba, 280 adet maya koltuk, 70 adet misafir koltuğu, 330 adet sandalye, 4 adet portative çelik raf, 700 adet soft yemek sandalyesi, 2 adet buzdolabı, 2 adet çamaşır makinası, 2 adet elektrikli süpürge, 2 adet ütü ve 1 adet mini buzdolabı alımı yapılmıştır.

2015 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi Bilgi Teknolojileri Alımları** kapsamında;

Sıra No	İşin Tanımı
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesi başlatıldı. Bu kapsamda; - EBYS yazılımı satın alındı. - KAMUSM'ye e.imza çubuğu ve Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) satın almak için 180 adetlik başvuru yapıldı. - KAMUSM'den 1.000.000 adet zaman damgası kontörü satın alındı. - Sunucu (server) ve veri saklama (storage) sistemleri yedek olarak satın alındı. - Birimlere dağıtılmak üzere 60 adet doküman tarayıcı (scanner) satın alındı. - Hastane thin client sunucularında kullanılmak üzere Windows 2012 sunucu lisansı ve Remote Desktop Services (RDS) lisansları satın alındı.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2	İnşaatı biten binalar merkezi iletişim ağına bağlandı. - Merkezi Laboratuvarlar A Binası - Merkezi Laboratuvarlar B Binası - Yeni Öğrenci Yemekhanesi Binası - Yeni Kütüphane Binası - Yeni Rektörlük Binası - Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Binası - İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu - Bizim Kafe Binası - Şarkışla Yüksekokulu Binası
3	Fakültelelere Turnike Geçiş Sistemi satın alındı. - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 4 adet kollu turnike sistemi kuruldu. - Edebiyat Fakültesi A binasına 3 adet kollu turnike sistemi kuruldu. - Edebiyat Fakültesi B binasına 4 adet kollu turnike sistemi kuruldu.
4	Rektörlük Evrak Birimine posta ücret ödeme makinesi satın alındı.
5	Rektörlük Makam Aracına aksesuar yaptırıldı.
6	Turnitin İntihal Veri tabanı satın alındı.
7	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelinin uzak bilgisayarlara hizmet vermek için Teamviewer uzak masaüstü erişim yazılımı satın alındı.
8	Nitel araştırmalara destek olmak amacıyla NVIVO yazılımı satın alındı.
9	Sanallaştırma yazılımı VMWARE lisansı yenilendi.
10	Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin üç boyutlu çizimleri için SolidWorks/SolidCAM yazılımı satın alındı.
11	Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin üç boyutlu çizimleri için CATIA yazılımı satın alındı.
12	Yapı İşleri Daire Başkanlığının kullandığı Diyos ihale yazılımının lisansı yenilendi.
13	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Amp Hakediş ve Yaklaşık Maliyet yazılımının lisansı yenilendi.
14	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının kullandığı Yordam katalog tarama yazılımının lisansı yenilendi.
15	Hukuk Müşavirliğinin kullandığı Sinerji İcra Takip yazılımının lisansı yenilendi.
16	Hukuk Müşavirliğinin kullandığı Sinerji Dava Takip yazılımının lisansı yenilendi.
17	Hukuk Müşavirliğinin kullandığı Sinerji Mevzuat ve İçtihat yazılımının lisansı yenilendi.
18	Enstitüler için Ünipa Öğrenci İşleri Otomasyonu lisansı yenilendi.
19	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Labris Mail Sunucusu yazılımının lisansı yenilendi.
20	Microsoft Kampus Anlaşması lisansı yenilendi.
21	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 16 kameralı güvenlik kamera sistemi kuruldu.
22	Üniversitemize bütçe ölçülerinde Mobese Kamera Sistemi kuruldu. - Rektörlük kavşağına 180 derecelik mobetix kamera - Onkoloji kavşağına 180 derecelik mobetix kamera - Hastane poliklinik ara nizamiyesine 90 derecelik mobetix kamera - Rektörlük ara nizamiyesine 90 derecelik mobetix kamera - İ.İ.B.F. ara nizamiyesine 90 derecelik mobetix kamera montaj edilmiştir.
23	Güvenlik Amirliğine 1 adet bellekli SONY el kamerası satın alındı.
24	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Akademik Arşiv Projesi kapsamında 2 adet yüksek hızlı doküman tarayıcısı satın alındı.
25	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı omurga merkezine 20 KVA'lık kesintisiz güç kaynağı satın alındı.
26	Toshiba marka fotokopi makinaları için bakım anlaşması yapıldı.



2015 YILLI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

27	<p>Çeşitli birimlere;</p> <ul style="list-style-type: none">- 52 adet kasalı bilgisayar,- 8 adet All in One bilgisayar,- 10 adet notebook,- 4 adet lazer yazıcı,- 2 adet özel amaçlı yazıcı,- 18 adet projeksiyon ve aparatları dağıtılmıştır.
28	<p>Bilgisayar Laboratuvarları kurmak için 118 adet bilgisayar, 42 adet masa, 122 adet hilton tipi sandalye ve diğer malzemelerin dağıtımı yapılmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">- Eğitim Fakültesi, bilgisayar laboratuvarına;<ul style="list-style-type: none">o 41 adet MSI AP200 marka All in One bilgisayar,o 21 adet iki bilgisayarlık masa,o 1 adet projeksiyon ve 1 adet perde,o 41 adet hilton tipi sandalye,o 1 adet elektrik panosu, 21 adet 6'lı priz ve elektrik kabloları teslim edilmiştir.- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna, bilgisayar laboratuvarına;<ul style="list-style-type: none">o 41 adet DELL W10B marka All in One bilgisayar,o 21 adet iki bilgisayarlık masa,o 41 adet hilton tipi sandalye, 40 adet ilave hilton tipi sandalye,o 1 adet elektrik panosu, 41 adet 6'lı priz ve elektrik kabloları teslim edilmiştir.- Koyulhisar Meslek Yüksekokulu, bilgisayar laboratuvarına;<ul style="list-style-type: none">o 26 adet kasalı bilgisayar teslim edilmiştir.- İmranlı Meslek Yüksekokulu, bilgisayar laboratuvarına;<ul style="list-style-type: none">o 10 adet kasalı bilgisayar teslim edilmiştir

2015 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır. 2015 yılında; 375 dergi kategorisinden 39.358 adet fasikül süreli yayın, 2.103 Basılı Kitap ile 1.851 e-dergi, 2.800.000 e-kitap ve 145 tez alımları yapılmıştır. Böylece 2015 yılında toplamda; 1.472 dergi kategorisinden 59.839 adet fasikül süreli yayın, 68.056 Basılı Kitap ile 100.000 e-dergi, 3.000.000 e-kitap, 3.638 tez ve veritabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 27 olmuştur.

2015 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamında **Makine – Teçhizat alımları** için ayrılan ödeneklerle belirtilen malzeme ve cihazlar alınmıştır. Ventilatör, Barkod Yazıcı, Bilgisayar, Monitör, Hasta Yatağı, Transfer Sedye, Acil Müdahale Sedyesi, Ventilatör, Bilgisayar Kasası, Fotokopi Makinesi, Hibrit Küvöz, Üst Düzey Yeni Doğan Yoğun Bakım Küvöz Cihazı, Değişken Açılı Çift Dedektörlü Tek Foton Bilgisayarlı Tomografi(Spect) Gamma Kamera Sistemi, Kardiyak Amaçlı Çift Dedektörlü Spect Gamma Kamera Sistemi, Ventilatörlü Transport Küvöz, C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı, Cerrahi Tanı Ve Girişim Seti, Duedenoskop, Üst Düzey Renkli Dijital Dopplerli Ultrasonografi Sisitemi, Harici Depolama Birimi, Fc Host Bus Adapte, Endoskopik Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, Radial Ultrasonografik Video Gastroskop, Lineer Ultrasonografik Video Gastroskop, Lineer Tarayıcı Ebus Cihazı, Medikal Renkli Lcd Monitör, Bilgisayarlı



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI ÜZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Dijital Görüntü Aktarım Ve Arşivleme Sistemi, Bilgisayarlı Dijital Görüntü Aktarım Ve Arşivleme Sistemi, Mekanik Ventilator, Merkezi Monitörlü Hasta Başı Monitörü, Anestezi Cihazı, Video Laringoskop Miller Model Blade, Video Laringoskop Dörges Model Blade, Video Flexible Urs, Göz Yıkama Ünitesi, Sanayi Tipi Elektrikli Çıt Çıt Çakma Makinesi, Soğuk Hava Deposu, Laparoskopik Alet Seti, Laparoskopik Vasküler Klemp Seti, Laringoskop Yetişkin, Yatak Tartısı, Kan ve Serum Isıtma cihazı, Laparoskopik x-large boy hemoloc klips aplikatörü Class II A tip biyogüvenlik kabini, El terminali, HRV Biyofizyolojik kayıt sistemi, Asansör makine motoru, HRV Biyofizyolojik kayıt sistemi, Olympus PSD30 marka koter cihazı için kablo MAJ 813, Yoğun led fototerapi cihazı alımı, Kuru tip akü, 12 Volt 9 Amper AKÜ, Kapı kontrol ünitesi, 10 Lt Alüminyum oksijen tüpü, Oksijen sensörü, Yangına dayalı düperthal, type90 classic line one kimyasal madde, Otomatik resüsitasyon cihazı, Masaya monte ekartör seti, LCD digital göstergeli vandal butonlu kabin kaseti, Mikrokontakt vandal butonlu NAO2000 kat kaseti, Isı probu, Valf, Pediatrik fiber optik laringoskop seti, Display kartı, Servo valf, LCD ekran, LCD sürücü high kartı, Lam Arşiv Dolabı, Pinomatik kart, LCD Ekran, Tens cihazı alımı yapılmıştır.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde; E blok 2.kat genel wc'leri, Göz, Genel Cerrahi, Onkoloji, Ortopedi, Hematoloji, Pediatri, Yeni Doğan servislerinin tüm wc'leri, özel oda banyoları, fayans ve tesisat olarak yenilenmiş, Pvc kaplamalar yapılmış, hemşire hazırlık tezgahları yenilenmiştir. Zemin kata kütüphane yapılmıştır.

Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi kapsamında 2015 yılında etüt projesi gerçekleştirilmiş ve ihale yapım aşamasına gelmiştir. 2016 yılında ihalesi yapılacak olup 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

2015 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında; 2015 yılı içinde 143 adet yeni proje desteklemeye alınmış önceki yıllardan devreden 181 projeye birlikte toplam 324 adet proje mevcut olup, bu projelerden 2015 yılın da 163 adedi sonuçlandırılmış ve 161 adet proje ise sonraki yıllara devrettilmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen C.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında merkezi laboratuvar inşaatı yapımı tamamlanmış olup, yıl içerisinde geçici kabulü yapılmış ve Sağlık Bilimleri ve Kanseri Araştırma (AR-GE) Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimi, Mühendislik Bilimleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimlerinin kurulabilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için cihaz ve makine teçhizatın temini amacıyla ihaleleri ve satınalma işlemleri yapılmış ve bir kısmı tamamlanmıştır ayrıca sarf malzemeler temin edilmiştir. Projenin 2015 yılı toplam harcama tutarı 1.241.346,98.-TL olmuştur.

2015 yılında Eğitim, Sağlık, Spor, Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında hedeflenen amaçlar doğrultusunda tamamlanmıştır.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. Yatırım Uygulamaları

4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 228.098.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2014 yılı katlanmış harcama tutarı ise, 169.392.000.- TL olmuştur. 2015 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 21.498.000.-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 7.050.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 28.548.000.- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 22.257.000.- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 9.000.000 TL iken yıl içerisinde Yıl içerisinde likit karşılığı olarak 2.000.000.- TL ödenek eklenmiştir. Kalkınma Bakanlığınca Yatırımları hızlandırma ödeneğinden 4.000.000.-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 15.000.000.-TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle 8.623.000.- TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Döner sermaye işletmemiz tarafından 1.275.000.-TL lik harcama yapılmıştır.


Üniversitemizin **Spor Sektöründe** toplam proje tutarları 9.500.000.- TL'dir. Söz konusu proje kapsamında 2014 yılı katlanmış harcama tutarı 00.- TL olmuştur. 2015 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 3.000.000.-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 600.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 3.600.000.- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 3.594.000.- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 23.130.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2014 yılı katlanmış harcama tutarı ise, 17.950.000.- TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle 5.680.000.-TL özel hesaba aktarılmıştır.

Sektör	2015 Yılı Ödeneği	2015 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Eğitim	28.548.000	22.257.000	78
Sağlık	15.000.000	8.623.000	57
Spor	3.600.000	3.594.000	99
Sosyal Teknolojik	5.680.000	5.680.000	100
Toplam	52.828.000	40.154.000	76



2015 YILLI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

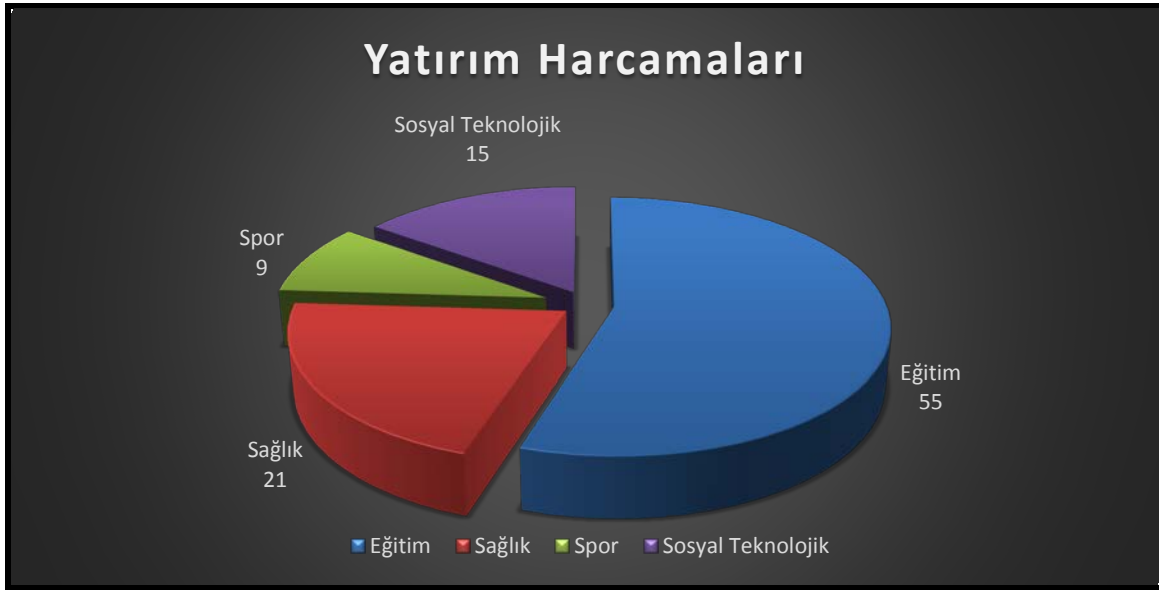

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

III- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2015H030890 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2015 yılı yatırım programı kapsamında 100.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde likit karşılığı 1.250.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 1.350.000.-TL olmuştur. Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 600.000,00 TL harcama yapılmıştır.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %49 olmuştur.

1.2- Proje No: 1974H030250 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2015 yılı yatırım programı kapsamında 3.250.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödenekten 2015 yılı sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, kampus asfalt, yol ve iş makinesi alımı için 3.208.000- TL harcanmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 85.000.000.-TL olup, 2014 yılı kümülatif harcama tutarı 79.836.000.- TL dir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

1.3- Proje No: 2003H030480 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz detay programına göre bu projeden, İnşaatı devam eden Rektörlük Ek Binası, Veteriner Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Merkezi Kütüphane, Konferans Salonu devam etmektedir. 2015 yılı yatırım programında Derslik ve Merkezi Birimler projesine 15.150.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. 600.000.-TL si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine aktarılmıştır. Toplam ödenek 14.550.000.-TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle proje kapsamında 9.475.000.TL harcama gerçekleştirilmiştir.


Bu projenin toplam tutarı 140.000.000.- TL. olup, 2014 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 89.556.000.- TL. dir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 65 olmuştur.



2015 YILLI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Eğitim Sektörü Projeler	2015 Yılı Ödeneği	2015 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.350.000	600.000	44
Kampus Alt Yapı	3.250.000	3.208.000	99
Derslik ve Merkezi Birimler	14.550.000	9.475.000	65
Muhtelif İşler	8.698.000	8.274.000	95
Yayın Alımı	700.000	700.000	100
Toplam	28.548.000	22.257.000	78

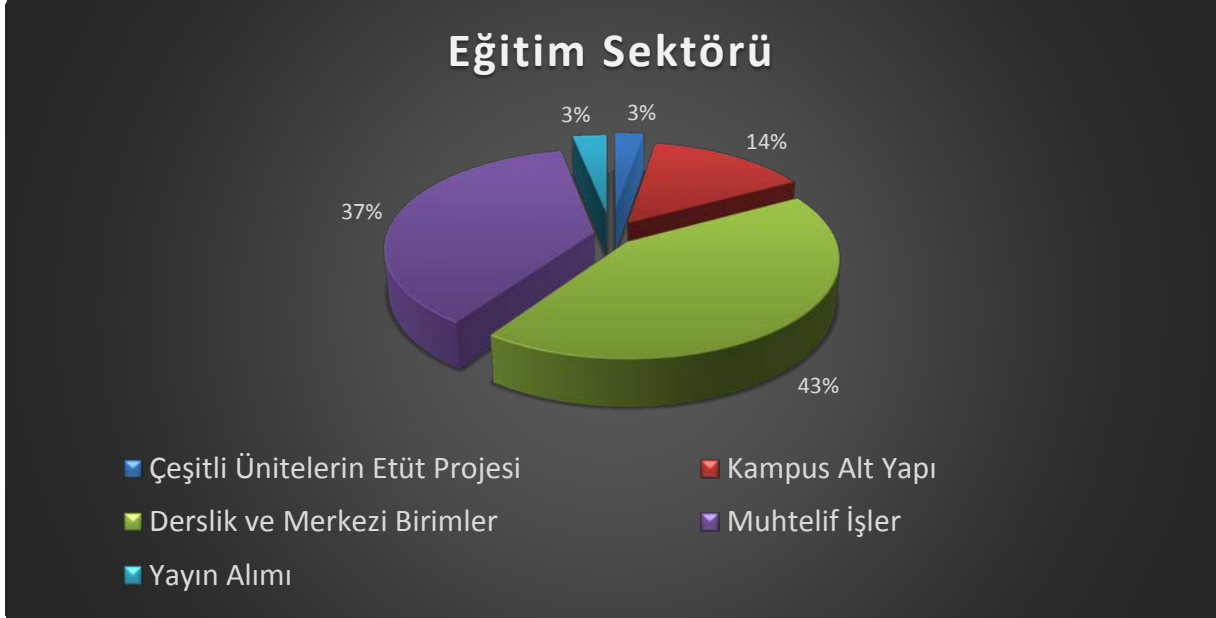

1.4- Proje No: 2015H030900 Proje Adı: Muhtelif İşler

1.4.1. Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 428.000.- TL'si hazine yardımı, 700.000.- TL öz gelir olmak üzere toplam 1.128.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak 1.600.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 2.728.000.-TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibarıyla üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 2.358.000.-TL harcama gerçekleştirmiştir.

2015 yılında bu proje kapsamında nakdi gerçekleşme oranı % 86 olmuştur.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.4.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 746.000.-TL hazine yardımı karşılığı, 200.000.- TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 946.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelirden, 3.300.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 4.246.000.-TL olmuştur.

Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Rektörlük Makine teçhizat alımları için 4.198.000.-TL, lik harcama yapılmıştır.

2015 yılı için akreditif hariç nakdi gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.

1.4.3. Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2015 yılında 500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 1.100.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 1.600.000.-TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanımı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 1600.000.- TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.4.4. Taşıt Alım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim bütçesinde 1 adet T02 binek otomobil 44.000,00.-TL, 1 adet T07 pick-up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) arazi hizmetleri için 80.000.-TL. Toplam ödenek 124.000,00.-TL'dir. Toplam bütçe ödeneğimiz 124.000.-TL olmuştur.

2015 yılı içinde söz konusu hizmet araçların satın alımı yapılmış 118.000.00.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 95 olmuştur.

1.5- Proje No: 2015H030910 Proje Adı: Yayın Alımı

Üniversitemiz kütüphane yayın alımları olarak Muhtelif İşler projesi kapsamında 2015 yılında 300.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 400.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı, on-line veri tabanı olarak 700.000.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



2015 YILLI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Muhtelif İşler	2015 Yılı Ödeneği	2015 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	2.728.000	2.358.000	86
Makine Teçhizat Alımı	4.246.000	4.198.000	98
Bilgi Teknolojileri	1.600.000	1.600.000	100
Taşıtl Alımı	124.000	118.000	100
Toplam	8.698.000	8.274.000	95





2015 YILI YATIRIM PROGRAMI UZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

2.1. Proje No: 2014H050040 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde de 3.000.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 600.000.-TL ödenek aktarması yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 3.600.000.-TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle 3.594.000-TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 9.500.000.- TL. olup, 2014 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 0.00.-TL'dir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

3. Sağlık Sektörü

3.1. Proje No:2015I000131 Proje Adı: Muhtelif İşler

3.1.1. Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Büyük Onarım için, 1.500.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Toplam bütçe ödeneği 2.522.000,00-TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle Hastane Büyük Onarımı için 1.211.000.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 48 olmuştur

3.1.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında makine teçhizat alımları için 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit karşılığı olarak 2.000.000.-TL'lik ödenek eklemesi yapılmıştır. Kalkınma Bakanlığınca yıl içerisinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden 4.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 9.000.000,00-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle harcaması 7.412.000.- TL'dir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 82 olmuştur.

Ayrıca Yatırım Programında Döner sermaye gelirlerinde harcanmak üzere 1.000.000.- TL yatırım harcaması yapılması planlanmış, Döner sermaye işletme müdürlüğümüzün bütçe olanakları kullanıldıktan bu projeye yılsonu itibariyle döner sermaye gelirlerinden 1.275.000.- TL lik harcama yapılmıştır.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 128 olmuştur.



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.1. Proje No:2015I000130 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

3.1.1. İnşaat

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için; 6.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Toplam bütçe ödeneği 6.000.000,00-TL olmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için 0.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 0 olmuştur.

3.1.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için; 0.- TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için 0.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 0 olmuştur

4. DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü

4.1. Proje No: 2015K120220 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 4.430.000,00 TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2015 yılında toplam bütçe aktarması 4.930.000,00.- TL'dir. 2015 yılında özel hesaptan yatırım programı dâhilinde harcanan tutar 4.930.000.-TL olmuştur.

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

4.2. Proje No: 2011K120250 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kalkınma Bakanlığınca desteklenen bu projemize 2015 yılında 750.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 750.000.-TL özel hesaba aktarılmıştır. 2015 yılında özel hesaptan bu projeye toplam 750.000- TL harcama yapılmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 18.700.000.- TL. olup, 2014 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 17.950.000.- TL'dir

2015 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



2015 YILLI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV-ÖNERİLER

- ✓ Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

KURULUŞ ADI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

(BİN TL)

Kuruluş Adı	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)	
YSK (2)												
417	2014H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	9.500	0		3.600		3.594	
417	2015H030890	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Sivas	100	0		1.350		600	
417	1974H030250	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	85.000	79.836		3.250		3.208	
417	2003H030480	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Sivas	140.000	89.556		14.550		9.475	
417	2015H030900	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Sivas	2.698	0		8.698		8.274	
417	2015H030910	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Sivas	300	0		700		700	
TOPLAM							237.598	169.392	32.148			25.851

SAĞLIK												
Sektör Adı	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)	
YSK (2)	417	2015I000131	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Sivas	3.000	0	9.000		8.623	
	417	2015I000130	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	59.000	0	6.000		0	
	417	2015I000131	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2015	Sivas	1.000	0	1.275		1.275	
			TOPLAM				62.000	0	15.000		8.623	
DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA												
Sektör Adı	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)	
YSK (2)	417	2015K120220	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZ GELİR	2015	Sivas	4.430	0	4.930		4.930	
	417	2011K120250	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	ÖZEL BÜTÇE	2015	Sivas	18.700	17.950	750		750	
			Merkezi Araştırma Laboatuvarları	İNŞAAT (10400M2)	2013	Sivas	7.575	7.575	0		0	
			Merkezi Araştırma Laboatuvarları	MAK.TEÇ.	2015	Sivas	11.125	10.375	750		750	
			TOPLAM				23.130	17.950	5.680		5.680	

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam
Eğitim	6		237.598		169.392			24.498			32.148			25.851	
Sağlık	2		62.000					9.000			15.000			8.623	
D.Kamu Hizm.	2		23.130		17.950			5.180			5.680			5.680	
-İktisadi															
-Sosyal	2		23.130		17.950			5.180			5.680			5.680	
TOPLAM	10		322.728		187.342			38.678			52.128			40.154	

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam
Sağlık	1		1.000					1.000			1.275			1.275	
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		1.000					1.000			1.275			1.275	

