



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2017



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
Eğitilmesi olacaktır.”*

M. Atatürk



İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME	11
1. Misyon ve Vizyon.....	11
1.1. Vizyon.....	11
1.2. Misyon.....	11
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	12
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	14
3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi.....	14
3.2. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	15
4. Yatırım Uygulamaları.....	21
4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	21
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	22
III- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI	23
1. Eğitim Sektörü	23
2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	26
3. Sağlık Sektörü	26
4. DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü.....	28
IV-ÖNERİLER.....	29



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısarık değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleştir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde 2016 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %54'ü Eğitim, %6' sı Beden Eğitimi Spor, % 30'u Sağlık, %10'u Bilimsel Teknoloji Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan Üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2016 yılı yatırım programı ile Üniversitemiz nezdinde yürütölen projeler karşılığı olarak 49.025.000 - TL ödenek öngörölmüştür. Bu ödeneklerin hazine yardımı karşılığı 43.412.000 - TL, öz gelir karşılığı ise 5.613.000.- TL dir.

2016 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 6.650.000. TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden 5.000.000.TL ödenek aktarılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 60.675.000.- TL olmuştur. Ödeneğimizin 48.719.000.-TL'si harcanmış, 11.956.000.- TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 80'dir.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör



2016 YILLYATIRIM PROGRAMLİZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

1.1. Vizyon

Bölgenin geleceğinin şekillenmesinde rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktadır.

1.2. Misyon

Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası r ekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, sorgulayan, araştıran, çözümleyen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Eğitim-öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek.

HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak

HEDEF 1.2: Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak

HEDEF 1.3: Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak

HEDEF 1.4: Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek

HEDEF 1.5: Eğitim programlarını modern üniversite eğitiminin gereklerine göre geliştirmek

Stratejik Amaç 2

Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak.

HEDEF 2.1: Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

HEDEF 2.2: Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek

HEDEF 2.3: Kütüphane imkanlarını ve elektronik yayınlara erişimi artırmak

HEDEF 2.4: Araştırma laboratuvarlarının altyapı ve donanımı geliştirilerek daha fazla ve daha kaliteli araştırma yapılmasına imkan sağlamak

Stratejik Amaç 3

Yüksek standartlara sahip Kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve Kampüsü kullanan diğer paydaşların yaşam kalitesini artırmak.

HEDEF 3.1: Kampüsteki sosyal, kültürel ve sportif olanakları geliştirerek kampüsün gerek öğrenci gerek çalışanlar için uygun bir yaşam ortamı olmasını sağlamak

HEDEF 3.2: Öğrencilerin ve çalışanların barınma ve ulaşım ihtiyaçlarına yaşanabilir bir kampüs içinde çözüm sunmak

HEDEF 3.3: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin kente, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Stratejik Amaç 4

Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Sivas Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel yapısının gelişimine katkıda bulunmak.

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak

Stratejik Amaç 5

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak.

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, belli alanlarda uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak

HEDEF 5.2: Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak

HEDEF 5.3: Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

Stratejik Amaç 6

Üniversitenin amaç ve hedeflerini hayata geçirecek kurumsal yönetim sistemini geliştirmek.

HEDEF 6.1: Bütünleşik yönetim bilgi sistemini ve bilgi işlem altyapısını geliştirmek suretiyle sunulan hizmetin etkinliğini artırmak

HEDEF 6.2: Çalışanların bilgi ve beceri gelişimini sağlamak ve katılımı geliştirmek suretiyle çalışma yaşamında memnuniyeti ve verimliliği artırmak

HEDEF 6.3: Üniversite kaynaklarının mali mevzuata uygun kullanılması yanında etkin, ekonomik ve verimli değerlendirilmesine yönelik mali yönetim sistemini şeffaf bir yönetim anlayışı içinde güçlendirmek



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları YAPI İŞLERİ

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıta sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Üniversitemiz 127.965 m² kendi arazisi, 6.078.551m² hazinece tahsis edilen arazi, 39.525m² üniversite vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 5 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 24 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Belediyesi sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 192 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık su arıtma tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

228.568m² eğitim, 109.007m² sağlık, 91.480m² idari, 91.783m² sosyal, 50.054m² spor, 12.665m² araştırma alanları olmak üzere toplam 583.547m² kapalı alana sahip üniversitemizde; 40 adet toplantı salonu, 32 adet konferans salonu, 18 adet 50-250 kişilik amfi, 590 sınıf, 88 bilgisayar laboratuvarı, 374 adet diğer laboratuvarlar olmak üzere 1.142 adet derslik ile hizmet vermektedir.

223 Prof. 167 Doçent, 430 Yardımcı Doçent, 331 Öğretim Görevlisi, 50 Okutman, 606 Araştırma Görevlisi, 15 Uzman ve 1.712 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2016 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi için **Kampus altyapı projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için; 19.07.2016 tarihinde ihalesi yapılan, 3.999.530,45 TL. Sözleşme bedelli Kampüs Alt Yapı İnşaatı kapsamında; Yabani hayvanların kampüse girmesini engellemek için orman ve kampüs arasına yabani hayvan korunma çiti imalatlarına başlanmış 1020 m lik alanın beton imalatı tamamlanmıştır. Dış hekimliği Fakültesi çevresine ve Taha Akgül Spor Salonunun çevresine kilit parke imalatı yapılmıştır. Nano Teknoloji ve Merkezi Laboratuvar çevresine betonarme tel çit imalatı yapılmıştır. Nano Teknoloji çevresine kilit parke imalatı yapılmıştır. Yeni helikopter pistinin temeli tamamlanmıştır. Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi arasındaki yaya yoluna yivli karo imalatları yapılmıştır. Kültür Merkezi önüne karo imalatı yapılmıştır. Kampüs giriş nizamiyesinin yeri değiştirilmiş, yeni giriş nizamiyesi tamamlanmıştır. Taha Akgül Spor Salonunun çevre aydınlatması yapılmış, lojmanlar trafosu hücre panoları yenilenmiş ve 1 adet jeneratör alımı gerçekleştirilmiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesinde 2014 yılında ihalesi yapılan Rektörlük Ek Bina, Mimarlık Fakültesi, Merkezi Kütüphane İnşaatı tamamlanmış olup geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır. Ayrıca, Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İnşaatı, Konferans Salonu İnşaatı, C.Ü.Yıldızdağı Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YİSBAM) inşaatı yapımı devam etmektedir.

2016 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Büyük Onarım işinde;** Mühendislik Fakültesi A-B bina girişlerine markiz yapılmıştır. Dış Hekimliği Fakültesinde 15 Temmuz Şehitler Polikliniği yapılmış, hükümlü tedavisi için yeni mahaller oluşturulmuş, tıbbi atık deposu yanına yeni bir tüp odası yapılmıştır. İlahiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Yabancı Diller gibi birçok fakültede sıva, boya imalatları yapılmıştır. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü için derslikler bürolara çevrilmiştir. Çeşitli fakültelerde sıva boya, laminant kaplama ve tadilatlar yapılmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu zemin kat pencere demirleri yapılmış, bay-bayan engelli wc yapılmış, bazı dersliklerde sıva boya imalatları yapılmıştır. Tıp Fakültesi dış cephe mantolamasına başlanmış 3 blok tamamlanmıştır. Bodrum Katta eski mahaller yıkılmış, yemekhane için yeni bir mekan oluşturulmuş, bodrum katta 2 adet wc tamamen yenilenmiş, kadavra salonunda tadilatlar yapılmış, bazı bölüm ve derslikler de sıva boya imalatları yapılmıştır. Merkezi Amfi büyük salonda tavan tadilatları, boya badana imalatları yapılmıştır. Teknoloji Fakültesinde güvenlik kulübesi yapılmış, wc tamiratları yapılmış kütüphane için yeni bir mahal oluşturulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesinde yangın merdiveni yapılmış, rejji odası genişletilmiştir. Kampüs genelinde bazı fakültelelere ahşap, alüminyum ve PVC kapılar yapılmıştır. Çeşitli elektrik tadilat işleri ile beraber,



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi ile Öğrenci Yemekhanesi'ne engelli hidrolik asansörler yapılmıştır.

İlçelerde çevre istinatları, yangın merdivenleri,okulların çevre çitleri ve boya işleri yapılmıştır. Kompanzasyon panolarındaki arızalar giderilerek,çeşitli elektrik tadilat işleri yapılmıştır.Ayrıca Suşehri MYO kazan dairesi içerisine bölme yapılip zemin ve duvarlar seramik kaplama yapılmıştır.Katı yakıtlı kalorifer kazanı doğalgazla çalışan yeni kalorifer kazanı ile değiştirilerek montajı yapılmıştır.Okul bahçesinde bulunan tören platformunun üzeri çeşitli demir imalat ile kapatılmış ve İmranlı MYO Büyük Onarım İnşaatı işinde İmranlı MYO yeni idari binaya pvc pencere, alüminyum bölme kapı, ferforje pencere korkuluğu ve giriş kapısı yapılmıştır. Kullanılmaz durumda olan kalorifer kazanı yenisi ile değiştirilmiştir.

Lojmanlarda 300.825 TL sözleşme bedelli 2016 yılı Büyük onarım kapsamında, sıhhi tesisatı kapsamındaki pis su tesisatının bodrumlardaki ana hatların yenilenmesi ve rögar bağlantılarının yenilenmesi ,Tretuar tamiri, çatı ve baca tamiri,yağmur suyu borusu ve oluklarının tamiri,kapı ve ısıcam tamirleri,çevre aydınlatmalarının ve bina merdiven boşluklarındaki aydınlatmaların tadilatı, 3 adet hidrolik engelli insan asansörü yapımı işleri tamamlanmıştır

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri proje kapsamında; 2014 yılında ihalesi yapılan Kapalı Spor Salonu İnşaatının yapımı % 100 tamamlanmış olup geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır.

2016 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yar alan **Rektörlük Makine-Teçhizat** alımları kapsamında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır. Devlet Malzeme Ofisinden 4 adet fotokopi makinesi, 2 adet projeksiyon, 121kalem buro mobilyası, 200 adet konferans salonu sandalyesi, 2 adet akıllı tahta, 1 adet araç, 1 adet lazer kesme cihazı alımı yapılmıştır. Diş hekimliği fakültesine 17 adet diş ünit, 70 bilgisayar alınmış fosfor plak görüntüleme sistemi kurulmuştur.Fen Fakültesi için 4 Kalem Laboratuar Malzemesi Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İletişim Fakültesi için Işık Sistemi ve Truss Sistemi Kurulumu ihalesi gerçekleştirilmiştir. Mühendislik Fakültesi için 31 Kalem Laboratuar Malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Edebiyat Fakültesi için Simültane Yabancı Dil Laboratuvarı Kurulumu ihalesi gerçekleştirilmiştir. Veterinerlik Fakültesi için Mikroskop Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.ayrıca Rektörkük tarafından; Büro Mobilyası Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Öz Gelir Karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; Bekleme Koltuğu Tekli 40 Adet, Misafir Koltuğu İkili 8 Adet, Yemek Masası 80X80 10 Adet, Yemek Masası Yuvarlak 10 Adet, Sehpa 7 Adet, Soyunma Dolabı 9 Adet, Ayaklı Askılık 10 Adet, Yuvarlak Yemek Masası 5 Adet, Çay Semaveri 3 Adet, Masa Tenisi Masası 12 Adet, Yatak Tek Kişilik 240 Adet, Fotokopi Makinası 1 Adet, Bilgisayar 8 Adet, Projeksiyon Cihazı 1 Adet, Hakem Koltuğu 1 Adet, Basketbol Potası 2 Adet, Masatenisi Masası 10 Adet, Tenis Hakem Koltuğu 1 Adet, Skorbord 1 Adet, Yazıcı 1 Adet, Plastik Sandalye 8 Adet, Dosya Dolabı 6 Adet, Soyunma Dolabı 38 Adet, Tek Kapılı Soyunma Dolabı 6 Adet, Banko 6 Adet, Beşgen Profilli Masa 6 Adet, Üçgen Sehpa 6 Adet, Çalışma Koltuğu 15 Adet, Misafir Koltuğu 12 Adet, Konferans Koltuğu 100 Adet, Kamera Sistemi 8 Adet alımı yapılmıştır.

2016 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi Bilgi Teknolojileri Alımları** kapsamında;

Sıra no	İşin Tanımı
1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İçin AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
2	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İçin YORDAM Kütüphane Katalog Tarama Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
3	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İçin DİYOS Elektronik İhale Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
4	Personel Daire Başkanlığı İçin ve Enstitüler İçin ÜNİPA Personel ve Öğrenci İşleri Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
5	Üniversite birimlerinde bulunan Toshiba Marka Fotokopi Makineleri İçin Toplu Bakım Anlaşması
6	Güvenlik Birimine Güvenlik Kameraları İzlemeleri İçin Büyük Boy Televizyon Alımı
7	Hukuk Müşavirliği için İcra Takip Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
8	Hukuk Müşavirliği için Dava Takip Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
9	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı DMO üzerinden Kablolü ve Kablosuz Ağ Erişim Cihazları Alımı
10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimine Corel Draw X8 Çizim Programı Alımı
11	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na Bilgisayar Laboratuvarı Sandalyesi Alımı
12	Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı
13	Tüm Üniversite Amir ve Akademik Personeline KAMUSM'den E-İmza Çubuğu Alımı
14	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı DMO üzerinden İş İstasyonları İçin Klima Alımı
15	Hukuk Müşavirliği'ne SİNERJİ Mevzuat ve İçtihat Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
16	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na DMO üzerinden SFP Modül Alımı
17	Rektörlük ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Renkli Yazıcı Alımı
18	Tüm Üniversiteye LABRİS Elektronik Posta Sunucusu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

19	Tüm Üniversiteye CHECKPOINT Güvenlik Duvarı Yazılımı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
20	MICROSOFT Ürünleri Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
21	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Sanallaştırma Sistemine İlave Sunucu Alımı
22	Rektörlük Binasına DMO üzerinden XRAY Cihazı Alımı
23	Edebiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim MERkezi'ne Optik Okuyucu Cihazı Alımı
24	Tüm Üniversiteye KASPERSKY Antivirüs Yazılımı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
25	Tüm Üniversiteye DMO üzerinden Nizamıve Kapıları Kamera ve Plaka Okuma Sistemi Alımı
26	İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ne DMO üzerinden Telefon Santrali Alımı
27	Tüm Üniversiteye MATLAB Yazılımı Alımı
28	Rektörlük Binasına DMO üzerinden 80 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı
29	Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne Yüz Tanımalı Turnike Geçiş Sistemi Alımı
30	Tüm Üniversiteye DMO üzerinden Bilgisayar , Notebook, Yazıcı Alımı
31	Tüm Üniversiteye CATIA Yazılımı Güncellemesi Alımı
32	Matbaa Birimine Grafik İşlerinde Kullanılmak Üzere Bilgisayar Alımı
33	Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO'na Mini Bilgisayar Alımı (Derslik Projeksiyonları için)
34	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyaçları İçin Muhtelif malzeme (fiber kablo, utp kablo, elektrik kablosu vb) Alımı

2016 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır. 2015 yılı içerisinde, 1.472 dergi kategorisinden 59.839 adet fasikül süreli yayın, 68.056 Basılı Kitap ile 100.000 e-dergi, 3.000.000 e-kitap ve 3.638 tez ve veritabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 10+17 = 27 dir. 2016 yılında bu sayılar, 1.130 dergi kategorisinden 28.854 adet fasikül süreli yayın, 72.026 Basılı Kitap ile 100.000 e-dergi, 3.000.000 e-kitap ve 3.874 tez ve veritabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 11+16 = 27 olmuştur



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** kapsamında **Makine – Teçhizat alımları** için ayrılan ödeneklerle belirtilen malzeme ve cihazlar alınmıştır. Ventilatör, Barkod Cihazı, Kanalma Koltuğu, Hastabaşı Monitörü, Kağıt Kesme Makası, Bekleme Koltugu, Defibilatör Cihazı, Projector, Yazıcı, Fotokopi Makinesi, Çalışma Koltugu, Toplantı Masası, Tekli Koltuk, İkili Koltuk, Üçlü Koltuk, Yemek Masası, Sandalye, İlaç Arabası, Refegatçi Koltugu, Hasta Yatağı, Mekanik Vantilatör, Serum Askısı, El Yıkama Ünitesi, Pansuman Arabası, Koltuk, Video Konferans Sistemi ve Kamerası, Cerrahi Motor Seti, Çok Fonksiyonlu Çivili Başlıklı Ekartör Sistemi, Bipolar Elektrokoter Cihazı, Fiberoptik - Bronkoskopi Cihazı, Rijit Bronkoskopi Cihazı, Otorefratometri+Keratometri+Tonometri+Pakimetre Kombine Cihazı, C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı, Hd Video Endoskopi Sistemi, Rinoplasti Seti , Fess Sati, Video Rhino Laringoskop Cihazı, Başa Takılan Alın Işığı, Otomatik Kayar Kapı, 10mm'lik Endoskopik Parçalanabilir Xi Ekstra Büyük Boy Absorbe Olmayan Polimer Ligasyon Klips Aplikatörü, Bipap Cihazı, Ay Masa, Ambulator Kan Basıncı Monitörü, Holter Sistemi, Transpalet , D-C Seti, İnce İstemci, Klima , Sıcaklık Ve Nem Ölçer, Steteskop, Isı Ölçer, Sternum Testeresi Bıçağı, Hava Üfleyici, Şarjlı Matkap, Kapı Kolu, Elektrik Uzatma Kablosu, 6+1 Basamaklı Portatif Alüminyum Merdiven, O2 Blender, Led Panel, Mainbord, Cihaz Kalibrasyonu, 40x40 Membran Filtre, 1400.07.04 B İşlemci, Defibrilatör, T Parça Canlandırıcı Cihazı, Rulman 6210-2zc3 , Akü, Gri Handpiece, Endocer/Ec11133s, Klima İçin Filtre, Ekg Kablosu, Mikser, Mikrofon, Hoparlör, Laparoskop Görüntü Ara Kablosu, Sistoskop Üretroskop Kılıfı 22 Fr, Sistoskop Üretroskop Kılıfı 19 Fr, Teleskop Köprüsü, Larenx Aynası 18 Mm, 6 Volt 20 Watt Ampul, Göbek Rulman Seti, Kontrol Kartı, Sensör Okuyucu, Halat, Makara, Fiber Optik Laringoskop Seti, Cilt Isı Probu Beyaz Renk, Cilt Isı Probu Sarı Renk, Non-Invaziv Bilirubinmetre Cihazı, Filtre, Cyw100 Model Endoskopi Yıkama Cihazı, Kan Isıtma Ve Plazma Eritme Cihazı, Besleme Ünitesi, Eswl Membran, Ameliyathane Hasta Isıtıcı Blanket Sistemi, Trombosit İnkübatörü, Traktör Tipi Çim Biçme Makinesi, Rapid Komple Mekanizma Set, Besleme Ünitesi, Heate 3x3000 W 230 V 46 Series, Squeeze Tube A-60-G 4,0x1,6, Squeeze Tube Silicone 4,0x1,6, Pt-1000 Single Elbowed 2m, Cerrahi Makas, Sabit Voltaj Adaptör, Laparoskopik El Aletleri Seti, Fs 500 Sensör, 24 Volt Kart Okuyuculu Şifre Paneli, Tansiyon Manşonu , Power Supply Th719b Ti, Dending Section Assy, Vca Cap Connector Kapağı, Rubber Bending, Ct Absolute Endocer, Dikey Motor Ve Dikey Fren Kiti , Filter Dryer 46-4/5, Heate 3x3000 W 230 V 46 Series, Bipolar Çıkış Soketi, Monopolar Çıkış Saati, Varian Marka Dhx Model Lineer Hızlandırıcı İçin, C-Series Pendant Cable, Pcb Pendant, Geo Modu, Frc Ünitesi, Camera Head Assy, Flexible Section Assy, Bending Secyion Assy, Rubber Bending Section, Light Guide Bundle, Forceps Channel Tube, Air Tüne, Full Leaf Mlc Motor, Sas 1 Carbon Electrpdes, Sas 2 Valve Unit Maintenance Set alımı yapılmıştır.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde; Plastik cerrahi, Gastro, Nöroloji, Göğüs, Nöroşiröji, Dahiliye, Dermatoloji, Radyoloji, Kan alma, Organ nakli servislerinin tüm wc'leri, özel oda banyoları, fayans ve tesisat olarak yenilenmiş, duvar ve tavanları boyanmış, Pvc kaplamalar yapılmış, hemşire hazırlık tezgahları yenilenmiştir. A blok zemin kat, D blok 1.kat Ameliyathane katındaki genel wc ler yeniden düzenlenmiş asma tavan, fayans ve tesisat yenilenmesi yapılmıştır.

Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi kapsamında 2016 tarihinde ihalesi yapılan, C.Ü.Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı kaba inşaat aşamasında olup; temel, B ve C blokları bodrum ve zemin kat, trafo binası betonarme karkası, pis su şebeke hattı, temel drenajı bitmiş olup, elektrik temel topraklaması yapılmıştır. %11,60 oranında inşaat, %2,33 oranında elektrik tesisatı olmak üzere toplam % 13,93'ü gerçekleşmiştir. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 10.08.2019 dur

2016 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında; 2016 yılında 232 yeni projeye destek verilmiş ve önceki yıldan devreden 286 proje ve yıl içinde tamamlanan 196 projeye birlikte toplam 518 projenin takibi yapılmıştır. 349 adet proje sonraki yıla devretmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen C.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında merkezi laboratuvar inşaatı yapımı tamamlanmış olup, yıl içerisinde geçici kabulü yapılmış ve Sağlık Bilimleri ve Kanser Araştırma (AR-GE) Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimi, Mühendislik Bilimleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimlerinin kurulabilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için cihaz ve makine teçhizatın temini amacıyla ihaleleri ve satınalma işlemleri yapılmış ve bir kısmı tamamlanmıştır ayrıca sarf malzemeler temin edilmiştir. Projenin 2016 yılı toplam harcama tutarı 3.977.291,55.-TL olmuştur.

2016 yılında Eğitim, Sağlık, Spor, Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında hedeflenen amaçlar doğrultusunda tamamlanmıştır.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. Yatırım Uygulamaları

4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 238.000.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2015 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 197.390.000.- TL olmuştur. 2016 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 23.350.000.-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 5.950.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Kalkınma Bakanlığınca Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden 1.300.000.-TL ödenek aktarması yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 30.600.000.- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 26.276.000.- TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 83.000.000.- TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2015 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 00,00.- TL olmuştur. 2016 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 18.000.000.-TL olarak öngörülmüştür. Kalkınma Bakanlığınca Yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.000.000.-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 21.000.000.-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle 14.566.000.- TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Döner sermaye işletmemiz tarafından 663.000.-TL lik harcama yapılmıştır.


Üniversitemizin **Spor Sektöründe** toplam proje tutarları 10.000.000.- TL'dir. Söz konusu proje kapsamında 2015 yılı kümülatif harcama tutarı 5.573.000.- TL olmuştur. 2016 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 3.000.000.-TL olarak öngörülmüştür. Yıl içerisinde 700.000.- TL Likit Karşılığı eklenmiş 700.000.-TL Kalkınma Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden aktarılmış. Toplam Bütçe ödeneği 4.400.000.-TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 3.202.000.- TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 24.646.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2015 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 19.971.000.- TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle 4.675.000.-TL özel hesaba aktarılmıştır.

Sektör	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Eğitim	30.600.000	26.276.000	86
Sağlık	21.000.000	14.566.000	69
Spor	4.400.000	3.202.000	73
Sosyal Teknolojik	4.675.000	4.675.000	100
Toplam	60.675.000	48.719.000	80



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

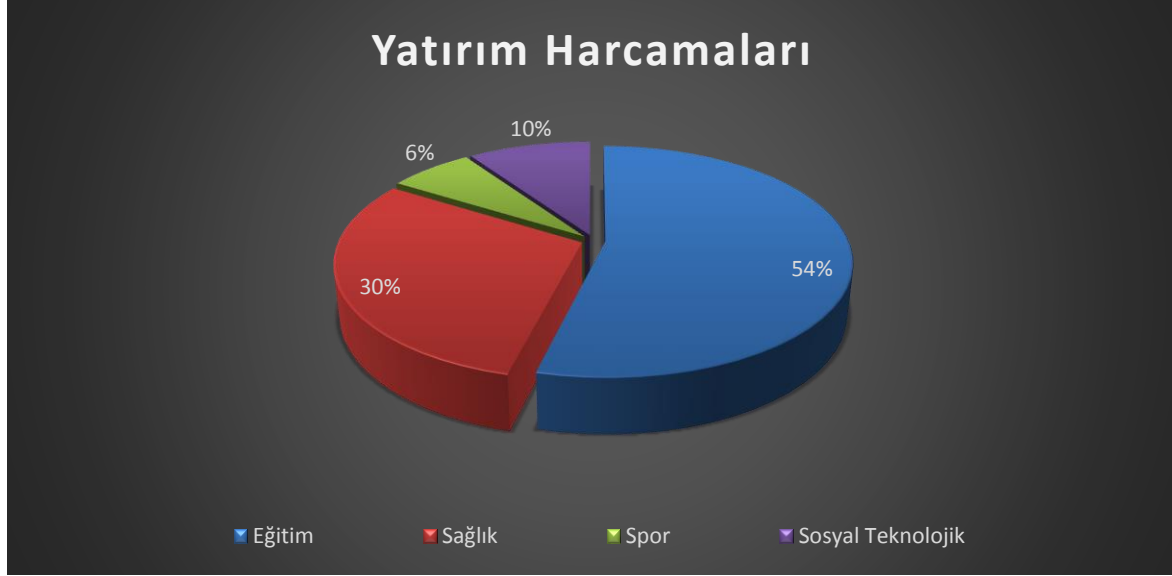

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

III- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2016H031890 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2016 yılı yatırım programı kapsamında 100.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Toplam ödenek 100.000.-TL olmuştur. Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 100.000 TL harcama yapılmıştır.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

1.2- Proje No: 1974H030250 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2016 yılı yatırım programı kapsamında 2.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödenekten 2016 yılı sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, kampus asfalt, yol ve iş makinesi alımı için 1.693.000- TL harcanmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 94.000.000.-TL olup, 2015 yılı kümülatif harcama tutarı 90.055.836.000.- TL dir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %98 olmuştur.

1.3- Proje No: 2003H030480 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz detay programına göre bu projeden, İnşaatı devam eden Rektörlük Ek Binası, Veteriner Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Merkezi Kütüphane, Konferans Salonu, Yıldız Dağı YİSBAM devam etmektedir. 2016 yılı yatırım programında Derslik ve Merkezi Birimler projesine 17.000.000 - TL ödenek tahsis edilmiştir. Kalkınma Bakanlığından 1.300.000. – TL akatarılmıştır. Toplam ödenek 18.300.000.-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle proje kapsamında 15.488.000.TL harcama gerçekleştirilmiştir.


Bu projenin toplam tutarı 144.000.000.- TL. olup, 2015 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 107.335.000.- TL. dir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 85 olmuştur.

Eğitim Sektörü Projeler	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100
Kampus Alt Yapı	2.000.000	1.693.000	85
Derslik ve Merkezi Birimler	18.300.000	15.488.00	85
Muhtelif İşler	9.350.000	8.145.000	87
Yavın Alımı	850.000	850.000	100
Toplam	30.600.000	26.276.000	86



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

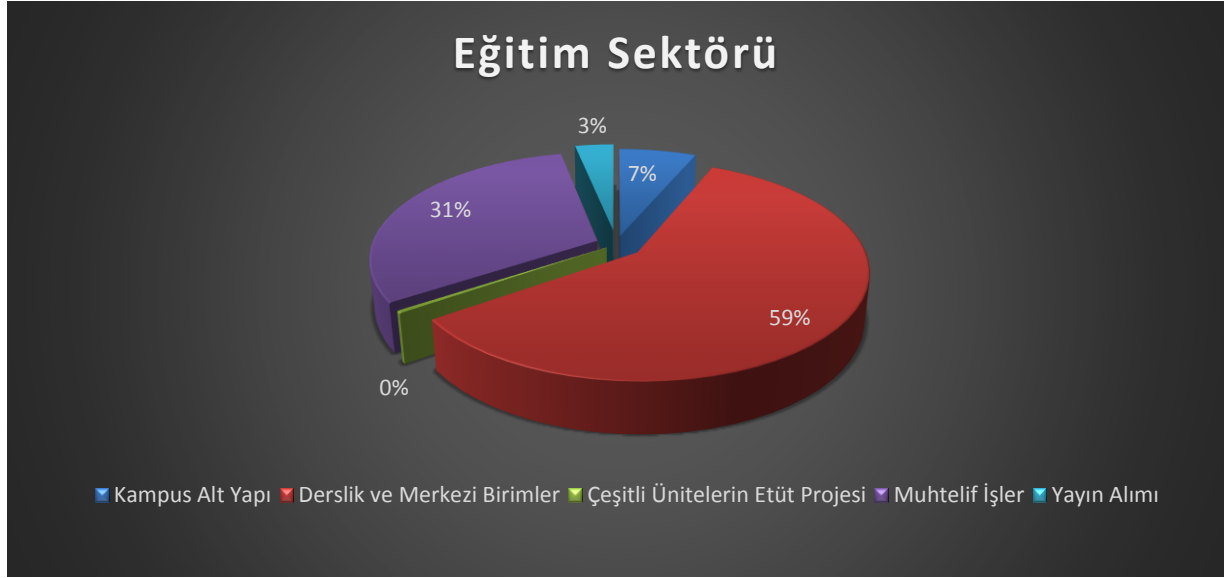

1.4- Proje No: 2016H031900 Proje Adı: Muhtelif İşler

1.4.1. Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 826.000.- TL'si hazine yardımı, 748.000.- TL öz gelir olmak üzere toplam 1.574.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak 1.300.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 2.874.000.-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 2.629.000.-TL harcama gerçekleşmiştir.

2016 yılında bu proje kapsamında nakdi gerçekleşme oranı % 92 olmuştur.

1.4.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 800.000.-TL hazine yardımı karşılığı, 200.000.-TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelirden, 2.443.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 3.443.000.-TL olmuştur.

Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Rektörlük Makine teçhizat alımları için 3.240.000.-TL, lik harcama yapılmıştır.

2016 yılı için akreditif hariç nakdi gerçekleşme oranı % 92 olmuştur.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.4.3. Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2016 yılında 850.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 2.050.000.-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 2.900.000.-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanımı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 2.143.000.- TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 74 olmuştur.

1.4.4. Taşıt Alım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim bütçesinde 1 adet T02 binek otomobil 46.000,00.-TL, Yurt içi hibe olarak envantere alınmıştır. Merkezi Yönetim bütçesinden 1 adet T05 minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) rektörlük hizmetleri için 76.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 57.000.-TL Likit Karşılığı ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneğimiz 133.000.-TL olmuştur.

2016 yılı içinde söz konusu hizmet araçlarının satın alımı yapılmış 133.000.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.5- Proje No: 2016H031910 Proje Adı: Yayın Alımı


Üniversitemiz kütüphane yayın alımları olarak Muhtelif İşler projesi kapsamında 2016 yılında 750.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 100.000.-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. . Toplam bütçe ödeneği 850.000.-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı, on-line veri tabanı olarak 850.000.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Muhtelif İşler	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	2.874.000	2.629.000	91
Makine Teçhizat Alımı	3.443.000	3.240.000	94
Bilgi Teknolojileri	2.900.000	2.143.000	74
Taşıt Alımı	133.000	133.000	100
Toplam	9.350.000	8.145.000	87



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

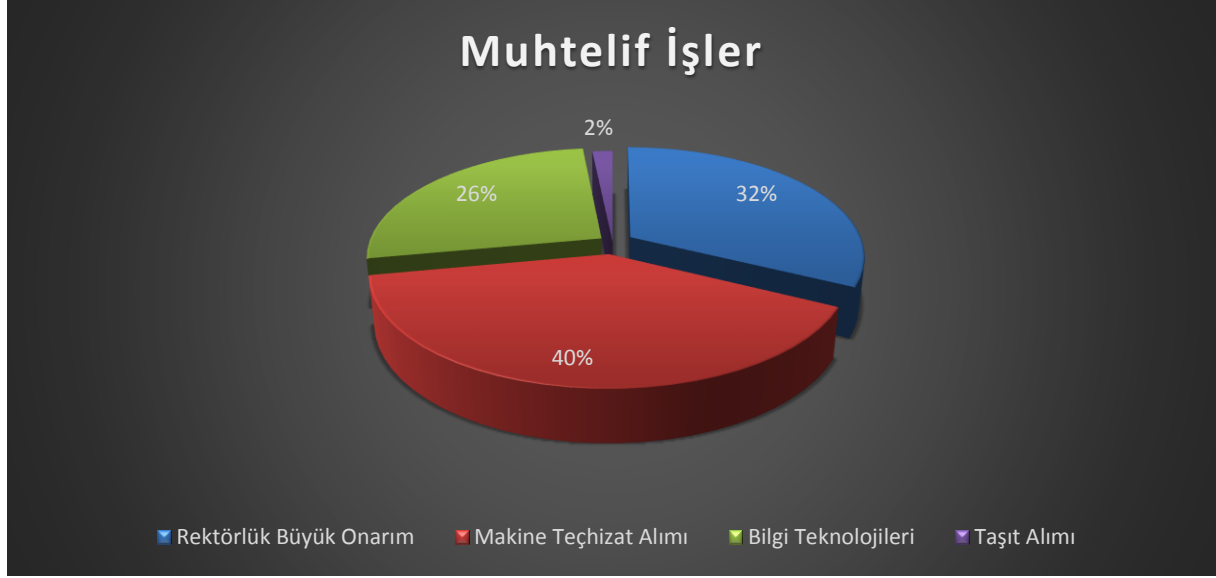

2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

2.1 Proje No: 2015H050040 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilin de 3.000.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 700.000.- TL Likit Karşılığı eklenmiş 700.000.-TL Kalkınma Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden aktarılmış. Toplam Bütçe ödeneği 4.400.000.-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle 3.202.000.-TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 10.000.000.- TL. olup, 2015 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 5.573.000.-TL'dir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 88 olmuştur.

3. Sağlık Sektörü

3.1. Proje No:2016I000131 Proje Adı: Muhtelif İşler

3.1.1. Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Büyük Onarım için, 4.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 1.221.000.-TL Makine-Teçhizat Büyük onarımına aktarılmış. Toplam bütçe ödeneği 2.779.000.- TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle Hastane Büyük Onarımı için 1.900.000.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 48 olmuştur.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.1.2. Makine ve Teçhizat Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 0.00-TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 1.221.000-TL Makine-Teçhizat Büyük onarımına aktarılmış. Toplam bütçe ödeneği 1.221.000.-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 1.011.000.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 83 olmuştur

3.1.3. Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında makine teçhizat alımları için 4.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığınca Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden 3.000.000.-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 7.000.000-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle harcaması 2.916.000.- TL'dir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 42 olmuştur.

Ayrıca Yatırım Programında Döner sermaye gelirlerinde harcanmak üzere 1.500.000.- TL yatırım harcaması yapılması planlanmış, Döner sermaye işletme müdürlüğümüzün bütçe olanakları kullanıldıktan bu projeye yılsonu itibariyle döner sermaye gelirlerinden 633.000.- TL lik harcama yapılmıştır.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 44 olmuştur.

3.1. Proje No:2015I000130 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

3.1.1. İnşaat

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için; 10.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Toplam bütçe ödeneği 10.000.000,00-TL olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için 8.739.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 75.000.000.- TL. olup, 2015 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 0.00.-TL'dir

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 12 olmuştur

3.1.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için; 0.- TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için 0.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 0 olmuştur



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü

4.1. Proje No: 2016K120220 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 4.665.000-TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2016 yılında toplam bütçe aktarması 4.665.000,00.- TL'dir. 2016 yılında özel hesaptan yatırım programı dâhilinde harcanan tutar 4.665.000.-TL olmuştur.

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

4.2. Proje No: 2011K120250 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kalkınma Bakanlığınca desteklenen bu projemize 2016 yılında 10.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 10.000.-TL özel hesaba aktarılmıştır. 2016 yılında özel hesaptan bu projeye toplam 10.000- TL harcama yapılmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 19.981.000.- TL. olup, 2015 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 19.971.000.- TL'dir

2016 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV-ÖNERİLER

- ✓ Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı	CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ										
Sektör Adı	EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ										(BİN TL)
YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
417	2015H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	10.000	5.573	1.400	4.400		3.202
417	2016H031890	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	100	0	0	100		100
417	1974H030250	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	94.000	90.055	0	2.000		1.693
417	2003H030480	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Sivas	144.000	107.335	1.300	18.300		15.488
417	2016H030900	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	3.500	0	5.850	9.350		8.145
417	2016H031910	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	750	0	100	850		850
TOPLAM						252.350	202.963	8.650	35.000		29.478

Sektör Adı	SAĞLIK										
YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
417	2016I000100	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	8.000	0	3.000	11.000		5.827
417	2016I000130	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	75.000	0		10.000		8.739
417	2016I000100	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2016	Sivas	1.500	0		1.500		663
TOPLAM						83.000	0	3.000	21..000		14.566
Sektör Adı	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA										
YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
417	2016K120230	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZ GELİR	2016	Sivas	4.665	0		4.665		4.665
417	2011K120250	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	ÖZEL BÜTÇE	2016	Sivas	19.981	19.971		10		10
		Merkezi Araştırma Laboatuvarları	İNŞAAT (10400M2)	2013	Sivas	8.090	8.090		0		0
		Merkezi Araştırma Laboatuvarları	MAK.TEÇ.	2016	Sivas	11.891	11.881		10		10
TOPLAM						24.646	19.971		4.675		4.675

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6		252.350			202.963			26.350			35.000			29.478
Sağlık	2		83.000						18.000			21.000			14.566
D.Kamu Hizm.	2		24.646			19.971			4.675			4.675			4.675
-İktisadi															
-Sosyal	2		24.646			19.971			4.675			4.675			4.675
TOPLAM	10		359.996			222.934			49.025			60.675			48.719

32

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1		1.500						1.500			663			663
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		1.500						1.000			663			663

