



**CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

**2017 YILI**  
**YATIRIM PROGRAMI İZLEME**  
**VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

MART/2018





*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin  
Eğitilmesi olacaktır.”*

*K. Atatürk*







## İÇİNDEKİLER

I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ .....	9
II- GENEL DEĞERLENDİRME .....	10
1. Misyon ve Vizyon .....	10
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri .....	11
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları .....	13
4. Yatırım Uygulamaları .....	27
III- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI .....	29
1. Eğitim Sektörü .....	29
2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü .....	32
3. Sağlık Sektörü .....	32
4. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü .....	33
IV- ÖNERİLER .....	33
2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU .....	34
2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ .....	35





## I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısarak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2017 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %44'ü Eğitim, %3'ü Beden Eğitimi Spor, % 43'ü Sağlık, %10'u Bilimsel Teknoloji Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2017 yılı yatırım programı ile üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 69.932.000- TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneklerin hazine yardımı karşılığı 64.010.000 - TL, öz gelir karşılığı 5.922.000.- TL ve taşıt hibesi olarak 51.000-TL dir.

2017 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 28.511.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 98.443.000.- TL olmuştur. Ödeneğimizin 92.720.950.-TL'si harcanmış, 5.722.049-TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 94'tür.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

**Prof. Dr. Alim YILDIZ**  
Rektör

## II-GENEL DEĞERLENDİRME

### 1. Misyon ve Vizyon

#### **Misyon**

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

#### **Vizyon**

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.

## 2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

### Stratejik Amaç 1

*Eğitim - öğretimin kalitesini arttırarak, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel değerlere açık olan bireyler yetiştirmek*

- HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim altyapılarını oluşturmak ve sürekli geliştirmek
- HEDEF 1.2: Mevcut akademik personelin yetkinliklerini arttırmak ve ihtiyaca yönelik nitelikli akademik personel istihdamını sağlamak
- HEDEF 1.3: Başarılı öğrencilerin Cumhuriyet Üniversitesini tercih etmesine yönelik şehirle birlikte ortak çalışmalar yapmak
- HEDEF 1.4: Eğitim-öğretimi modern üniversite anlayışının gereklerine göre üretken ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirmek
- HEDEF 1.5: Araştıran, sorgulayan, değer üreten ve bilimsel düşünceye sahip öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik ortam ve süreçleri tasarlayıp sürekli geliştirmek

### Stratejik Amaç 2

*Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak*

- HEDEF 2.1: Proje kültürünü ve bilincini oluşturmak
- HEDEF 2.2: Başta bilimsel altyapıya değer katacak projeler olmak üzere sürece katkı sağlayan çalışmalar geliştirilerek proje sayısını ve kalitesini arttırılmak
- HEDEF 2.3: Araştırmacı kayıt sistemini tamamlamak, sürekli güncel tutmak ve üniversitemizin sıralamalarındaki yerini izleyerek gerekli önlemleri almak

### Stratejik Amaç 3

*Şehir ile üniversite arasında yürütülecek olan faaliyetlerde üst düzey eşgüdüm, yüksek standartlara sahip kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların yaşam kalitesini arttırmak*

- HEDEF 3.1: Üniversitemizin yerleşkelerinde paydaşlarımızın barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarına, yaşayan kampüs içinde çözüm bulmak
- HEDEF 3.2: Rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin şehre, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak ve bu hizmetlerle birlikte yabancı öğrenci ve engellilere ilişkin projeler yürütmek
- HEDEF 3.3: Şehir ile üniversitemiz (ilçeler dâhil) arasında ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek platformlar belirleyerek gerekli teknolojik altyapı ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek
- HEDEF 3.4: Şehrimizin mazisindeki kültürel ve tarihsel birikimin ortaya çıkarılması ve bu potansiyel üzerinde geleceğin inşasında kamu kurumları ve STK'larla işbirliğini yürütmek
- HEDEF 3.5: Ekolojik dengenin ve yeşil mirasın yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek

#### **Stratejik Amaç 4**

*Üniversite-Sanayi-Kamu ve Üniversite-Kent işbirliğini artırarak ulusal ve yerel ekonomiye ve sosyo-kültürel yapının gelişimine katkıda bulunmak*

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda şehir yaşamına katkıda bulunmak

HEDEF 4.3: Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliğini geliştirmek

#### **Stratejik Amaç 5**

*Üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak*

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, alanında uzmanlaşmış ve yüksek kalite standartlarına sahip bölge hastanesi olmak

HEDEF 5.2: Bölgemizde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçları karşılamak için ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve bakım merkezleri kurmak

HEDEF 5.3: Diş Hekimliği Fakültemizde genel anestezi ve sedasyon ile hastaların tedavilerinin yapılabilmesi için mevcut olan ameliyathanemizin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve 10 yataklı bir servis ile protez laboratuvarları kurmak

HEDEF 5.4: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık hizmeti sunmak için farkındalık oluşturmak

#### **Stratejik Amaç 6**

*Kurumsal yönetim sistemini geliştirerek paydaşlara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak.*

HEDEF 6.1: Yönetim bilgi sistemleri altyapısını geliştirerek sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak

HEDEF 6.2: Kurumsal insan kaynakları planlamasının yapılarak çalışanların niteliğini artırmak

HEDEF 6.3: Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması yönünde mali yönetim sistemini güçlendirmek

HEDEF 6.4: Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, birlikte iş yapabilme hissini geliştirmek

### 3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

#### 3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Üniversitemiz 127.965 m<sup>2</sup> kendi arazisi, 6.078.551 m<sup>2</sup> hazinece tahsis edilen arazi, 39.525 m<sup>2</sup> üniversite vakıf arazisi, 32.438 m<sup>2</sup> tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m<sup>2</sup> özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 17 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 5 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 26 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Belediyesi sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 192 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık su arıtma tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

228.568 m<sup>2</sup> eğitim, 109.007 m<sup>2</sup> sağlık, 91.480 m<sup>2</sup> idari, 18.080 m<sup>2</sup> beslenme, 23.375 m<sup>2</sup> kültür, 8.024 m<sup>2</sup> sosyal tesis, 9.559 m<sup>2</sup> diğer (Depo, Arşiv, vs.), 30.761 m<sup>2</sup> lojman 53.054 m<sup>2</sup> spor, 12.655 m<sup>2</sup> araştırma alanları olmak üzere toplam 584.563 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip üniversitemizde; 40 adet toplantı salonu, 32 adet konferans salonu, 16 adet 50-250 kişilik amfi, 560 sınıf, 77 bilgisayar laboratuvarı, 193 adet diğer laboratuvarlar olmak üzere 918 adet derslik ile hizmet vermektedir.

225 Prof. 157 Doçent, 450 Yardımcı Doçent, 321 Öğretim Görevlisi, 46 Okutman, 605 Araştırma Görevlisi, 13 Uzman ve 1.731 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.

#### 3.2. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2017 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi için **Kampus altyapı projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için; 19.07.2016 tarihinde ihalesi yapılan, 3.922.534,96TL. Sözleşme bedelli Kampüs Alt Yapı İnşaatı kapsamında; Yabani hayvanların kampüse girmesini engellemek için orman ve kampüs arasına yabani hayvan korunma çiti 4500 metre alanın imalatı tamamlanmıştır. İktisat Fakültesi otopark alanına kilit parke, Taha Akgül Spor Salonu önü andezit kaplama, otoparkı ise kilit parke taşı yapılmıştır. Heliport yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılında alt yapı için ek olarak 4.427.465,04 TL ödenek ile; **2.760.020,00TL'lik kısmı ile CÜ Asfalt Yol Yapım İnşaatı** ihalesi yapıp 2500 m<sup>2</sup> uzunluğunda,

14mt genişliğinde,15cm genişliğinde pmt temel, 8 cm kalınlığında bimder tabakası, 5cm kalınlığında aşınma tabakası atılarak kampüs içi yol genişletilmesi yapılmıştır. **1.661.444,40TL'lik kısmı ile** CÜ Yol Aydınlatma Yapım İşi ihalesi yapılp; Kampüs Yeni Yapılan Yolda173 adet dekoratif direk kullanılarak aydınlatma işi, Cumhuriyet Meydanı ve İlahiyat ile Veteriner Fakülteleri yolu aydınlatılmasında 80 adet 4 mt'lik led aydınlatma, Kampüs içerisinde trafo merkezleri kompanzasyon sistemlerinin interneti üzerinde uzaktan izlenmesi sistemi yapılmıştır. Ana Nizamiye ve Daire Başkanlıkları Kaldırım Aydınlatmaları yapılmıştır.

**2017 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesinde** 2016 yılında ihalesi yapılan; Konferans Salonu İnşaatı, CÜ Yıldızdağı Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YİSBAM) inşaatı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İkmal İnşaatı, yapımı devam etmektedir.

**Konferans Salonu;** 2017 ödeneği ile; kaba inşaat tamamlandı, duvarlar örülerek sıvası yapılmıştır. Uzay kafes sistemi ve ahşap oturtma çatılar yapılarak sacları konmuştur. Büyük salon asma tavan yapıldı, sofita katı ve sahne perde katı yapılmış, akustiği yapılmıştır. 2017'de inşaatın %38,11 kısmı tamamlanarak toplam %59,11 seviyesine ulaşılmıştır.

**YİSBAM** 2017 yılında; Duvarlar, sıva ve çatı yapımı bitmiştir. Kapı ve pencereler takılmıştır. Çevre ihata duvarları yapılmıştır. Elektrik tesisatı ve asansör yapılmış, jeneratör takılmıştır. Sıhhi tesisat ve LNG tesisatı yapılmıştır. 2017 yılında inşaatın %67,79 kısmı tamamlanarak toplam %86,55 seviyesine ulaşılmıştır.

**Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İnşaatı;** 2016'da iki bloğun kalıp demir ve betonu bitirilip diğer iki bloğunda temelleri atılarak % 22,79 seviyesinde iş tasfiyesi edilmiştir. 07.08.2017 tarihinde ikmal ihalesi yapılarak, iki bloğun duvarları örülmüş, iç sıvaları yapılmış ve tesisat işlenmiştir. 2017'de ikmal inşaatının %13,6'sı tamamlanmıştır. İş Toplam %35,85 seviyesine ulaşılmıştır.

2017 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Büyük Onarım işinde**, Onarım 1 Kapsamında Uygulama Oteline1.838.251,29TL bütçe ile: Dış duvarlara mantolama yapıldı, binanın etrafı andezit kaplama tretuar yapılmıştır. Ön cephede bulunan kolonlara kompozit kaplama yapılmıştır. Ön kısımdaki çatı sökülerek 2 adet teras alanı oluşturuldu. Kanalizasyon hatları onarılmıştır. Dış cepheler boyandı. Tüm yağmur boruları ve yağmur olukları değiştirildi. Ahşap saçak altları boyandı. Pencerelere denizlik yapılmıştır. 2 adet silikon cephe yapılmıştır. Giriş bölümlerinin eski mermer kaplamaları sökülerek yeniden mermer kaplama ve korkuluk yapılmıştır. Ön cephede bulunan eski duvar travertenleri sökülerek yerine sıva yapılmıştır. Ön cephede bulunan 2 adet giriş rüzgarlık kısmı sökülerek yenilendi. Girişlere 4 adet fotoselli kapı yapılmıştır. Balkonların su giderleri yeniden yapılmıştır. Binada bulunan kapıların tamamı değiştirildi. Yeni lamine kasa, lamine kanat elektronik kart sistem kilitli kapılar yapılmıştır. İç alanlarda bulunan halıların tamamı söküldü. Binanın iç kısımlarının tamamı boyandı. Bodrum kata kafeterya, mutfak ve bulaşikhane yapılmıştır. Eski duvarlar yıkıldı, tavanlar alüminyum asma tavan, duvarlar ve zeminler karo seramik yapılmıştır. 1. kata yeni yemek servis alanı yapılmıştır. Zemin kat ve 1. kat tavanına tavan havuzu yapılmıştır. Zemin kattaki 4 odanın tabanındaki çökme onarıldı ve tuvaletleri yenilendi. Zemin kattaki 4 oda birleştirilerek personel bay-bayan duş ve wc yapılmıştır. A ve B loktaki 16 oda birleştirilerek 8 adet vip odası yapılmıştır. A, B, C bloklardaki tüm banyolara duşa kabin yapılmıştır. A, B, C bloklardaki zemin kat ve 1. katta bulunan banyolara tavan alüminyum kaplaması yapılmıştır. A, B, C bloklardaki banyolara zemin fayans kaplaması yapılmıştır. 7 Adet suit odaya duvar kağıdı yapılmıştır. Vip odaların tamamına laminat kaplama, duvar kağıdı, wc seramik fayansları yapılmıştır. Vip odalarına klima tesisatı çekildi. A, B, C blokların tamamında elektrik tesisatı yenilendi. Koridor başlarına aydınlatma yapılmıştır.

Dış çevre aydınlatması yapılmıştır. Dış duvar süsleme aydınlatması yapılmıştır. TV priz üniteleri yapılmıştır. A blok üst kata havalandırma yapılmıştır. Doğalgaz tesisatında yenilenmeler yapılmıştır. Zemin kat ve 1. kat fuaye alanı koonlarına duvar kağıdı yapılmıştır. B - C bloklarında yatak katlarında depo alanları oluşturuldu. Teras kat toplantı odalarına alüminyum kapı - pvc pencere imalatları yapılmıştır. Uygulama Oteli tüm elektrik aydın armatörleri yenilendi. Ana pano revize edildi Cephe ve çevre aydınlatma yapıldı Tüm odalara elektronik kart kapı sistemi yapılmıştır.

Büyük Onarım İnşaatı Kapsamında 1.341.775,22 bütçe ile; Eski Rektörlük binası 3. kata Bilgi İşlem Daire Başkanlığı projesine uygun olarak dizayn edildi. WC fayans (duvar-zemin) yapılmıştır. Alüminyum tavan yapılmıştır. Laminat kasa, laminat kanatlı kapılar yapılmıştır. Zeminlere laminat kaplama yapılmıştır. Eski Rektörlük binası 1. kata Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı projesine uygun olarak dizayn edildi. Tuvaletler tesisat, zemin ve duvar fayansları yapılmıştır. Alüminyum tavan yapılmıştır. Odalara laminat kaplama yapılmıştır. Ahşap asma tavan tamiratları yapılmıştır. Çay odalarına ahşap dolap - mermerit tezgah yapılmıştır. Bütün odalar ve koridorlar boyandı. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı duvarlar, tavanlar ve kapılar boyandı. İdari Mali İşleri Daire Başkanlığı duvarlar, tavanlar ve kapılar boyandı. Personel yemekhanesi girişlerinin zeminleri yenilendi. Korkuluk imalatı yapılmıştır. Engelli rampası yapılmıştır. İletişim Fakültesi Zemin kat granit kaplaması yapılmıştır. Zemin kat koridor ve odalar boyandı. Asma tavan imalatı yapılmıştır. Fen Fakültesi Bodrum kat 9 adet derslik tavanlarına karopan ve alçıpan tavan imalatı yapılmıştır. Bodrum kata 1 adet mescit tavanına karopan ve alçıpan yapılmıştır. Asansör yapılmıştır. Veterinerlik Hayvan Hastanesi 2 girişine markiz imalatı yapılmıştır. Edebiyat Fakültesi A binası öğrenci girişine markiz imalatı yapıldı, mevcut demir korkulukları boyandı. B binası öğrenci girişine markiz imalatı yapılmıştır. Felsefe bölümünün koridoru granit seramik kaplama yapılmıştır. Tıp Fakültesi - Mühendislik Fakültesi (9 Adet Traverten Cephe) Dış cephe travertenleri söküldü. Kaba sıva yapılmıştır. 6 cm EPS ile mantolama yapılmıştır. Dış cepheler boyandı. Tıp Fakültesi bodrum kat yemekhane için alüminyum bölme yapılmıştır. 1 adet yemek lifti yapılmıştır. Merkezi Kafeterya İçin; Binanın sol yan tuvaletleri 4 katta da komple tadilat yapılmıştır. Eski tesisat komple değişti. Duvar ve zemin fayansları değişti. Kapıların tamamı değişti, yeni lamine kapı yapılmıştır. Pencere-ler pvc olarak yenilendi. Binanın sol tarafında bodrum kat bay, bayan tuvaletleri yeni yapılmıştır. Tesisat dahil tamamen yeni yapılmıştır. Bodrum katta mutfak ve antreye mermer kaplama yapılmıştır. Bodrum kat mutfağa 2 adet araç girişi için demir kapı yapılmıştır. İniş rampaları yapılmıştır. Bodrum katta bulunan yağ tutucular dışarı alındı. Bodrum katta yeni malzeme odaları dizayn edildi. Bodrum katta çamaşırhane yapılmıştır. Bodrum katta 2 adet işçi odası yapılmıştır. Bodrum kat duvarlarına 2 metre yükseklikte duvar fayansları yapılmıştır. Bodrum kat duvarları ve tavan boyandı. Zemin kat ve 1. kat giriş antreler boyandı. Binanın her iki yanında bulunan merdivenkovaları boyandı. Zemin kat ve 1. kat tuvaletlerine yeni bay, bayan engelli tuvaletleri yapılmıştır.

**İlçeler MYO ve YO'lar için 2017 yılında 632.480,85TL bütçe ile ; Kangal MYO çevre aydınlatmasına 18 Adet Led 4m'lik aydınlatma direği kullanılarak yapılmıştır. Kangal MYO binasının etrafına 358mt dikenli telçit, 122,679 m<sup>2</sup> bazalt kaplama yapılmıştır. Suşehri MYO, Suşehri Sağlık Bilimleri YO ve Gemerek Kız-Erkek Öğrenci yurduna 41.280kg yangın merdiveni yapılmıştır. Suşehri MYO çatısına 1190 m<sup>2</sup> galveniz sac ve çatı olukları yapılmıştır. 1080 m<sup>2</sup> çatı arası yalıtım yapılmıştır. Suşehri MYO etrafına 7580kg ferforje demir korkuluk yapılmıştır. Şarkışla MYO çevre aydınlatmasına 15 adet led projektör yapılmıştır. İmranlı MYO çevre aydınlatmasına 6 adet led projektör yapılmıştır. Yıldızeli MYO çevre aydınlatmasına 4 adet led projektör yapılmıştır.**

**Lojmanlarda 997.070,65 TL sözleşme bedelli 2017 yılı Büyük Onarım kapsamında, Rektör Konutunun etrafına 11.560 kg ferforje demir yapılmıştır, Rektör Konutuna 3.040 kg kapı ve pencere demir imalatı yapılmıştır. Rektör Konutu çevresine 428 m<sup>2</sup> andezit kaplama yapılmıştır. Rektör Konutuna 28.050 m<sup>2</sup> mermer parapet yapılmıştır. Konuk Evi önüne 587 m<sup>2</sup> seramik kaplama ya-**

pılmıştır. 216.500 m<sup>2</sup> Lojmanlar çatı tamiri yapılmıştır. Rektör Konutu kazan dairesine 83 m<sup>2</sup> seramik kaplama yapılmıştır.

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Büyük Onarım** işi kapsamında 3.000.000,00TL sözleşme bedeli ile; Futbol sahasına 4 adet 18 m<sup>2</sup>'lik direk ve 40 adet led projektör kullanılarak çevre aydınlatması yapılmıştır. Yüzme havuzuna ve BESYO idari binasına engelli asansörü yapılmıştır. BESYO ve Cumhuriyet Spor Salonuna aydınlatma işleri yapılmıştır.

2017 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yar alan **Rektörlük Makine-Teçhizat** alımları kapsamında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır. Benzin ve Motorin Alımı, Personel Taşıma, Benzin ve Motorin , Zebra Stor Perde Alımı , Kütüphane için 1309 Kalem Kitap Alımı , Cübbe Alımı , Kaloriferlik Kömür Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Fen Fakültesi için 11 Kalem Laboratuvar Malzeme Alımı, Eczacılık Fakültesi için 3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı , Veteriner Fakültesi ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu için 8 Kalem Laboratuvar Malzemesi , Eczacılık Fakültesi için 1 Kalem Laboratuvar Malzemesi , Mühendislik Fakültesi için 19 Kalem Laboratuvar Malzeme Alımı, Teknoloji Fakültesi için 8 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Turizm Fakültesi için 21 Kalem Mobilya Alımı ihalesi gerçekleştirilmiş, Devlet Malzeme Ofisinden 3 Kalem Buzdolabı, Televizyon, 1 Kalem Telefon Makinası, 9 Kalem Mefruşat , 26 Kalem Büro Mobilyası, 1 Cihaz alınmıştır. Rektörlük için Devlet Malzeme Ofisinden 49 Kalem Büro Mobilyası , 2 Kalem Yazıcı, Baskı Makinası, Elektrik Süpürgesi alınmıştır.

2017 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında **Öz Gelir Karşılığı Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; Telefon Makinası 20 Adet, Hesap Makinası 10 Adet, Soyunma Dolabı 64 Adet, Banko 1 Adet, Muayene Masası 1 Adet, Zemin Yıkama 1 Adet, Buzdolabı 1 Adet, Koltuk 20 Adet, Islak Kuru Elektrik Süpürge 1 Adet, Klima 1 Adet Sehpa 15 Adet Bilgisayar 19 Adet Yazıcı 7 Adet Acces Point 1 Adet Masa Tenis Masası 12 Adet Isıtıcı 6 Adet Bulaşık Makinası 1 Adet Buzdolabı 1 Adet Televizyon 1 Adet Ütü 1 Adet Fırın 6 Adet Çamaşır Makinası 1 Adet Bulaşık Makinası 2 Adet Televizyon 1 Adet Renkli Yazıcı 1 Adet Yazıcı 3 Adet Isıtıcı 5 Adet Ses Sistemi Kültür Merkezi 1 Adet Semaver 2 Adet Termosifon 1 Adet Elektrik Süpürge 1 Adet Köfte Makinası 2 Adet Doğrama Makinası 1 Adet Robot 2 Adet Terazî 3 Adet Panel Soğutucu 6 Adet Patates Soyma Makinası 1 Adet Sebze Doğrama Makinası 1 Adet Semaver 1 Adet Semaver 1 Adet Hamur Yoğurma Makinası 1 Adet Yer Ocağı 6 Adet Ses Sistemi Kültür Merkezi 1 Adet Bilgisayar 50 Adet Konferans Koltuğu 48 Adet Çalışma Koltuğu 60 Adet Çalışma Masası 40 Adet Kitap Sterilizasyon Cihazı 1 Adet Yemek Sandalyesi 70 Adet Isıtıcı Hava Perdesi 2 Adet Muhtelif Mutfak Demirbaş 189 Kalem Otel Halısı 2900 M<sup>2</sup> Zemin Yıkama Makinası 11 Adet Servis Arabaları 30 Adet Yemek Masaları 20 Adet Vestiyer 1 Adet Servant 1 Adet Self Servis Ünitesi 1 Adet Gönnye Kesme Makinası 1 Adet alımı yapılmıştır.

**2017 yılında** Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi Bilgi Teknolojileri Alımları kapsamında;

### **İşin Tanımı**

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İçin AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İçin YORDAM Kütüphane Katalog Tarama Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İçin DİYOS Elektronik İhale Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
- Hukuk Müşavirliği için SİNERJİ İcra Takip Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı



- Hukuk Müşavirliği için SİNERJİ Dava Takip Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
- Personel Daire Başkanlığı İçin ve Enstitüler İçin ÜNİPA Personel ve Öğrenci İşleri Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
- Tüm Üniversite için SENEKA Elektronik Belge Yönetim Sistemi Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
- Genel Sekreterlik için Televizyon Alımı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için NETCAD GIS Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı
- Güvenlik ve Koruma Birimine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Alımı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı için FID Kütüphane Otomasyon Sistemi Alımı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için PROLİZ Öğrenci İşleri Otomasyonu Alımı
- Tüm Üniversite için KAMUSM'den E-İmza Sertifika ve Okuyucu Alımı
- Uzaktan Öğretim Merkezi için Sınav Organizasyon ve Ynetim Sistemi Yazılımı Alımı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için Bilgisayar Destekli Grafik İleri İçin Bilgisayar ve Yazıcı Alımı
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı için Yemekhane Otomasyon ve Yönetim Sistemi Alımı
- Hukuk Müşavirliği için SİNERJİ Mevzuat ve İçtihat Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı
- Hukuk Müşavirliği için SİNERJİ Dava Takip Otomasyonuna İlave Lisans Alımı
- Tüm Üniversite için Yaya Geçiş Kontrol Sistemi ve Personel Devam Kontrol Sistemi Otomasyonu Alımı
- Tüm Üniversite için DMO üzerinden Muhtelif Malzeme Alımı
- Tüm Üniversite için CBK Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı için Taşınmaz Mal Sistemi Yazılımı Alımı
- Turizm Fakültesi için Otel Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için Öğrenci İşleri Otomsyonuna İlave Modül (Ekders, Personel, Yabancı Dil) Alımı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı için Performans Programı Takip Otomasyonu Alımı
- Tüm Üniversite için KAMUSM'den E-İmza Sertifika ve Okuyucu Alımı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için Sanallaştırma İçin WeamBackup Yazılımı Alımı
- Tüm Üniversite için Network Sarf Malzemesi Alımı
- Tüm Üniversite için Muhtelif Yedek Malzeme Alım
- Güvenlik ve Koruma Birimi için Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı
- Genel Sekreterlik Birimi için Endüstriyel Monitör Alımı
- Güvenlik ve Koruma Birimi için Trafik Malzemesi Alımı
- Güvenlik ve Koruma Birimi için Klima ve Isıtıcı Alımı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için DMO Network Cihazı Alımı
- Güvenlik ve Koruma Birimi için Yönetilemeyen Switch Alımı

2017 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır. 2016 yılında bu sayılar, 1.130 dergi kategorisinden 28.854 adet fasikül süreli yayın, 72.026 Basılı Kitap ile 100.000 e-dergi, 3.000.000 e-kitap ve 3.874 tez, veritabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 11+16 = 27 iken, 2017 yılında bu sayılar; 1.169 dergi kategorisinden 29.401 adet fasikül süreli yayın, 75.400 Basılı Kitap ile 100.000+ e-dergi, 3.000.000+ e-kitap ve 4.079 tez, 314 C.Ü. Yayını, 7 Adet C.Ü. e.dergisinin 72 sayısı mevcuttur. veritabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 13+16 = 29 olmuştur.

2017 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Makine –Teçhizat alımları** için ayrılan ödeneklerle belirtilen hizmet, malzeme ve cihazlar alınmıştır.

- ❖ 15 Temmuz Şehitler Polikliniği Büro Mobilyası Alımı
- ❖ 4 Motorlu Hata Yatağı Alımı
- ❖ Acil Müdahale Sedyesi Alımı
- ❖ Acil Tıp Ad Karekod Barkod Okuyucu Cihazı Alımı
- ❖ Acil Tıp Ad Kulaklık Alımı
- ❖ Acil Tıp Ad Malzeme Alımı
- ❖ Acil Tıp Ad Otomatik Kayar Kapı Tamiri
- ❖ Acil Tıp Ad.Alkolmetre Cihazı Alımı
- ❖ Alımı İlaç Arabası Alımı
- ❖ Ameliyat Masası Alımı
- ❖ Ameliyathane Ameliyat Lambası Alımı
- ❖ Ameliyathane Birimi 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
- ❖ Ameliyathane Birimi İçin Elektrokoter Cihazı Alımı
- ❖ Ameliyathane Birimi Laparoskopik Sistem Alımı
- ❖ Ameliyathane Birimi Yedek Parça Alımı
- ❖ Ameliyathane C Kollu Skopi Tamiri
- ❖ Ameliyathane Elektrokoter Cihazı Tamiri
- ❖ Ameliyathane Monador Marka Hermetik Kapı Tamiri
- ❖ Ameliyathane Otomatik Kayar Kapı Tamiri
- ❖ Ameliyathane Storz Marka 30 Derece Teleskop Tamiri
- ❖ Ameliyathane Storz Marka Hopkins Optik Tamiri
- ❖ Ameliyathane Storz Marka Optik Tamiri
- ❖ Anestezi Cihazı Alımı
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Comed Marka Skopi Cihazı Tamiri
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Drager Marka Hastabaşı Monitörü Tamiri
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Drager Marka Ventilator İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Drager Marka Ventilator Tamiri
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Kayar Kapı Tamiri
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Mekanik Ventilator İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Non-Invasif Bölgesel Oksimetre Sensörü Alımı
- ❖ Anestezi ve Rean Ad Otomatik Kayar Kapı Tamiri
- ❖ Anestezi ve Rean. Ad Monitör İçin Yedek Parça Alımı

- ❖ Anestezi ve Rean. Ad Multi Link Hasta Monitör Kablosu Alımı
- ❖ Anestezi ve Rean. Ad Radyo Frekans Cihazı Tamiri
- ❖ Anestezi ve Rean. Ad Saturasyon Ara Kablosu Alımı
- ❖ Anestezi ve Rean.Ad Yatak Tartısı Tamiri
- ❖ Anestezi ve Reanimasyon Ad. İçin Hij.Klima ve Tıbbi Cihaz Alımı
- ❖ Anesteziyoloji ve Rean. Ad Drager Marka Cihazların Bakım Onarımı
- ❖ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ad. İçin Üst Düzey Mekanik Ventilatör Alımı
- ❖ Asansör Bakım Arıza Kontrolü Hizmeti
- ❖ Ayniyat Birimi Barkod Yazıcı Alımı
- ❖ Barkod Yazıcı Alımı
- ❖ Beyin ve Sinir Cer Ad Kraniotom Cihazı Tamiri
- ❖ Beyin ve Sinir Cer Ad Ventilatör İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Beyin ve Sinir Cer Ad Yüksek Devirli Drill Sistemi Tamiri
- ❖ Beyin ve Sinir Cer. Ad Halojen Lamba Alımı
- ❖ Bilgisayar Malzemesi, İnce İstemci-Sunucu ve İp Güvenlik Kamera Sistemi Alımı 26 Kalem (24 Grup)
- ❖ Bilgisayar Monitörü Alımı
- ❖ Biyokimya Lab. Su Banyosu Alımı
- ❖ Biyokimya Lab. Tüp Taşıma Sistemi İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Büro Tipi Buzdolabı Alımı
- ❖ Cerrahi Aspiratör Alımı
- ❖ Çalışma Koltuğu Alımı
- ❖ Çocuk Sağ ve Has Ad Fotselli Kapı İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Çocuk Sağ ve Has Ad Laringoskop Seti ve Dijital Kilo Ölçer Alımı
- ❖ Çocuk Sağ ve Has Ad Muayene Lambası Alımı
- ❖ Çocuk Sağ ve Has Ad O2sensörü,Regülatör ve Silencer Alımı
- ❖ Çocuk Sağ ve Has Ad Otoskop Lambası Alımı
- ❖ D.S Satınalma Müdürlüğü Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı
- ❖ D.S.Saymanlık Müdürlüğü Lazer Yazıcı Alımı
- ❖ D.S.Saymanlık Müdürlüğü Lazer Yazıcı ve Sahte Para Sayma Makinesi Alımı
- ❖ D.S.Saymanlık Müdürlüğü Yazıcı ve Sahte Para Sayma Makinesi Alımı
- ❖ Deri ve Zührevi Ahs Ad Dijital Boy Kilo Ölçer Tartı Alımı
- ❖ Ekg Cihazı Alımı
- ❖ El Yıkama Ünitesi
- ❖ El Yıkama Ünitesi Alımı
- ❖ Endokrinoloji ve Met. Ad Convex Probu Tamiri
- ❖ Endokrinoloji ve Met. Bd Hitachi Marka Ultrason Cihazı Tamiri
- ❖ Fatura Birimi Fotokopi Makinesi İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Fatura Birimi Nokta Vuruşlu Yazıcı Alımı
- ❖ Fetal Monitör Alımı
- ❖ Fiziksel Tıp ve Reh Ad Koşu Bandı Tamiri
- ❖ Fiziksel Tıp ve Reh Ad Ultrason Probu Alımı
- ❖ Fiziksel Tıp ve Reh. Ad Cpx Modül İçin Sample Line Alımı
- ❖ Fiziksel Tıp ve Reh. Ad Ergospirometri Test Cihazı Tamiri

- ❖ Fiziksel Tıp ve Reh. Ad İzokinetik Cihaz Demontajı
- ❖ Fiziksel Tıp ve Reh. Ad Lcd Panle Alımı
- ❖ Fiziksel Tıp ve Reh. Ad Tens Tedavi Cihazı Alımı
- ❖ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ad. 6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Xenon Lamba Alımı
- ❖ Gastroenteorloji Bd Parçalı Çelik Metal Kılıf Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Bağlantı Kablosu Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Endoskopi Cihazına Filtre Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Fujinon Marka Gastroskop Tamiri
- ❖ Gastroenteroloji Bd Fujinon Marka Kolonoskopi Tamiri
- ❖ Gastroenteroloji Bd Koter Kablosu Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Malzeme Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Olympus Marka Aspiratör İçin Filtre Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Olympus Marka Cihaz İçin Maj-843 Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Olympus Marka Cihaz İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Gastroenteroloji Bd Olympus Marka Endoskopi Cihazı Tamiri
- ❖ Gastroenteroloji Bd Olympus Marka Gastroskopi Tamiri
- ❖ Genel Cer Ad Comen Marka Monitör İçin Kablo Alımı
- ❖ Genel Cer Ad Fotoselli Kayar Kapı İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Genel Cer Ad Lcd Monitör Alımı
- ❖ Genel Cer Ad Pentax Marka Gastroendoskop Tamiri
- ❖ Genel Er Ad Flexible Ekartör Alımı
- ❖ Göğüs Cerrahisi Ad. Göğüs Hastalıkları Ad. ve Nöroloji Ad. İçin 18 Kalem Tıbbi Malzeme ve Cihaz Alımı
- ❖ Göğüs Has Ad Bilgisayar Alımı
- ❖ Göğüs Has Ad Malzeme Alımı
- ❖ Göğüs Has Ad Polisomnografi Cihazı Tamiri
- ❖ Göğüs Has. Ad Bakteri Filtresi Alımı
- ❖ Göğüs Has. Ad Carefusion Marka Sft Cihazlarının Bakım Onarımı
- ❖ Göğüs Has. Ad Pazisyon Sensörü Alımı
- ❖ Görüntüleme Cihazı Alımı
- ❖ Göz Has Ad Flashotoklavı İçin Kaset Alımı
- ❖ Göz Has Ad Halojen Lamba Alımı
- ❖ Göz Has Ad Vitrektomi Cihazı Bakım Onarım Kalibrasyonu
- ❖ Göz Has. Ad Bağlantı Kablosu Alımı
- ❖ Göz Has. Ad Nidek Marka Ost Retina Scan Cihazı Tamiri
- ❖ Göz Hast. Ad. 46 Kalem (2 Grup) Cer. Alet ve Cihaz Alımı
- ❖ Hasta Başı Monitörü Alımı
- ❖ Hasta Taşıma Sedyesi Alımı
- ❖ Hasta Yatağı Alımı
- ❖ Hastabaşı Monitörü Alımı
- ❖ Hastane Başhekimliği Ekg Cihazı Alımı
- ❖ Hastane Başhekimliği Hastabaşı Monitörü Alımı
- ❖ Hastane Doğalgaz Brülörü Tamiri

- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Hırdavat Malzemesi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Kompresör ve Hava Tankı Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Akü Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Artema Bataryalar İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Asansörlere Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Aspiratör ve Akü Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Bariyer İçin Rf Kartı Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Çelik Para Kasası Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Delta Besleme Ünitesi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Ekg Kablosu Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Ekg Mandalı Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Elektrik Atölyesi Malzeme Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Endüstriyel Tip Hava Perdesi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Engelli Tutunma Barı Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Fan Motoru ve Kompresör Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Fotokopi Makinesine Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Görüntülü Diafon Sistemi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Hasta Yatağı İçin Frenli Teker Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Hasta Yatağı Kumandası Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Hasta Yatakları Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Hastabaşı Monitörü İçin Batarya Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Hırdavat Malzemesi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Isı ve Nem Ölçer Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Kalem Pil Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Klima İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Klima Sistemi İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Kompresör Vida Grubu Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Kompresör Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Kompresör Malzemesi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Kontaktör ve Termostat Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Marangoz Atölyesi Hırdavat Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Medikal Vakum Santrali Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Oksijen Kapsülü ve İç Conta Takımı Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Oksijen Terapi Cihazı Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Petaş Markahastabaşı Monitörü İçin Kablo Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Salon Tipi Klima Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Sedye İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Spo2 Kablosu Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Su Atölyesi İçin Hırdavat Malzemesi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Tansiyon Aletine Malzeme Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Telefon Santrali İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Telefon Santrali İçin Kart Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Termometre Alımı

- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Tüp Taşıma Sistemine Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Tv Santrali Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Vakum Pompası Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Yan Korkuluk Kilit Sisitemi Alımı
- ❖ Hastane İdari Yöneticiliği Ekg Cihazı İçin Kablo ve Soket Alımı
- ❖ Hastane İstatistik Birimi Toner Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Akü Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Asansörler İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Batarya Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Fan Motoru Tamiri
- ❖ Hastane Müdürlüğü Hasta Sedyesine Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Hasta Yatakları İçin Malzeme Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Hasta Yataklarına Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Hermetik Trafo Bakım ve Kontrolü
- ❖ Hastane Müdürlüğü İtfaiye Malzemeleri Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Kimyasal Kurutucu Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Klima Malzemesi Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Kompresör Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Otis Marka Asansör İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Otopark Bariyeri Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Reklam Atölyesi Malzeme Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Rezistans Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Sanayi Tipi Aspiratör Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Tam Otomatik Kesme ve Kapatma Cihazı Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Tansiyon Aleti Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Telefon Makinesi Alımı
- ❖ Hastane Müdürlüğü Ventilatör İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Hastane Otomatik Kayar Kapı Tamiri
- ❖ Hastanemiz Aseptizörü Bakımı
- ❖ Hastanemiz Bariyerlerin Tamiri
- ❖ Hastanemiz Caterpillar Marka Jeneratörlerin Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Enel Marka Güç Kaynaklarının Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Hidrojen Peroksit Cihazının Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz İnform Marka Güç Kaynaklarının Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Karel Marka Telefon Santrali Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Otis Marka Asansörlerin Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Otoklav ve Su Arıtma Cihazlarının Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Pacs Sistemi Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Pnömatik Sisteme İstasyon İlavesi
- ❖ Hastanemiz Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Socomec Marka Güç Kaynaklarının Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Telesis Marka Telefon Santrali Bakım Onarımı
- ❖ Hastanemiz Vakum Motorlarına Malzeme Alımı

- ❖ Hastanemizin Muhtelif Birimleri İçin Cerrahi Alet ve Cihaz Alımı
- ❖ Hastanemizin Muhtelif Birimleri İçin Tıbbi Cihaz Alımı (6 Grup 7 Kalem) Ortopedi ve Travmatoloji Ad. İçin Cerrahi Alet ve Tıbbi Cihaz Alımı
- ❖ Hastanemizyngın Algılama ve Güvenlik Kameraları Bakım Onarımı
- ❖ Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği Tansiyon Aleti Alımı
- ❖ Hijyenik Klima Sant. Yıllık Bakım ve Onarım İşi
- ❖ İlaç Arabası Alımı
- ❖ Jinekolojik Masa Alımı
- ❖ K.B.B Muayene Koltuğu Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Kayar Kapı Tamiri
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Antepartum Fetal Monitör Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Çks Probu Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Elektronik Fetal Monitorizasyon Kemeri Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Hafızalı Isıölçer Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Hava Oksijen Karıştırıcı Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Karekod Okuyucu Cihazı Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Storz Marka 30 Derece Optik Tamiri
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. T Parça Canlandırıcı Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Toko Probu Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Ultrason Vajinal Prop Tamiri
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Yenidoğan Laringoskop Seti Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Hafızalı Termometre Alımı
- ❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad. Malzoni Tip Bipolar Forseps Alımı
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Aygün Marka Sternum Testeresi Tamiri
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Bıçakçılar Marka Kalp Akciğer Pompası Tamiri
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Defibrilatör Tamiri
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. İntraaortik İçin Kablo ve Akü Alımı
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Sternum Testeresi Tamiri
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Tek Kapılı Isıtma Kabini Alımı
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Vela Marka Ventilator İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Ventilator İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad.. Ventilator İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Kalp Damar Cerrahisi Ad. Insave Kan Basıncı Kablosu Alımı
- ❖ Kan Merkezi Binoküler Eğitim Mikroskopu Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Angiografi Cihazına Kablo Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Anjio Cihazı İçin Basınç Kablosu Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Bifazik Defibrilatör Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Digital Holter Ritm Holter Kablo Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Ekg Cihazı Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Fotoselli Kayar Kapı İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Merkezi Monitör Cihazı Tamiri
- ❖ Kardiyoloji Ad Mindray Markahastabaşı Monitörü İçin Kablo Alımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Philips Marka Anjiyografi Cihazının Bakım Onarımı
- ❖ Kardiyoloji Ad Tee Probu Tamiri

- ❖ Kardiyoloji Ad Tapa Marka Eforlu Ekg Cihazı Bakım Onarımı
- ❖ Kbb Ad Duvara Monte Otoskop Oftalmoskop Alımı
- ❖ Kbb Ad Endoskopi Cihazı Kamera Tamiri
- ❖ Kbb Ad Havayolu Başlığı Kablosu ve Speech Mikrofon Alımı
- ❖ Kbb Ad Kbb Muayene Koltuğu Alımı
- ❖ Kbb Ad Odyometri Cihazlarının Kalibrasyonu
- ❖ Kbb Ad Otomatik Empedansmetre Cihazı Alımı
- ❖ Kbb Ad Otoskop Ampulu Alımı
- ❖ Kbb Ad Poliklinik Cerrahi Alet Seti Alımı
- ❖ Kbb Ad Teleskop Alımı
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Filtre Alımı
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Getinge Marka Yıkama Cihazı Tamiri
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Buhar Otoklavı İçin Malzeme Alımı
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Buhar Otoklavı İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Dişli Motor Alımı
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Hidrojen Peroksit İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Otoklav İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sus Sistemi İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Nefroloji Bd Kan Basıncı Cihazı Tamiri
- ❖ Nefroloji Bd Monitörlü Defibrilatör Alımı
- ❖ Nöroloji Ad Kayar Kapı Kontrol Ünitesi Alımı
- ❖ Nöroloji Ad Pulseoksimetre Cihazı Alımı
- ❖ Nöroloji Ad Ventilatör İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Nöroloji Ad Ventilatör Yedek Parçası Alımı
- ❖ Nükleer Tıp Ad Hologic Marka DEXA Cihazının Bakım Onarımı
- ❖ Nükleer Tıp Ad Masa Tipi Santrifüj Alımı
- ❖ Nükleer Tıp Ad Radyasyon Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
- ❖ Nükleer Tıp Ad Tapa Marka Ekg Cihazı Tamiri
- ❖ Ortopedi ve Trav. Ad Alçı Kesme Motoru Alımı
- ❖ Ortopedi ve Trav. Ad Artroskopi Shaver Elçeği Alımı
- ❖ Otomasyon Birimi Serverların Bakım Onarımı
- ❖ Otomasyon Merkezi Bilgisayar Malzemesi Alımı
- ❖ Otomasyon Merkezi Cd Robot Kontrol Birimi Alımı
- ❖ Otomasyon Merkezi Kart Okuyucu Cihazı Alımı
- ❖ Otomasyon Merkezi Patchcord Alımı
- ❖ Pansuman Arabası Alımı
- ❖ Plastik , Reko. ve Estesik Cer Ad Elektrikli Dermatome Cihazı Tamiri
- ❖ Projeksiyon Cihazı Alımı
- ❖ Pulseoksimetre Cihazı Alımı
- ❖ Rad. Ad Toshiba Marka Ultrasonografi Cihazlarının Bakım Onarımı
- ❖ Radyasyon Onkolojisi Ad Fotokopi Makinasına Yedek Parça Alımı
- ❖ Radyasyon Onkolojisi Ad Linak Cihazı İçin Diode Alımı
- ❖ Radyasyon Onkolojisi Ad Linak Cihazına Yedek Parça Alımı



- ❖ Radyasyon Onkolojisi Ad Otomatik Kapı İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Radyasyon Onkolojisi Ad Su Fantomu İçin Malzeme Alımı
- ❖ Radyasyon Onkolojisi Bd Radyoterapi Cihazına Yedek Parça Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Ge Marka Anjiografi Cihazı Bakım Onarımı
- ❖ Radyoloji Ad Convex Probu Tamiri
- ❖ Radyoloji Ad Dijital Dikte Sistemi Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Fosfor Plaka Tarayıcı ve Silici Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Ge Marka Anjiografi İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Ge Marka Dsa Cihazı İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Ge Marka Ultrason Lineer Probu Tamiri
- ❖ Radyoloji Ad Hasta Kayıt ve Kalite Kontrol İstasyonu Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Lorad Marka Mamografi Tamiri
- ❖ Radyoloji Ad Mamograki Kaseti Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Medrad Marka Otomatik Enjektör Tamiri
- ❖ Radyoloji Ad Otomatik Enjektör Tamiri
- ❖ Radyoloji Ad Philips Marka Anjio İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Röntgen Cihazına Ydek Parça Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Siemens Marka Usg Cihazı Probu Tamiri
- ❖ Radyoloji Ad Soğutucu Ünitesi Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Toshiba Marka Ultrasonografi İçin Shaft Alımı
- ❖ Radyoloji Ad Ultrasonografi İçin Prob Konnektör Alımı
- ❖ Radyoloji Ad X-Ray Tube Alımı
- ❖ Refakatçi Koltuğu
- ❖ Satınalma Müdürlüğü Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Sıcak Çermik FTR Merkezi Brülör Ön Isıtıcı Termostatı Alımı
- ❖ Sıcak Çermik FTR Merkezi Brülör Yakıt Pompası Alımı
- ❖ Sıcak Çermik FTR Merkezi Dijital Termostat Alımı
- ❖ Sıcak Çermik FTR Merkezi Dozaj Pompası Alımı
- ❖ Sıcak Çermik FTR Merkezi Emsa Marka Jeneratör Bakımı
- ❖ Sıcak Çermik FTR Merkezi Brülör Kazan Kontaktörü Alımı
- ❖ Tekerlekli Sandelye Alımı
- ❖ Telefon Makinesi Alımı
- ❖ Tıbbi Mikrobiyoloji Lab Etüv ve Kuru Sterilizasyon Alımı
- ❖ Tıbbi Mikrobiyoloji Lab. Mikroskop Alımı
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Doku Takip Cihazı İçin Malzeme Alımı
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Doku Takip Cihazı İçin Yedek Parça Alımı
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Doku Takip Cihazı Tamiri
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Drum Ünitesi Alımı
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Formol Tankı Tamiri
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad İlaç Hazırlama Kabini Tamiri
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Kaset Blok Arşivi ve Dijital Lab. Alarmlı Saat Alımı
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Makroskop Kabini Tamiri
- ❖ Tıbbi Patoloji Ad Shandon Marka Cihazların Kalibrasyonu

- ❖ Timpanik Termometre Alımı
- ❖ Transfzyon Merkezi Masa Üstü İnkübatör Cihazı Alımı
- ❖ Transfzyon Merkezi Masa Üstü Santrifüj Cihazı Alımı
- ❖ Tüp Bebek Workstation ve Incubator Bakım Onarımı
- ❖ Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Filtre Alımı
- ❖ Üroloji Ad 0 Derece Teleskop Alımı
- ❖ Üroloji Ad Bk Medikal Marka Ultrasonografi Cihazı Tamiri
- ❖ Üroloji Ad Eswl Cihazına Yedek Parça Alımı
- ❖ Üroloji Ad Fiber Opik Işık Kablosu Alımı
- ❖ Üroloji Ad Lazr Cihazı İçin Tab Window Alımı
- ❖ Üroloji Ad Rz Marka Cihazların Tamiri
- ❖ Üroloji Ad Storz Marka Cihazların Tamiri
- ❖ Üroloji Ad Storz Marka Üretereroskop Tamiri
- ❖ Üroloji Ad Ultrasonik Sistem Kablosu Alımı
- ❖ Yazıcı Alımı
- ❖ Yemek Masası Alımı
- ❖ Yıkama Ünitesi Alımı

**Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde 1.893.269 TL bütçe ile; Yenidoğan servisi ve Dermatoloji servisinde bulunan tuvaletler bay ve bayan olarak ayrılarak yenilendi. Enfeksiyon hastalıkları servisinde bulunan balkon alanları yıkılarak servis odaları büyütüldü. Servis elektrik altyapısı tamamen yenilendi, servis mekanik pis su temiz su tesisatları yenilendi, wc, banyolar tamamen yenilendi. Servis ahşap asma tavanlar sökülerek karolama asma yapılmıştır. Servis oda giriş kapıları standartlara getirildi, zemin pvc kaplama yapıldı, tüm baca kapakları ve servis girişleri alüminyum doğrama yapılmıştır. Göğüs Hastalıkları ve Kadın Doğum Servisine 1. basamak yoğun bakım alanları oluşturuldu. Bu kapsamda fotoselli kayar kapı, yoğun bakım pendantları ve gaz hatları asma tavan ,zemin kaplamaları değiştirilerek, oda duvarları boyandı servis ortak kullanım alanlarına el tutunma bantları yapılmıştır. El Cerrahisi ve Fiziksel Tıp Sevis elektrik altyapısı tamamen yenilendi. Servis mekanik pis su - temiz su tesisatları yenilendi. Wc, banyolar tamamen yenilendi. Servis ahşap asma tavanlar sökülerek karolama asma yapılmıştır. Servis oda giriş kapıları standartlara getirildi, zemin pvc kaplama yapıldı, tüm baca kapakları ve servis girişleri alüminyum doğrama yapılmıştır. Servis ortak kullanım alanlarına el tutunma bantları yapılmıştır. Genel Cerrahi orta koridorlara el tutma bantları yapılarak duvarlar boyandı. Gastro Entroloji Servisi bünyesinde kullanılmak üzere 3. kat göz hastalıklarının boşalttığı alanda wc ler bay ve bayan olarak ayrılarak yenilendi. Elektrik altyapısı tamamen yenilendi. Servis mekanik pis su, temiz su tesisatları yenilendi. Wc, banyolar tamamen yenilendi. Servis ahşap asma tavanlar sökülerek karolama asma yapılmıştır. Servis oda giriş kapıları standartlara getirildi. Zemin pvc kaplama yapılmıştır. Tüm baca kapakları ve servis girişleri alüminyum doğrama yapılmıştır. Servis ortak kullanım alanlarına el tutunma bantları yapılmıştır. 2. Kat Yanık Merkezi bay bayan wc yapılmıştır. Duvarlar boyandı, ameliyathane hazırlık alanları oluşturuldu. Tüm servis ortak kullanım alanlarına el tutunma bantları yapılmıştır. KBB Polikliniği elektrik altyapısı tamamen yenilenmiştir. Servis mekanik pis su, temiz su tesisatları yenilendi, wc, banyolar tamamen yenilendi. Servis ahşap asma tavanlar sökülerek karolama asma tavan yapılmıştır. Servis oda giriş kapıları standartlara getirildi, zemin pvc kaplama yapıldı, tüm baca kapakları alüminyum doğra-

ma yapılmıştır. Zemin kat tabanlarına pvc zemin kaplama uygulaması yapıldı, duvar - tavan tamamen boyandı ve el tutunma bantları yapılmıştır. Bodrum katta 2 adet eşanjör yenilenmiştir. Hastane dışına dizel yangın söndürme pompası konularak hastane yangın söndürme sistemine entegre edildi. Poliklinik giriş merdivenleri traverten kaplatılmıştır. Hastane başhekimlik önü pis su hattı ve rögarlar yenilendi. Hastane dış cephe boyası yapılmıştır. 15 Kalp Damar hastanesine yangın merdiveni yapılmıştır.

**Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi** kapsamında 2016 tarihinde ihalesi yapılan, C.Ü.Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için 2017 yılında 25.000.000 TL ödeneğin 24.992.349 TL'si harcanarak; Binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır, %90 oranında duvarlar örülerek %70 oranında sıva ve alçılar yapılmıştır. Islak zeminler %50 oranında yapılmış ve asma tavan taşıyıcı imalatına başlanmıştır. Mekanik tesisat imatları %6,25 seviyesine gelmiştir. 2017 yılında %34 oranında tamamlanarak toplam %49 seviyesine gelmiştir. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 10.08.2019 dur.

2017 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında; 2017 yılında 284 yeni projeye destek verilmiş ve önceki yıldan devreden 119 proje, önceden başlayıp bu yıl içinde tamamlanan 204 proje ve bu yıl içinde başlayıp yine bu yıl içinde tamamlanan 54 projeye birlikte toplam 661 projenin takibi yapılmıştır. Ayrıca önceden başlayan 9 proje iptal edilmiş, 10 proje dondurulmuştur. Yıl içerisinde 23 proje önerisi reddedilmiş, 3 proje önerisi geri çekilmiştir. 349 adet proje sonraki yıla devretmiştir. C.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında merkezi laboratuvar inşaatı yapımı tamamlanmış olup yıl içerisinde geçici kabulü yapılmış ve Sağlık Bilimleri ve Kanseri Araştırma (AR-GE) Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimi, Mühendislik Bilimleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimlerinin kurulabilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için cihaz ve makine teçhizatın temini amacıyla ihaleleri ve satınalma işlemleri yapılmış ve bir kısmı tamamlanmıştır ayrıca sarf malzemeler temin edilmiştir

2017 yılında Eğitim, Sağlık, Spor, Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında hedeflenen amaçlar doğrultusunda tamamlanmıştır.

## 4. Yatırım Uygulamaları

### 4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 280.716.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2016 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 228.081.000.- TL olmuştur. 2017 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 27.000.000.-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 16.570.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 43.570.000.- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 38.600.000.- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 121.500.000.- TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2016 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 8.000.000.- TL olmuştur. 2017 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 35.000.000.-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 7.050.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 42.050.000.-TL olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle 41.597.000.- TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **Spor Sektöründe** toplam proje tutarları 14.000.000.- TL'dir. Söz konusu proje kapsamında 2016 yılı kümülatif harcama tutarı 9.940.000.- TL olmuştur. 2017 yılı yatırım programı

kapsamında ödeneğimiz 3.000.000.-TL olarak öngörülmüştür. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 2.700.000.- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 26.352.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2016 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 21.420.000.- TL olmuştur. 2017 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 4.932.000.-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 4.891.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 9.823.000.- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 9.823.000.- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Sektör	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Eğitim	43.570.000	38.600.000	89
Sağlık	42.050.000	41.597.000	99
Spor	3.000.000	2.700.000	90
Teknolojik Araştırma	9.823.000	9.823.000	100
<b>Toplam</b>	<b>98.443.000</b>	<b>92.720.000</b>	<b>94</b>



#### 4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

### III- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 1. Eğitim Sektörü

##### 1.1. Proje No: 2017H030310 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2017 yılı yatırım programı kapsamında 100.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Toplam ödenek 100.000.-TL olmuştur. Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 100.000 TL harcama yapılmıştır.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

##### 1.2. Proje No: 1974H030250 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2017 yılı yatırım programı kapsamında 3.350.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 5.000.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 8.350.000.-TL olmuştur. Bu ödenekten 2017 yılı sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, kampus asfalt, yol ve iş makinesi alımı için 8.344.000- TL harcanmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 115.000.000.-TL olup, 2016 yılı kümülatif harcama tutarı 94.221.000.-TL dir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

##### 1.3. Proje No: 2003H030480 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz detay programına göre bu projeden, İnşaatı devam eden Fen Fakültesi Labaratuvar Binası, Gençlik Merkezi, Kangal Köpeği Araştırma Merkezi, Yemekhane Binası, Veteriner Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Konferans Salonu, Yıldız Dağı YİSBAM devam etmektedir. 2017 yılı yatırım programında Derslik ve Merkezi Birimler projesine 18.000.000 - TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle proje kapsamında 14.995.000.TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 175.000.000.- TL. olup, 2016 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 133.870.000.- TL. dir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 83 olmuştur.

2017 Yılı Topplulaştırılmış Ödeneği	Derslik ve Merkezi Birimler projesi	2017 Yılı Harcama
18.000.000 TL	YİSBAM(Yıldız Dağı)	3.812.000 TL
	Konferans Salonu	9.624.000 TL
	Veteriner Fakültesi	1.559.000 TL
<b>Toplam Harcanan</b>		<b>14.995.000 TL</b>



#### 1.4. Proje No: 2017H030320 Proje Adı: Muhtelif İşler

##### 1.4.1. Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 1.000.000.- TL'si hazine yardımı, 800.000.- TL öz gelir olmak üzere toplam 1.800.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak 4.200.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 6.000.000.-TL olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 5.681.000.-TL harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılında bu proje kapsamında nakdi gerçekleşme oranı % 95 olmuştur.

##### 1.4.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.300.000.-TL hazine yardımı karşılığı, 200.000.- TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelirden, 4.370.000.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 5.870.000.-TL olmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Rektörlük Makine teçhizat alımları için 4.255.000.-TL, lik harcama yapılmıştır.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 72 olmuştur.

##### 1.4.3. Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2017 yılında 1.700.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 2.500.000.-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 4.200.000.-TL olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanımı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 4.176.000.-TL harcama gerçekleşmiştir.


2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

##### 1.4.4. Taşıt Alımı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim bütçesinde 1 adet T02 binek otomobil 51.000,00.-TL yurt içi hibe olarak öngörülmüş, Rektörlük Makam aracı olarak 1 adet T02 Audi marka araç envantere alınmıştır.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Muhtelif İşler	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	6.000.000	5.681.000	95
Makine Teçhizat Alımı	5.870.000	4.255.000	72
Bilgi Teknolojileri	4.200.000	4.176.000	99
<b>Toplam</b>	<b>16.070.000</b>	<b>14.112.000</b>	<b>88</b>

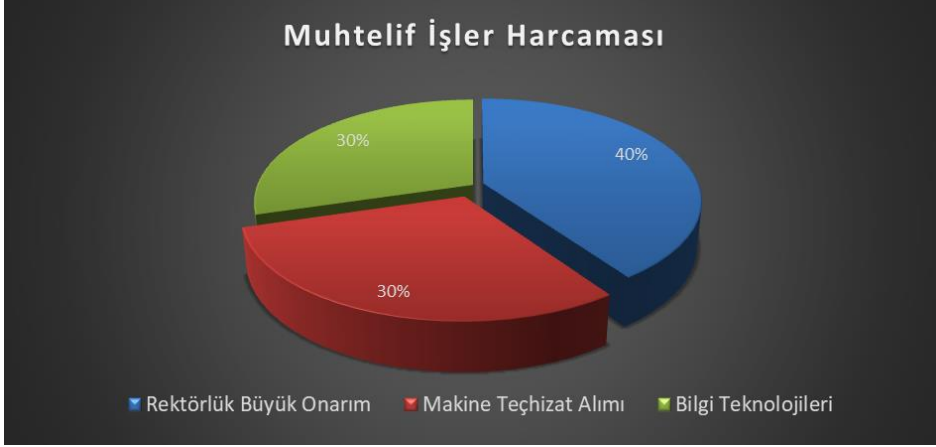


### 1.5. Proje No: 2017H030330 Proje Adı: Yayın Alımı

Üniversitemiz kütüphane yayın alımları olarak Muhtelif İşler projesi kapsamında 2017 yılında 550.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 500.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. . Toplam bütçe ödeneği 1.050.000.-TL olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı, on-line veri tabanı olarak 1.049.000.-TL harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

Eğitim Sektörü Projeler	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100
Kampus Alt Yapı	8.350.000	8.344.000	99
Derslik ve Merkezi Birimler	18.000.000	14.995.000	83
Muhtelif İşler	16.070.000	14.122.000	88
Yayın Alımı	1.050.000	1.049.000	99
<b>Toplam</b>	<b>43.570.000</b>	<b>38.610.000</b>	<b>89</b>

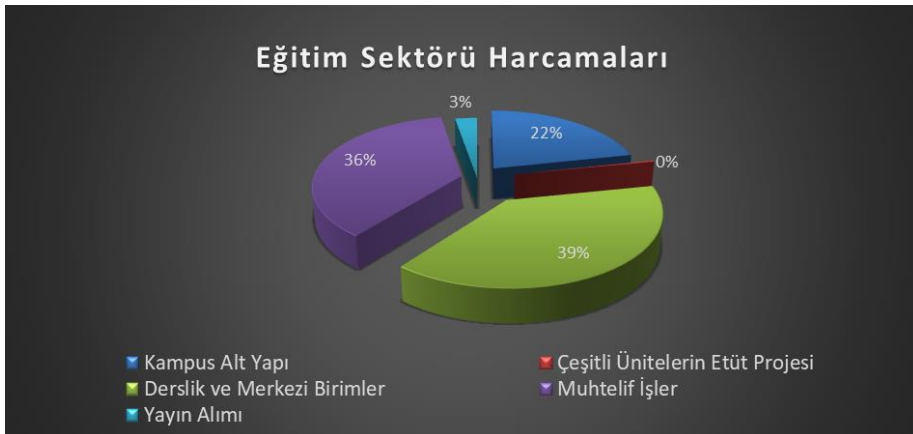

## **2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü**

### **2.1. Proje No: 2014H050040 Proje Adı: Açık v e Kapalı Spor Tesisleri**

Söz konusu proje için 2017 yatırım programı kapsamında 3.000.000.-TL ödenek verilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle 2.700.000.-TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 14.000.000.- TL. olup, 2016 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 9.940.000.-TL'dir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 90 olmuştur.

## **3. Sağlık Sektörü**

### **3.1. Proje No:2017I000150 Proje Adı: Muhtelif İşler**

#### **3.1.1. Büyük Onarım**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Büyük Onarım için, 3.500.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 500.000.-TL Makine-Teçhizat Büyük onarımına 700.000.-TL Makine eve Techizat alımına aktarılmış. Toplam bütçe ödeneği 2.300.000.- TL olmuştur.

2017 yılı sonu itibariyle Hastane Büyük Onarımı için 1.893.000.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 82 olmuştur.

#### **3.1.2. Makine ve Teçhizat Büyük Onarım**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 1.500.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde Büyük Onarımdan 500.000.-TL Makine-Teçhizat Büyük onarımına aktarılmış. Toplam bütçe ödeneği 2.000.000.-TL olmuştur.

2017 yılı sonu itibariyle Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 1.997.000.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur

#### **3.1.3. Makine ve Teçhizat Alımı**

Üniversitemiz sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında makine teçhizat alımları için 10.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Büyük Onarımdan 700.000.-TL Makine-Teçhizat Büyük onarımına aktarılmış ve öz gelir karşılığı olarakda 2.050.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Toplam bütçe ödeneği 12.750.000.-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle harcaması 12.714.000.-TL'dir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

### **3.2. Proje No:2015I000130 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi**

#### **3.2.1. İnşaat**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için; 15.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde onkoloji hastanesi projesinden 5.000.000.-TL ödenek aktarılmış ve öz gelir karşılığı olarakda 5.000.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 25.000.000.-TL olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için 24.992.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 71.500.000.- TL. olup, 2016 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 8.000.000.-TL'dir

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur



### 3.2.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için; 0.- TL ödenek öngörülmüştür.

2017 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için 0.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 0 olmuştur

### 3.3. Proje no: 2017I000160 Proje Adı Onkoloji Hastanesi

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Onkoloji Hastanesi inşaatı için; 5.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde onkoloji hastanesi projesinden 5.000.000.-TL ödenek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 0 TL olmuştur.

2017 yılı sonu itibariyle Onkoloji Hastanesi inşaatı için 0.- TL harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 0 olmuştur

## 4. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

### 4.1. Proje No: 2017K120200 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 4.922.000-TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2017 yılında toplam bütçe aktarması 4.891.000,00.- TL'dir.

2017 yılında özel hesaptan yatırım programı dâhilinde harcanan tutar 9.813.000.-TL olmuştur.

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

### 4.2. Proje No: 2011K120250 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kalkınma Bakanlığınca desteklenen bu projemize 2017 yılında 10.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 10.000.-TL özel hesaba aktarılmıştır. 2017 yılında özel hesaptan bu projeye toplam 10.000- TL harcama yapılmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 21.430.000.- TL. olup, 2016 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 21.420.000.- TL'dir

2017 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

## IV- ÖNERİLER

- ✓ Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

## 2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Öz-kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18) (Bin TL)
417	2014H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2017	Sivas	14.000	9.940	0	3.000		2.700
417	2017H030310	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2017	Sivas	100	0	0	100		100
417	1974H030250	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2018	Sivas	115.000	94.211	0	8.350		8.344
417	2003H030480	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2018	Sivas	175.000	133.870	0	18.000		14.995
417	2017H030320	Muhlelif İşler	Özel Bütçe	2017	Sivas	5.000	0	3.520	16.070		14.112
417	2017H030330	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2017	Sivas	550	0	0	1.050		1.049
TOPLAM						309.650	238.021	3.520	46.570		41.300

Kuruluş Adı : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : SAĞLIK

YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Öz-kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
417	2017I000150	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2017	Sivas	15.000	0	2.050	17.050		16.605
417	2015I000130	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	Özel Bütçe	2020	Sivas	71.500	8.000	5.000	25.000	5.000+	24.992
417	2017I000160	Onkoloji Hastanesi	Özel Bütçe	2019	Sivas	77.550	0	0	0	5.000-	0
417	2017I000150	Muhtelif İşler	Döner Sermaye	2017	Sivas	2.000	0		2.000		0
TOPLAM						164.050	8.000	7.050	44.050	5.000	41.597

**Sektör Adı DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Toplam (18)
417	2017K120200	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Özel Bütçe	2016	Sivas	4.922	0	4.891	9.813		9.813
417	2011K120250	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	Özel Bütçe	2017	Sivas	21.430	21.430	0	10		10
<b>TOPLAM</b>						<b>26.352</b>	<b>21.430</b>	<b>4.891</b>	<b>9.823</b>		<b>9.823</b>

**2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)****Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış			Dış			Dış			Dış		
				Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Eğitim	6		309.650			238.021			30.000			46.570			41.300
Sağlık	3		164.050			8.000			35.000			42.050			41.597
D.Kamu Hizm.	2		26.352			21.430			4.932			9.823			9.823
-İktisadi															
-Sosyal	2		26.352			21.430			4.932			9.823			9.823
<b>TOPLAM</b>	<b>11</b>		<b>500.052</b>			<b>267.451</b>			<b>69.932</b>			<b>98.443</b>			<b>92.720</b>

**Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış			Dış			Dış			Dış		
				Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Sağlık	1		2.000						2.000			4.000			0
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>		<b>2.000</b>						<b>2.000</b>			<b>4.000</b>			<b>0</b>

