



**2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

MART 2019



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
Eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME	11
1. MİSYON VE VİZYON	11
2. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ	12
3. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FINANSMAN KAYNAKLARI	15
4. YATIRIM UYGULAMALARI	25
III- 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	26
1. EĞİTİM SEKTÖRÜ	26
2. EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	31
3. SAĞLIK SEKTÖRÜ	31
4. DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	33
IV-ÖNERİLER.....	33



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısararak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde 2018 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %42'si Eğitim, % 50'si Sağlık, %8'i Teknolojik Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan Üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2018 yılı yatırım programı ile Üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 90.395.000- TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneklerin hazine yardımı karşılığı 84.438.000 - TL, öz gelir karşılığı 5.957.000.- TL ve taşıt hibesi olarak 54.000- TL dir .

2018 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 23.143.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 113.540.000.- TL olmuştur. Ödeneğimizin 110.748.000-TL'si harcanmış, 2.792.000- TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 98'tür.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör



II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Eğitim - öğretimin kalitesini arttırarak, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel değerlere açık olan bireyler yetiştirmek

HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim altyapılarını oluşturmak ve sürekli geliştirmek

HEDEF 1.2: Mevcut akademik personelin yetkinliklerini arttırmak ve ihtiyaca yönelik nitelikli akademik personel istihdamını sağlamak

HEDEF 1.3: .Başarılı öğrencilerin Cumhuriyet Üniversitesi'ni tercih etmesine yönelik şehirle birlikte ortak çalışmalar yapmak

HEDEF 1.4: Eğitim-öğretimi modern üniversite anlayışının gereklerine göre üretken ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirmek

HEDEF 1.5: Araştıran, sorgulayan, değer üreten ve bilimsel düşünceye sahip öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik ortam ve süreçleri tasarlayıp sürekli geliştirmek

Stratejik Amaç 2

Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak

HEDEF 2.1: Proje kültürünü ve bilincini oluşturmak

HEDEF 2.2: Başta bilimsel altyapıya değer katacak projeler olmak üzere sürece katkı sağlayan çalışmalar geliştirerek proje sayısını ve kalitesini arttırılmak

HEDEF 2.3: Araştırmacı kayıt sistemini tamamlamak, sürekli güncel tutmak ve Üniversitemizin sıralamalardaki yerini izleyerek gerekli önlemleri almak

Stratejik Amaç 3

Şehir ile üniversite arasında yürütülecek olan faaliyetlerde üst düzey eşgüdüm, yüksek standartlara sahip kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.1: Üniversitemizin yerleşkelerinde paydaşlarımızın barınma, beslenme ve



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ulaşım ihtiyaçlarına, yaşayan kampüs içinde çözüm bulmak

HEDEF 3.2: Rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin şehre, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak ve bu hizmetlerle birlikte yabancı öğrenci ve engellilere ilişkin projeler yürütmek

HEDEF 3.3: Şehir ile üniversitemiz (ilçeler dâhil) arasında ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek platformlar belirleyerek gerekli teknolojik altyapı ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek

HEDEF 3.4: Şehrimizin mazisindeki kültürel ve tarihsel birikimin ortaya çıkarılması ve bu potansiyel üzerinde geleceğin inşasında kamu kurumları ve STK'larla işbirliğini yürütmek

HEDEF 3.5: Ekolojik dengenin ve yeşil mirasın yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek

Stratejik Amaç 4

Üniversite-Sanayi-Kamu ve Üniversite-Kent işbirliğini artırarak ulusal ve yerel ekonomiye ve sosyo-kültürel yapının gelişimine katkıda bulunmak

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda şehir yaşamına katkıda bulunmak

HEDEF 4.3: Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliğini geliştirmek

Stratejik Amaç 5

Üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, alanında uzmanlaşmış ve yüksek kalite standartlarına sahip bölge hastanesi olmak

HEDEF 5.2: Bölgemizde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçları karşılamak için ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve bakım merkezleri kurmak

HEDEF 5.3: Dış Hekimliği Fakültemizde genel anestezi ve sedasyon ile hastaların



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

tedavilerinin yapılabilmesi için mevcut olan ameliyathanemizin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve 10 yataklı bir servis ile protez laboratuvarları kurmak

HEDEF 5.4: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık hizmeti sunmak için farkındalık oluşturmak

Stratejik Amaç 6

Kurumsal yönetim sistemini geliştirerek paydaşlara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak.

HEDEF 6.1: Yönetim bilgi sistemleri altyapısını geliştirerek sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak

HEDEF 6.2: Kurumsal insan kaynakları planlamasının yapılarak çalışanların niteliğini artırmak

HEDEF 6.3: Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması yönünde mali yönetim sistemini güçlendirmek

HEDEF 6.4: Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, birlikte iş yapabilme hissini geliştirmek



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuş ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir.

Üniversitemiz 127.965 m² kendi arazisi, 6.078.551m² hazinece tahsis edilen arazi, 39.525m² Üniversite vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 17 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 5 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 26 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi hastanesi, Dış Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Belediyesi sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 192 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık su arıtma tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

228.568m² eğitim, 109.007m² sağlık, 91.480m² idari, 18.080m² beslenme, 23.375m² kültür, 8.024m² sosyal tesis, 9.559m² diğer(Depo, Arşiv, vs.), 30.761m² lojman 53.054m² spor, 12.655m² araştırma alanları olmak üzere toplam 584.563m² kapalı alana sahip üniversitemizde; 40 adet toplantı salonu, 32 adet konferans salonu, 11 adet 50-250 kişilik amfi, 484 sınıf, 91 bilgisayar laboratuvarı, 112 adet diğer laboratuvarlar olmak üzere 770 adet derslik ile hizmet vermektedir.

225 Prof. 226 Doçent, 397 Dr. Öğretim Görevlisi, 404 Öğretim Görevlisi, 661 Araştırma Görevlisi, 2.841 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2018 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi için **Kampus altyapı projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için **Kampüs Alt Yapı İnşaatı** kapsamında; Kampüs ana yol kenarı, Lojmanlar ve yeni yurt girişi kapılarına toplam 1418 metre ihata duvarı yapıldı. Kız Yurdu ihata duvarı ile ana yol arası 115 metre uzunluğunda parapetli keles tel ile çit yapıldı. Mühendislik A blok ve Atölye önüne Kilit Parke ile 903 m² otopark yapıldı. Hastane ile Kız Yurdu arası ve Mühendislik Kafeterya arası yolun iki tarafına 5718m² bazalt kaldırım yapıldı. Kültür Merkezi ve İlahiyat Fakültesi önüne 615 metre bazalt merdiven basamağı yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesine binaya bitişik 26m²kazan dairesi yapıldı. Veteriner Fakültesi etrafı ve İlahiyat Fakültesi önü sert zeminler ve Kültür Merkezi önü 5835m² andezit döşeme yapıldı. Mühendislik ABC blokların 250 metre kanalizasyon bağlantıları yenilendi. Yeni Yapılan Duvar Üzeri CÜ Amblemlili Led Armatür yapıldı. Ana Nizamiye Giriş Kapısı İnşaatı işi kapsamında nizamiye girişi Hilal Kapı yapılmıştır. 02.10.2017 tarihinde sözleşmesi yapılan Kampüs Giriş Kapıları İnşaatı kapsamında Lojmanlar ve hastane yönü giriş kapsı 11.09.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 07.06.2018 tarihinde Kampüs Yol Aydınlatma İhalesi yapılip bu kapsamda; 166 adet 6 metrelik Dekoratif Aydınlatma direği; 52 adet 4 metrelik Park Bahçe Aydınlatma Direği 20 adet 5 metrelik Dekoratif Aydınlatma Direği 15 adet 8 metrelik Dekoratif Aydınlatma Direği 90 adet Led Sokak Aydınlatma Armatürü kullanılarak; Üniversitesi Elektrik Ana Besleme Girişi Kompanzasyon Sistemleri işi, Lojmanlar Yolu Aydınlatılması, Edebiyat Fakültesi- Merkezi Öğrenci Kafeterya Arası Yolunun Aydınlatılması, Hastanesi Poliklinikler Önü Yolu Aydınlatılması, Hastanesi Acil Önü Yolunun Aydınlatılması, Güvenlik Merkezi Önü – Cumhuriyet Sokağı Aydınlatılması Muhtelif Fakülte Girişleri- Bahçeleri Aydınlatılması, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi önü aydınlatılması işleri yapılmıştır. 28.06.2018 tarihinde ihalesi yapılan Kampüs Altyapı İnşaatı 2 işi kapsamında; 01.10.2018 tarihinde ihalesi Kampüs Altyapı ve Lojmanlar Kanalizasyon İnşaatı işi kapsamında; A-B-C Blokların Kanalizasyon bağlantıları 330 metre yeni imalat yapılarak bağlandı. Bu bloklarda bozulan kaldırımlar ve girişleri 575 m² yivli karo döşenerek yenilendi. İlahiyat Fakültesi ve Kültür Merkezi önü 812 m² sahanlıklar yapıldı. Hilal Kapı yanına 34,5 metre dekoratif duvar yapıldı. Lojmanlar girişi 267 metre bazalt tretuvar yapıldı. Hastane poliklinik girişi, Kız Yurdu, Mühendislik ve Kafeterya arası yeşil alan etrafına 1468 metre bazalt bordür yapıldı.

2018 yılında **Derslik ve Merkezi Birimler projesinde** 2016 yılında ihalesi yapılan; Konferans Salonu İnşaatı, CÜ Yıldızdağı Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YİSBAM) inşaatı 2018 yılında bitirilerek Geçici Kabulü yapılip hizmete sunulmuştur. 2016 yılında ihalesi yapılan Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İ k m a l İnşaatı ile 2018 yılında ihalesi yapılan Gençlik Merkezi Bina İnşaatı yapımı devam etmektedir.

Konferans Salonu; 2018 ödeneği ile, 2017 yılında %59,11 seviyesinde olan bina 2018 yılında tamamlanarak Geçici Kabulü Yapılmış ve hizmete sunulmuştur.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YİSBAM 2018 yılında; ; 2018 ödeneği ile, 2017 yılında %86,55 seviyesinde olan bina 2018 yılına %100 tamamlanarak Geçici Kabulü Yapılmış ve hizmete sunulmuştur.

Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İnşaatı; 2016'da iki bloğun kalıp demir ve betonu bitirilip diğer iki bloğunda temelleri atılarak % 22,79 seviyesinde iş tasfiyesi edilmiştir. 07.08.2017 tarihinde ikmal ihalesi yapılarak devam eden işte; 2018 yılında diğer iki bloğun betonarmesi ve duvarları bitirilmiş iç ve dış sıvaları tamamlanmış pencere doğramaları ve camlar takılmış, dış cephe bitirilmiştir. Ayrıca ahşap oturtma, çatı ve kaplaması, yağmur borusu ve olukları yapılmıştır. İç sıva üzerine saten alçı çekilmiştir. 2017 yılında %35,85 seviyesinde olan iş 2018 yılında toplam %56 seviyesine ulaşılmıştır.

Gençlik Merkezi Bina İnşaatı; 11.07.2018 tarihinde ihalesi yapılan Gençlik merkezi inşaatı işi Betonarme Temel, kolon ve perde imalatı yapılarak inşaatı yaklaşık olarak %15 seviyesine getirilmiştir.

2018 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Büyük Onarım işinde, Büyük Onarım 1** Kapsamında: Merkezi Kafeterya mantolama işi ve çatı tadilatı yapılmıştır. Sosyal Tesiste düzenlemeler yapılmıştır. 3 adet basketbol ve voleybol sahası yapılmıştır. **Büyük Onarım 2** Kapsamında: Daire Başkanlıkları Binasına, 12 adet wc tadilatı yapılarak yenilendi. 4 katta girişlere camekân kapı yapıldı. Rektörlük Binasına, üst katta 2 adet wc yapıldı. 1 adet abdest mahalli yapıldı. 2 oda boyandı. ÖSYM Binasına, iç alanlar tadilat yapılarak büroya dönüştürüldü. Tavanlar alçıpan yapıldı. Zeminler granit, oda zeminleri laminant yapıldı. Bina girişi mermer, dış yüzeyi mantolama ve çatı yapıldı. Tüm kapı ve pencereler değişti. Mühendislik Fakültesi Binasına, 63 adet kapı değiştirildi. Bina girişlerine markiz yapıldı. Tıp Fakültesi Binasına, yemekhane ve bulaşikhane ve tezgah yapıldı. Eczane Fakültesi Binasına, kilit parke ile yürüme yolu yapıldı. Edebiyat Fakültesi'ne karlık demir, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne engelli rampası, Turizm ve Yabancı Diller Binasına, asma tavan ve 3 ayrı oda bölmesi yapıldı. İktisat Fakültesinde, derslikler büyütüldü. İki blok arasına çelik konsol ile demir köprü yapıldı. Cumhuriyet MYO Binasına, kantin yapıldı. Eski kantin yeri ofise çevrildi. Giriş merdivenleri markiz yapıldı. Merkezi Laboratuvar Binasına, mantolama ve pencere pvc doğrama Amfi Binasına mantolama yapıldı. Öğrenci Yemekhanesine, zeminlere granit döşeme, 1. Katta boya işleri, ve fırın servis alanı yapıldı. Eski Kütüphaneye gazeteciler birimi yapıldı. **Büyük Onarım 3** Kapsamında: Lojmanlara 40 araçlık otopark yapıldı. BESYO Spor Salonu tadilatı yapılarak matbaanın kullanılacağı alan yapıldı. Personel yemekhanesi protokol salonu yenilendi.

Fen ve Edebiyat Fakültesi Büyük Onarım İnşaatı kapsamında: Toplamda 5000m² alan seramik kaplanmıştır. 2150 m² alana şap atılmıştır. 3700m² alanın tavanları yenilenmiştir. Edebiyat Fskültesine 100 kişilik 23 adet sınıf oluşturulmuştur. Fen Fakültesinde biyoloji laboratuvarı oluşturulmuştur. Fizik bölümünün hoca odaları yenilenmiştir. Fakülte afişlerinin bulunduğu alana 730 m² laminant parke döşenmiştir



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İlçeler MYO Onarımı için 2018 yılında: Kangal, Gemerek, Gürün, Divriği, Zara Meslek Yüksekokullarının kömürlü olan kalorifer kazanları doğalgaz sistemine dönüştürüldü. Kazan daireleri yanmaz kablo ile iç tesisat yapıldı. Gürün Meslek Yüksekokulunun çatısı değiştirildi

2018 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yar alan **Makine-Teçhizat** alımlarında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır: Dijital Baskı Makinası Alımı, CNC Tezgahı Makine Alımı, 22 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı, Özel Güvenlik Giyim ve Teçhizat Alımı, Buzdolabı ve Televizyon Alımı, Devlet Malzeme Ofisinden Tabure Alımı, Çeşitli Büro Mobilyaları, Eğitim Amaçlı Kullanılan Malzemeler, 8 Adet Televizyon, 11 Kalem Büro Mefruşatı ve Sabit sıra alımı, Açık Rafli Dosya Dolabı 20 adet, Bilgisayar Masası Panel Ayaklı 4 adet, Derslikler için Projeksiyon Cihazı 4 adet, Cerrahi Aspiratör 2 adet, Portegü 1 adet, Kemik Pensi 1 adet, Yanak Ekartörü 1 adet, Osteom Seti 5'li 1 adet, Çekiç 5 adet, Elavatör Düz 10 adet, Elavatör Sa10 Adet, Elavatör Sol 10 adet, Apexo 10 adet, Fizyodispenser Cihazı 1 adet Kemik Eğesi 1 adet, Cerrahi Makas 1 adet, Doku Pensi Dişli 1 adet, Bistüri Sapı 1 adet, kemik Kazıyıcı 5 adet, Kemik Öğütücü 2 adet, Cerrahi Kumpas 2 adet, İmplant Kanal Ölçüsü 5 adet, Trafan Frez Seti 2 adet, Cerrahi Set 8'li 2 adet, Çamaşır Klenbi 20 adet, Periost Elevatörü 4 adet, Ağız Açacağı Basamaklı 7 adet, Ağız Açacağı Klenbi 7 adet, Makas Eğri 4 adet, Kemik Eğesi 5 adet, Greysi Seti 4 adet, 1 adet Engelli Diş Üniti, 10 adet Diş Üniti, mTemizleme Cihazı 2 adet, Angulduruva 20 adet, Klinik Piyasemeni 5 adet, Kavitron Cihazı 3 adet, Aeratör Başlığı 10 adet, Mikromotor 20 adet, Elektriklik Pulpa Testi 2 adet, 35 adet dolap, Endodontik Angulduruva 5 adet, Anfi Sırası Ön Modül 4 adet, Anfi Sırası Orta Modül 52 adet, Anfi Sırası Arka Modül 4 adet, Masa 5 adet, Koltuk 24 adet, Basplak Cihazı 1 adet, Aljinat Karıştırma Cihazı 1 adet, Aeratör Başlığı 8 adet, Laboratuvar Mikromotoru 10 adet, Fantom Çalışma Üniti Masası 1 adet, Öğrenci Fantom Çalışma Üniti Masası 100 adet, Fantom Kafa Takımı 10 adet, 1 adet kompresör tesis dışında uygun bir yere kurulumu yapılmıştır.

2018 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Öz Gelir Karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; Su arıtma cihazı 2 adet, kavitron detetraj cihazı 1 adet, yemek masası 15 adet, kitaplık 2 adet, pide lahmacun fırını 1 adet, taşlama makinası 1 adet, akülü vidalama makinası 1 adet, pasta teşhir dolabı 2 adet, kamera sistemi 1 adet, davlumbaz 1 adet, banknot sayma makinası 1 adet, çalışma/ misafir koltuğu 14 adet, Tümleşik bilgisayar 13 adet, yazıcı 1 adet, güç kaynağı 1 adet alımı yapılmıştır.

2018 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yer alan **Bilgi Teknolojileri** alımlarında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır; AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı alımı, DİYOS E-İhale Yönetim Programı alımı , Isı Kaybı Hesap, Analiz ve Çizim Yazılımı alımı , DİYOS E-İhale Yönetim Programı alımı , NCS İşçi Bordro Hesaplama Programı alımı, Araç Takip Sistemi Alımı, YORDAM



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Kütüphane Programı alımı, PROLİZ Öğrenci İşleri Programı alımı, MMM Faaliyet Raporu Oluşturma Programı alımı, MMM Yönetim Sistemleri Programı alımı, NCS İşçi Bordro Hesaplama Programı alımı, Para Yükleme Terminali, (Kiosk) Alımı, Dış Ortam Para Yükleme Terminali Kabini Yapımı, Yana Kayar Sürgülü Kapı Alımı, Dijital Kürsü ve Dijital Panelist Masası alımı, UTARİT Yemekhane Yönetim Yazılımı alımı, Sunucu Alımı, SMS Alımı, Endüstriyel Duvar Monitörü Alımı, SİNERJİ İcra Takip Programı alımı, SİNERJİ Dava Takip Programı alımı, SİNERJİ Mevzuat ve İçtihat Takip Programı alımı, Sıramatik Sistemi alımı, Catia Yazılımı alımı, IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi alımı, Microsoft Kampus Anlaşması, E-İmza Sertifikası Alımı, HGS destekli Otopark Geçiş Sistemi alımı, Muhtelif Bilişim Malzemesi alımı, Muhtelif Network Malzemesi alımı, Sistem Odası Kurulumu ve Veri Merkezi Cihazları alımı yapılmıştır.

2018 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır. 2017 yılında bu sayılar, yılında sayılar; 1.169 dergi kategorisinden 29.401 adet fasikül süreli yayın, 75.400 Basılı Kitap ile 100.000+ e-dergi, 3.000.000+ e-kitap ve 4.079 tez, mevcuttur. Veri tabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 13+16 = 29 iken; 2018 yılında bu sayılar; 1.181 dergi kategorisinden 29.809 adet fasikül süreli yayın, 81.073 Basılı Kitap ile 100.000+ e-dergi, 3.000.000+ e-kitap ve 4.411 tez, 24 C.Ü. Yayını, 7 Adet basılı kitap işlemleri devam etmektedir. Veritabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 18+12 = 30 olmuştur.

2018 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamı için ayrılan ödeneklerle Asansör Bakım Arıza Kontrolü Hizmeti, Hijyenik Klima Santrallerinin Yıllık Bakım Onarım Hizmeti Alımı, El Terminali Ve Rfid Kart Okuyucu Cihazı Alımı, 11 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı, Cerrahi Alet Setleri Ve Vasküler El Doppler Cihazı Alımı, Optik Biyometri Cihazı Alımı, Histeros Kopi Seti Ve Video Gastroskop Cihazı Alımı, Denge Ünitesi Sistemi, Otomatik Abr Cihazı Ve Mikroskop Alımı, Bt Enjektörü Alımı, Yüksek Çözünürlüklü Ultrasonografi Cihazı Alımı, Negatif Basıncılı Tüberküloz Odası Sistemi Alımı, Merkezi Depo Çift Kanallı İnfüzyon Pompası Alımı, Hrm Cihazı(Manometre) Upgrade (Yazılım Güncellemesi), Disk Ünitesi Alımı, Premium Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Alımı, Basınç Destek Ventilatorü Cihazı Alımı, Kalorifer Kazanı Brülörü Bakımı, Arrow Marka İntraaortik Balon Pompası Tamiri, Yağlı Tip Hermetik Yg Trafo Genel Bakım Ve Kontrolü (Bir Bakım), Karl Storz Marka 0 Derece Pediatrik Optik Tamiri, Karl Storz Marka 30 Derece Optik Tamiri, Karl Storz Marka Perkütan İkili Tutucu Cihazı Tamiri, Karl Storz Marka 30 Derece Optik Cihazı Tamiri, Karl Storz Marka 26120ba Seri Nolu 0 Derece Optik Tamiri, Drager Marka Evita XI Model Ventilatorü Tamiri (Asej-0015 Seri), Drager Marka Evita XI Model Ventilatorü Tamiri (Arzf-0017 Seri), Comed Marka Kmc 650 Model



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Skopi Cihazı Tamiri, Medispec Marka Radialspec Model Eswt (Şok Dalga) Cihazı El Aplikatörü Tamiri, Emsa Marka Jeneratörün Bakımı, Ameliyathane Karl Storz Marka 12166m Model 30 Derece Optik Tamiri, Sbsic Marka Spektrofotometre Cihazı Bakım Kalibrasyonu, Kyocera Marka Fax Cihazı Tamiri, Karl Storz Marka 26011aa Model 0 Derece Optik Tamiri, Karl Storz Marka Nefroskop Tamiri (27292ama Seri Nolu), Bio-Rad Marka Variant Iı Model Elektroferez Bakım Onarım Kalibrasyonu, Sonoscape Marka S8 Exp. Ultrason Cihazı Tamiri, Karl Storz Marka Laparoskopik Histerektomi Manipulatörü Tamiri, Choyang Marka Cyv-100 Model Dezenfektör Cihazı Bakım Onarım Ve Kalibrasyonu, Waldmann Marka Uv-7002 Model Fototerapi Cihazı Tamiri, 19 Kalem Vakum Motorlarına Malzemeli Hizmet Alımı, Tronco Marka Cs1000 Model Otomatik Kayar Kapı Tamiri, Dorsan Marka Otomatik Kayar Kapı Tamiri, Yangın Söndürme Tüplerinin Dolumu Ve Bakımı, Philips Marka Brilliance 16 Kesit Tomografi Cihazı Tamiri, Ge Marka Logic 9 Model Ultrasonografi Cihazı Tamiri, Drager Marka Evita XI Model Ventilatör Cihazı Tamiri, Nidek Marka Rs-3000 Model Oct Retina Scan Cihazı Tamiri, Statım Marka 5000s Model Flash Otoklav Cihazı Tamiri, Nikon Marka Beş Başlıklı Mikroskop Tamiri Ve Kalibrasyonu, Pentax Marka Eg-290k Model Endoskopi Cihazı Tamiri, Pentax Marka Ec-380lk Model Endoskopi Cihazı Tamiri, Pentax Marka Eg-290k Model Kolonoskopi Cihazı Tamiri, Pentax Marka Ec-3830lk Model Kolonoskopi Cihazı Tamiri, 69 Kalem Cihaz Kalibrasyonu, Fujinon Marka Duedonoskopi Cihazı Tamiri, Medrad Marka Mark V Provis Model Otomatik Enjektör Tamiri, Olympus Marka Gif Type Q150 Model Gastroskopi Tamiri, Envitec Marka 6020 Plus Model Alkolmetre Cihazı Kalibrasyonu, Armas Marka Nam-07 Model Alkolmetre Kalibrasyonu, Leica Marka Cm1900 Model Frozen Cihazı Bakımı, Leica Marka Rm2255 Model Frozen Cihazı Bakımı, Thermo Shandon Marka Sme Model Frozen Bakımı, Thermo Shandon Marka Histocentre Model Doku Gömme Bakımı, Thermo Shandon Marka Finesse Model Mikrotom Bakımı, Thermo Shandon Marka Exelcisör Model Doku Takip Cih.Bakımı, Medrad Marka Stellant Model Otomatik Enjektör Tamiri, Fujinon Marka Ec590wl Model Kolonoskopi Tamiri, Kyocera Marka Yazıcı Tamiri, Maico Marka Mb11 Model Abr Cihazı Bakım Kalibrasyonu, Medrad Marka Stellant Model Otomatik Enjektör Tamiri, Karl Storz Marka 26160shw Model Histeroskopi Makas Tamiri, Karl Storz Marka 26159ehmmodel Histeroskopi Makas Tamiri, Monark Marka Kondüsyon Bisikletlerinin Bakım Onarım Kalibrasyonu, Fujinon Marka 530ebus Model Bronkoskopi Tamiri, Bd Fujinon Marka Su8000 Model Endo Ultrasonografi Tamiri, Radwag Marka Wpt7 4b 500c Model Yatak Tartısı Tamiri, Lorad Marka M-iv Model Mamografi Cihaz Tamiri, Ologic Marka Dexa Cihazının Bakım Onarımı, Medrad Marka Stellant Model Otomatik Enjektör Tamiri, Samsung Marka Xgeo Gc 80 Çift Dedektörlü Digital Röntgen Cihazı Tamiri, Samsung Marka Xgeo Gu 60a-U-Kol Digital Röntgen Cihazı Tamiri, Karl Storz Marka 11301 Bnx Model Video Intubation Flexible Bronkoskop Tamiri, Olympus Marka Gif Type Q150 Model Endoskopi Cihazı Tamiri, Olympus Marka Gif Type Q150 Model Endoskopi Cihazı Tamiri, Karl Storz Marka Flexible Üreterorenoskop Cihazı Tamiri, Drager Marka Vn 500 Model Ventilatör Cihazı Tamiri, İnteracoustics Marka Acc 40 Model Odyometri Cihazı Bakım Kalibrasyonu, Heine Marka Mlh Model Kbb Alın Lambası Cihazı Tamiri, Klasik 78 Dioptri Muayene Lensi, Klasik 90 Dioptri Muayene Lensi,



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2mm Otoskop Ucu, 3,2mm Otoskop Ucu, 4mm Otoskop Ucu, Xenon Lamba(Fujinon Marka Soğuk Işık Kaynağı İçin), Bakteri Filtresi, Binoküler Eğitim Mikroskopu, Lam Arşivi Dolabı, Kaset Blok Arşivi, 1000 Lik Tank Membran, 500 Lük Tank Membran, 30 Luk Tank Membran, 28 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı, Batarya 3,5v (Welch Allyn Marka Oftalmoskop İçin), 3 Adet Fotoselli Batarya , Ip Kamera, Fiksatif Seti, Blender Bloğu(Vela Viasys Marka Mekanik Ventilatör İçin), Uydu Alıcısı, Uydu Santrali, Lnb, Çanak Anten, Batarya Grubu(12v 4800a)Vela Model Ventilatör İçin, Ekg Kablosu (Mindray Marka Dg-9a Defibrilatör İçin), Digital Ultrasonik Temizleme Cihazı, 24 Volt 150 Watt Lamba Martin 701 , 24 Volt 120 Watt Lamba Martin 501 İçin, 22 Volt 220 Watt Lamba Amsco Marka Lamba İçin, 33 Volt 235 Watt Lamba Amsco Marka Lamba İçin, Ekg Kablosu (Mindray Marka Defibrilatör İçin), Spo2 Kablosu (Mindray Marka Defibrilatör İçin), Batarya (Mindray Marka Defibrilatör İçin), Power Board (Vela Viasys Marka Ventilatör İçin), Tansiyon Manşonu Yetişkin, Saturasyon Ara Kablosu, Ekg Kablosu, Ambu Ve Laringoskop, Zaman Ayarlı Bas İç Takımı(Subaşına İç Kapatmalı), Dijital Termostat, Gri Handpiece Kablo, Yıkama Cihazı İndikatörü, Kartlı Geçiş Sistemi, Cilt Isı Probu, Adaptör (Erne Marka Hastabaşı Monitörleri İçin), Uva Lambası, Uvb Lambası Ve S16 Stater, A32745yp Sensör Göz(Artema Marka Fotoselli Bataryaiçin), A31033yp Selenoid Valf(Artema Marka Fotoselli Bataryaiçin), Pacemaker (Çift Odacıklı Geçici Kalp Pili Cihazı), Fan Motoru, Airway Pressure Transducer (Carefusin Marka Ventilatör İçin), Akü 12 V - 4,5 A (Carefusin Marka Ventilatör İçin), Adaptör 11-15 V - Amper(Carefusin Marka Ventilatör İçin), Mekanik Kapan, 4-5 Atm By-Pass Sistemli Regülasyon Grubu, Anestezi Cihazı Gaz Analizatörü Öncesi Su Tutucu, Batarya 12v 2,9ah Nihon Kohden Marka Defibrilatör İçin, Elektrot Kablosu 4 Lü Set, Tahrik Tamburu (Tepa Marka Eforlu Kg Cihazı İçin), Kasnak, Kayış Grubu, Bant Platformu, Adaptör (Ameliyathane Lambası İçin), Linak Marka 3 Motorlu, Hasta Yatakları İçin Kumanda, Linak Marka 4 Motorlu Hasta Yatakları İçin Kumanda, Nitrocare Marka 3 Motorlu Yatak İçin Dewert Kumanda, Nitrocare Marka 4 Motorlu Yatak İçin Dewert Kumanda, Oksijen Hortumu (Beyaz Renk), Kuru Hava Hortumu (Siyah Renk), Duvar Tipi Aspiratör, Elektrikli Yağlı Radyatör, Santrifüj Cihazı, Pvt375 Bt Conveks Array Transducer Probe(Toshiba Marka Aplio 500 Model Ultrasound Cihazı İçin), Tribün Motor (Viasys Marka Vela Model Ventilatör İçin), Ekg kablosu (Marquette Marka Defibrilatör İçin), Dijital Video Kolposkop, 2 Adet Ceme Şamandıra Contası(Trans Marka Tr825otoklav İçin), 2 Adet 1/2 Kondestop (Trans Marka Tr-825otoklav İçin), 1 Parmak Pistonlu Selenoid Valf, 1 Parmak Düz Sarı Rekor, 3 Lü Elektrod Takımı, Oksijen Sensörü(Drager Marka Küvöz İçin), Ateş Ölçer Kablosu (Drager Marka Monitör İçin), Spo2 Kablosu Ve Çok Kullanımlık Parmak Probu, Tansiyon Aleti Dış Bezi, Tansiyon Aleti Musluk Vidası, Tansiyon Aleti Puan, Gaz Prizli Yüksek Basınç Regülatörü, Bariyer Sürücü Kartı, Sonlandırma Swich, Reflektörlü Emniyet Fotosel Takımı, Çatal Ayak Yer Değişikliği, Rf Kumanda Alıcı Kutusu, Kol Bandı 4m, Destek Çatalı, Akü 12 Volt 7 Amper, Parmak Tipi Pulseoksimeetre, Uv Lamba(Su Arıtma Cihazı İçin), 3x1,5 Ttr Kablo, 3x2,5 Ttr Kablo, Kauçuk Topraklı Dişi Fiş, Topraklı Dişi Fiş, Kauçuk Topraklı Erkek Fiş,Kablo Bağı, Büzüşen Bant, Zaman Saati, Fotosel Röle, 3x1,5 Kauçuk İzoleli Kablo, 1mm Balık Sırtı Kablo Tv Kablosu, 18 Watt Florasan Ampul, 4 Amper Cam Sigorta, 1,6 Amper



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Cam Sigorta, E 27 Duy, Ampul Cdm-T (Drager Marka Lamba İçin), G92026-22.8v 110 Specila With Cable Ampul, 6 Gb Sas 300 Gb Disk(Ibm 3650 M3 Storage İçin), İnce Kalem Pili Alkalin, Sıcaklık Sensörü (Getinge Marka Yıkama Cihazı İçin), Ateşleme Bobini(Herrmann Marka Ozon Cihazı İçin), Yağ (Vakem Marka Wp100 Model Vakum Motoru İçin), Hava Filtresi(Vakem Marka Wp100 Model Vakum Motoru İçin), Yağ Filtresi (Yiğitsan Marka Kuru Hava Kompresörleri İçin), Seperatör Filtresi (Yiğitsan Marka Kuru Hava Kompresörleri İçin), Hava Filtresi (Yiğitsan Marka Kuru Hava Kompresörleri İçin), Kayış Xp2 1200 (Yiğitsan Marka Kuru Hava Kompresörleri İçin), Yan Korkuluk Kilit Sistemi(Nitrocare Marka Yatak İçin), Baş Ucu Ayak Ucu Koruması(Dolsan Marka Yatak İçin) Ibm Fru:81y9878 3tb 6gb Sas Disk, Elektrikli Isıtıcı (Yağlı Radyatör), Led Ampüllü Reflektör, Tansiyon Holter Cihazı, Ritim Holter Cihazı, 30 Derece Teleskop Alımı, 5 Büyütmeli Biyomikroskop Alımı, Hasta Yatağı Kumandası (Dolsan Marka Hasta Yatağı İçin), Adaptörlü Hemşire Tipi Koldan Ölçer Tansiyon Aleti, Radyan Isıtıcı Dijital Bebek Tartısı, Exelasyon Flow Sensör, Air Flow Sensör, Mobil Muayene Lambası (Led), 128 Gb Ssd Disk, Isı Ve Nem Ölçer Cihazı, Dijital Buzdolabı Termometresi, Pahlı Conta 15x25, Su Motoru Paslanmaz, 1 Parmak Çekvalf Çalparalı, 1 Parmak Çekvalf Klepeli, 1/2 Çekvalf, 12.5 Kw Rezistans, Oksijen Sensörü (Drager Marka Caleo Model Küvöz İçin) Ekran Kartı(Viasys Marka Vela Model Ventilator İçin), Lcd Ekran(Viasys Marka Vela Model Ventilator İçin), Ampul (Miller Bleyt 3 Nolu İçin), Ampul (Miller Bleyt 1 Nolu İçin), Ampul (Miller Bleyt 0 Nolu İçin), Ampul (Miller Bleyt 00 Nolu İçin), Ekg Kablosu (Edan Marka Ekg Cihazı İçin), Basınç Şalteri, Sıcaklık Kontrol Cihazı, Flow Sensör (Kısa), Flow Sensör (Uzun), Exelasyon Valfi, Diyafram, O2 Sensörü, Gaz Prizli Yüksek Basınç Regülatörü, Dvi To Hdmi Kablo, Sanayi Tipi aspiratör, Isı Nem Sensörü, Önden Akışlı Tekrar Kullanılabilir Esnek Apc Probu, Ağırlık Saptırma Kasnağı(E Asansörü İçin), Batarya 15v-7,2amper Primedic Marka Defibrilatör İçin, Oksijen Sensörü (Atom Marka Küvözler İçin), Mikrofon (Dahua Marka Kameralar İçin), Yumuşatma Valfi (Su Arıtma Cihazı İçin), Otoskop Başlığı (Riester Marka Otoskop Cihazı İçin), Oftalmoskop Başlığı, Otoskop Ampülü, Oftalmoskop Ampülü (Marangoz Atölyesi) Sunta-Lam 183x366cm 18 mm, , Besleme Kartı(Viasys Marka Vela Model Ventilator İçin), Selülozik Boya (Sarı)15 Litre, Uzatma Rulo Sap Teleskopik, Maske Filtresi 3 M, Hava Ve Su Tabancası (Yıkama Makinesi İçin), R 404 C Gaz, R 407 C Gaz, R 410 C Gaz, Dijital , Termostat, Laringoskop Seti, Diagnostik Set, Parmak Tipi Pulseoksometre, Kombinasyon Sedye, Riester 2.5v Ampul (10615) Riester Marka Oftal.Retineskop İçin), Riester XI 2,5v Ampul (10605) Riester Marka Oftal. Retineskop İçin), Kbb Amaçlı-Altın Uçlu Reusable No-Stick Bipolar Penset, Oksijen Sensörü (Sle 2000 Marka Ventilator İçin), 8x125 Sirkülasyon Motoru Incp-A1, 6x125 Sirkülasyon Motoru Incp-A1, 5x125 Sirkülasyon Motoru Incp-A1, 4x100 Sirkülasyon Motoru Incp-A1, 100cmx100cm 5mm Lastik Conta, 12 Volt 20 Amper Smps, İzoleli Yan Keski, Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takımı 8 Parça, Düz Uçlu Tornavida 8 Parça, Yıldız Uçlu Tornavida 8 Parça, Perçin Tabanca Seti, Kuru Kontak Sprey, Kırmızı Sıvı Conta, Saatçi Tornavida Seti, Elektronikçi Cımbız Seti, 24 Volt 14.5 Amper Smps, 0-30 Volt 0-5 Amper Ayarlı Adaptör, Altı Köşe Allen Anahtar Takımı, Oksijen Sensörü (Draeger Marka Evita XI Model Ventilator İçin), Biometri Probu(Nidek Marka Göz Ultrasonu İçin), Incremental Encoder(Drager Marka



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Fabius Model Anestezi Cih. İçin), Expiryum Valfi(Çok Kullanımlık) Drager Marka Mekanik Ventilator İçin), İspirasyon Güvenlik Valf Diyaframı (Drager Marka Ventilator İçin), 35 X 43cm Cr Kaseti, 24 X 30cm Cr Kaseti, Tripod Sehpa, Flow Sensör (Draeger Marka Evita XI Model Ventilator İçin), Nellcor Uyumlu Saturasyon Ara Ökablosu(Draeger Marka Delta XI Model Hastabaşı Monitörü İçin), 4100 00 8+B429:B448107 Tornavida Seti 7 Parça, Gws. 7-115 Profesyonel 720 Watt 115mm Avuç Taşlama, 0302180 Kombine Pense, K99-10 E15 15 Parça C-Pus T-Saplı Ve Topbaşlı Allen Anahtar Takımı, 5651040 Yıldız Tornavida Seti 7 Parça, 4941 1/4inç Kombine Lokma Takımı 94 Parça, 410/32-800 Su Terazisi, Mmaul Mal+B429:B448, 183066 Maxsteel Ağır Hizmet Mengenesi 100mm, 175x20x20 Mm.Nk Taşlama Taşı, 175x20x20 Scg Elmas Bilem Taşı, 1 Lt Alüminyum Portatif Oksijen Tüpü, 2 Lt Alüminyum Portatif Oksijen Tüpü, Dedektör Bodyguard Sensör Fd (Philips Marka Anjio İçin), Massimo Uyumlu Saturasyon Kabloları İçin Parmak Probu (Drager Marka Delta XI Model Hastabaşı Monitörü İçin), Kompresör, Drayer Batarya (Drager Marka Evita XI Model Ventilator İçin), Li-İon Batarya (Drager Marka Delta XI Model Monitör İçin), Eeg Kablosu, Biberon Isıtıcısı, Proximity Kart, Sesomo Kapılar İçin Kılavuz Takım, Sürücü Kart, Şifre Paneli 12 V 24, Enjektör Isıtma Cihazı, Adaptör (Erne Marka İa-12 Model Hastabaşı Monitörü İçin), 450 Watt Power Kartı(Kmc Marka 950 Model C Kollu Skopi İçin), Hastabaşı Monitörü Nıbp Kol Manşonu, 40x40 Membran Filtre Alımı(Fresenius Marka Su Sistemi İçin), Batarya (Mindray Marka Benehart D6 Model Defibrilatör İçin), Bronkoskopi Yıkama Cihazı Filtresi(Choyang Marka Yıkama Cih İçin), Ateşleme Beyni (Eco Stor Marka Brülör İçin), Oksijen Prizi (Montaj Dahil), Vakum Prizi, Kuru Hava Prizi, Kapı Sürücü Kartı, Kapı Motoru, El Sensörü, Emniyet Fotoseli Takımı, Yüzük Kesme Makası, Medikal Sağlık (Acil) Çantası, Bakteri Filtresi(Care Fusion Marka Sft Cihazı İçin), Fiber Optik Kablo (Storz Marka Soğuk Işık Kaynağı İçin), Blender Bloğu (Sle2000 Marka Infant Ventilator İçin), Basınç. Sensörü (Sle2000 Marka Infant Ventilator İçin), Nemlendirici Bloğu (Draeger Marka Caleo Model Küvöz İçin), Toco Probu(Edan Marka F3 Model Fetal Monitör İçin), Akü (Güç Kaynağı İçin) A31033 Yp Selenoid Valf (Artema Marka Fotoselli), Isı Ve Nem Ölçer Cihazı, Dijital Buzdolabı Termometresi, İç Manşon (Erka Marka Tansiyon Aletleri İçin), Puar (Erka Marka Tansiyon Aletleri İçin), Elektrikli Süpürge , Elektrikli Vakum Süpürge, Yer Yıkama Makinesi , Ranger , Ventilator Cihazı Alımı , Alet Arabası , Aspiratör Cihazı , Serum Askısı , Sedye , Muayene Masası, Acil Müdahale Arabası, İlaç Arabası, 4 Motorlu Hasta Yatağı, Ventilator Cihazı Vela , Ameliyat Lambası , Serum Askısı , Defibilatör , Refakatçi Koltuğu, Konteynir, Hastabaşı Monitörü, Tekerlekli Sandelye gibi belirtilen hizmet, malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2018 yılında **Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde; Sıcak Çermik FTR Hastanesi termal su hattı kuyusu değiştirildi bu kapsamda yaklaşık 460 metrelik termal su hattı yapıldı. Sıcak Çermik FTR Hastanesi önüne profil imalatından ambulans garajı yapıldı. Hastane Anestezi Yoğun Bakım'da wc, yıkama alanı, kirli atık alanı yapıldı. Hastane Anestezi Yoğun Bakım da zemin PVC kaplamaları değiştirildi. Hastane Anestezi Yoğun Bakımda alçıpan asma tavan yapıldı, duvar alçı tamirleri ve boya işlemleri yapıldı. Hastane Acil



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

bölümüne yeşil alan oluşturuldu, kantin alanı ve sedye havuzu oluşturuldu bu kapsamda taban PVC kaplaması, duvar örme işlemleri ve boya işlemleri yapıldı. Nükleer tıp alanında kurşun izoleli odalar yapıldı. Hastane 12. Katta yaklaşık 550m² çatı değiştirildi. Hastane dış çevresinde bazalt kaplama yürüyüş yolları yapıldı. Hastane dış çevre aydınlatması yapıldı. Acil girişe totem yapıldı. Hastane TV sistemi yapıldı. 1 adet esanjör değişimi yapıldı. 2 adet vakum motoru değişimi yapıldı. Pnömatik sistem revizyonu yapıldı. Çatı yatay ve dikey oluk sistemleri yenilendi. Ameliyathane yeni alanlar oluşturularak duvar örme alçı boya işlemleri yapıldı. İdari alanlarda karopan asma tavan uygulamaları yapıldı. Anestezi yoğun bakım ameliyathane ve acile dolap imalatları yapıldı. Yeni doğan servisi, göz polikliniği, güvenlik merkezi, nükleer tıp ta alüminyum bölme ve kapı imalatları yapıldı

2018 yılında **Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi** kapsamında 2016 tarihinde ihalesi yapılan, CÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için 2018 yılında 42.000.000 TL ödeneğin 41.546.277,85 TL'si harcanarak; Binanın B ve C Bloklarının kapıları, pvc zemin kaplaması, kompazit cephe kaplamaları yapıldı. Çevre istinat duvarları, ameliyathanenin iç kaplamam imalatları yapıldı. Mekanik tesisat imalatları %88,4 seviyesine gelmiştir. 2018 yılında %34 oranında tamamlanarak toplam %92 seviyesine gelmiştir. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 10.08.2019 dur.

2018 yılında **Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı Etüt Projesi** kapsamında; 24.04.2018 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ön Projelerin Hazırlanması Hizmeti İşi, ihalesi yapılmış ve Avan Proje teslim alınmıştır. 04.12.2018 tarihinde Uygulama Projesi ihalesi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

2018 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında; önceki yıllardan devreden 357 adet proje ve 2018 mali yılında desteklenen 279 ile birlikte 2018 mali yılında toplam 636 adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 186 adedi tamamlanmış ve 450 adet proje 2019 yılına devretmiştir. C.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında merkezi laboratuvar inşaatı yapımı tamamlanmış olup yıl içerisinde kabulü yapılmış ve Sağlık Bilimleri ve Kanser Araştırma (AR-GE) Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimi, Mühendislik Bilimleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Birimlerinin kurulabilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için cihaz ve makine teçhizatın temini amacıyla ihaleleri ve satınalma işlemleri yapılmış ve bir kısmı tamamlanmıştır ayrıca sarf malzemeler temin edilmiştir. Projede yer alan "fotoluminesans- mikro raman spektrometre sistemi" alımı gerçekleştirilerek ödemesi yapılmıştır.

2018 yılında Eğitim, Sağlık, Spor, Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında hedeflenen amaçlar doğrultusunda tamamlanmıştır.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. Yatırım Uygulamaları

4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 165.394.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2017 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 111.711.000- TL olmuştur. 2018 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 28.998.000-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak Spor Sektöründeki 1.500.000-TL ödenek eğitim Sektörüne aktarılmış ve likit karşılığı 18.544.000- TL ödenek kaydı yapılmış toplam bütçe ödeneği 49.042.000- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 46.496.000- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 168.050.000- TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2017 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 25.720.000- TL olmuştur. 2018 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 55.000.000-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 900.000- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 55.900.000- TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle 55.656.000- TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.


Üniversitemizin **Spor Sektöründe** toplam proje tutarları 1.500.000- TL'dir. Söz konusu proje kapsamındaki ödenek Eğitim sektörüne aktarılmış ve Yıl içerisinde Spor Sektöründe 0- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 27.956.000- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2017 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 23.059.000- TL olmuştur. 2018 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 4.897.000-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 3.699000- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneğimiz 8.596.000- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 8.596.000- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Sektör	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Eğitim	49.042.000	46.496.000	95
Sağlık	55.900.000	55.656.000	99
Spor	-	-	-
Teknolojik Araştırma	8.596.000	8.596.000	100
Toplam	113.538.000	110.748.000	98



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

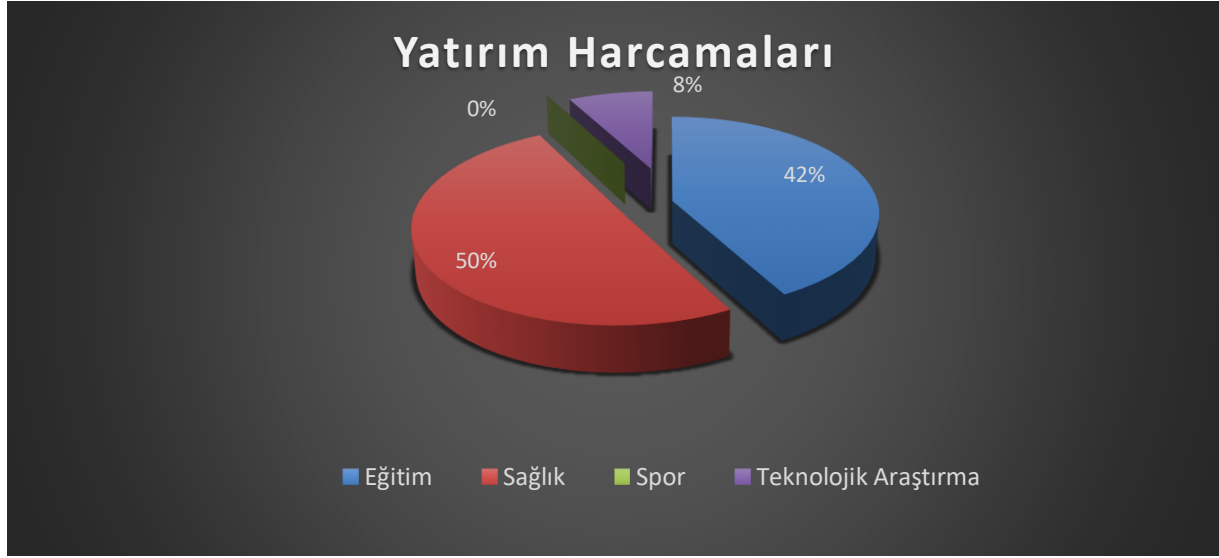

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

III- 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1-Proje No: 2018H030310 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2018 yılı yatırım programı kapsamında 100.000-TL ödenek öngörülmüştür. Toplam ödenek 100.000-TL olmuştur. Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 100.000- TL harcama yapılmıştır.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.2-Proje No: 1974H030250 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2018 yılı yatırım programı kapsamında 3.500.000- TL ödenek öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 4.000.000- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 7.500.000.-TL olmuştur. Bu ödenekten 2018 yılı sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, kampus asfalt, yol ve iş makinesi alımı için 7.463.000- TL harcanmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 103.211.000-TL olup, 2017 yılı kümülatif harcama tutarı 97.711.000- TL dir.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

1.3-Proje No: 2003H030480 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz detay programına göre bu projeden, İnşaatı devam eden , Gençlik Merkezi, Kangal Köpeği Araştırma Merkezi, Yemekhane Binası, Veteriner Fakültesi, Konferans Salonu, Yıldız Dağı YİSBAM devam etmektedir. 2018 yılı yatırım programında Derslik ve Merkezi Birimler projesine 18.730.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 6.000.000.- TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl içerisinde Strateji Bütçe Başkanlığından YHÖ den 1.500.000-TL aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 26.230.000-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle proje kapsamında 24.527.000-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 55.361.000-TL. olup, 2017 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 14.000.000- TL. dir.


2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 93 olmuştur.

2018 Yılı Topplulaştırılmış Ödeneği	Derslik ve Merkezi Birimler projesi	2018 Yılı Harcama
26.230.000 TL	YİSBAM(Yıldız Dağı)	2.058.000 TL
	Konferans Salonu	15.274.000 TL
	Veteriner Fakültesi	5.702.000 TL
	Gençlik Merkezi	1.493.000TL
Toplam		24.527.000 TL



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Derslik ve Merkezi Birimler Harcaması

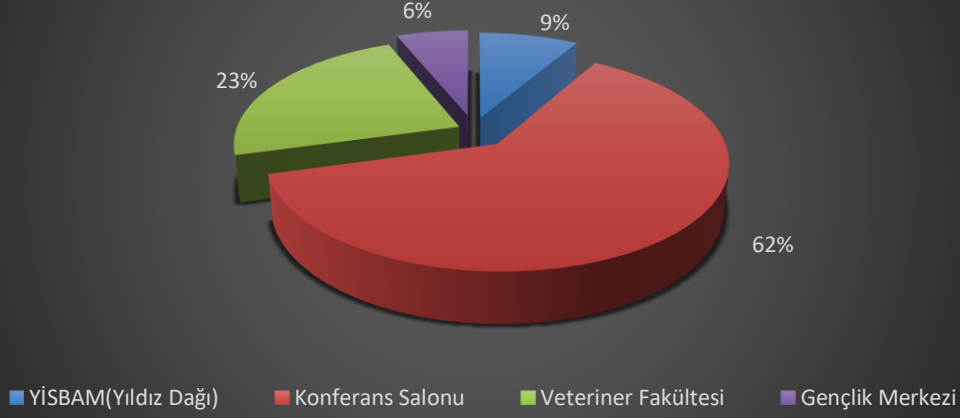

1.4- Proje No: 2018H030320 Proje Adı: Muhtelif İşler

1.4.1. Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 1.500.000- TL'si hazine yardımı, 870.000- TL öz gelir olmak üzere toplam 2.370.000- TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden 1.500.000-TL aktarılmış ve likit karşılığı olarak 2.130.000-TL ödenek eklenmiş toplam bütçe ödeneği 6.000.000-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibarıyla Üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 5.569.00-TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 93 olmuştur.

1.4.2. Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.798.000.-TL hazine yardımı karşılığı, 200.000-TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 1.998.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelirden, 2.380.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 4.378.000-TL olmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Rektörlük Makine teçhizat alımları için 4.321.000-TL, lik harcama yapılmıştır.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.4.3. Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2018 yılında 1.700.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 1.684.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 3.384.000-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanımı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 3.172.000- TL harcama gerçekleştirilmiştir.


2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 94 olmuştur.

1.4.4. Taşıt Alımı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yurt içi hibe olarak öngörülmüş, Rektörlük Makam aracı olarak 1 adet T02 Fort Cuga marka araç envantere alınmıştır.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Muhtelif İşler	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	6.000.000	5.569.000	93
Makine Teçhizat Alımı	4.378.000	4.321.000	98
Bilgi Teknolojileri	3.384.000	3.172.000	94
Toplam	13.762.000	13.062.000	95

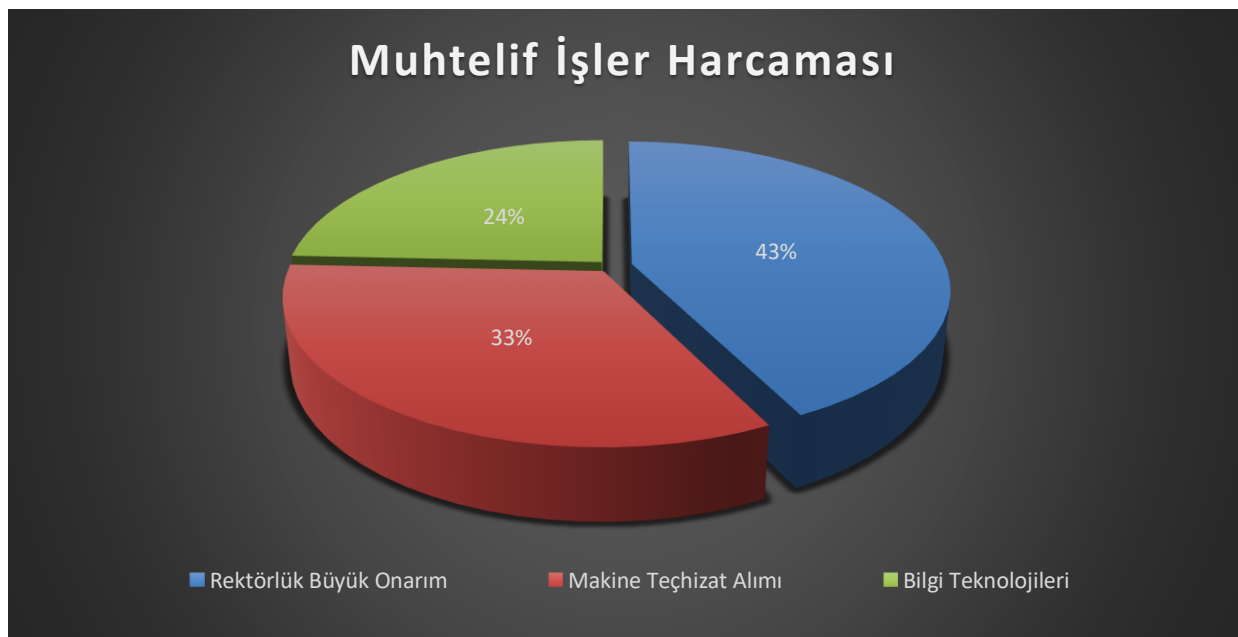




2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.5-Proje No: 2018H030330 Proje Adı: Yayın Alımı

Üniversitemiz kütüphane yayın alımları olarak Muhtelif İşler projesi kapsamında 2018 yılında 600.000-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 850.000-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. . Toplam bütçe ödeneği 1.450.000-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı, on-line veri tabanı olarak 1.444.000-TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

Eğitim Sektörü Projeler	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100
Kampus Alt Yapı	7.500.000	7.463.000	99
Derslik ve Merkezi Birimler	26.230.000	24.427.000	93
Muhtelif İşler	13.762.000	13.062.000	95
Yayın Alımı	1.450.000	1.444.000	99
Toplam	49.042.000	46.496.000	95

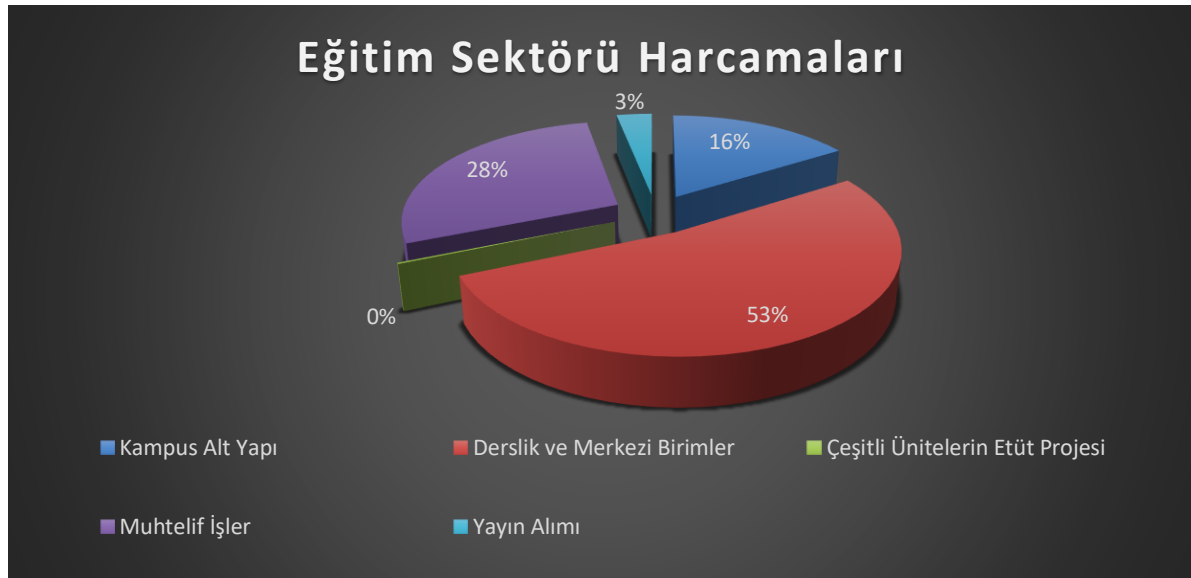



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

2.1. Proje No: 2018H050640 Proje Adı: Açık v e Kapalı Spor Tesisler

Söz konusu proje için 2018 yatırım programı kapsamında 1.500.000-TL ödenek verilmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle tamamı kurumiçi aktarma ile Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım projesine aktarılmıştır.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 0 olmuştur.

3. Sağlık Sektörü

3.1. Proje No:2018I000030 Proje Adı: Muhtelif İşler

3.1.1. Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Büyük Onarım için, 1.500.000- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 140.000-TL Makine-Teçhizat Büyük onarımına 78.000-TL Makine ve Techizat alımına aktarılmış. Toplam bütçe ödeneği 1.282.000- TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle Hastane Büyük Onarımı için 1.282.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

3.1.2. Makine ve Teçhizat Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 1.500.000-TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde Büyük Onarımdan 140.000-TL Makine-Teçhizat Büyük onarımına aktarılmış ve öz gelir karşılığı olarakda 500.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 2.140.000-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 2.138.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur

3.1.3. Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında makine teçhizat alımları için 10.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Büyük Onarımdan 78.000-TL Makine ve Teçhizat alımına aktarılmış ve öz gelir karşılığı olarakda 400.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 10.478.000-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle harcaması 10.478.000- TL'dir.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2.Proje No:2015I000130 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi

3.2.1.İnşaat

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için; 32.000.000- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde onkoloji hastanesi projesinden 6.000.000-TL, Hastane İnşaatı Etüt Projesinden 3.787.000-TL ödenek aktarılmış ve toplam bütçe ödeneği 41.787.000-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için 41.545.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 71.500.000- TL. olup, 2017 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 25.720.000-TL'dir

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur

3.2.2.Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için; 0- TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı sonu itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat için 0- TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 0 olmuştur

3.3. Proje no: 2017I000160 Proje Adı Onkoloji Hastanesi

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Onkoloji Hastanesi inşaatı için; 6.000.000- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde onkoloji hastanesi projesinden 6.000.000-TL ödenek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 0-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle Onkoloji Hastanesi inşaatı için 0-TL harcama gerçekleşmiştir.

3.4.Proje no: 2018I000540 Proje Adı Hastane İnşaatı Etüt Projesi

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane İnşaatı Etüt Projesi için; 4.000.000- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde o Hastane İnşaatı Etüt projesinden 3.787.000-TL ödenek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 213.000-TL olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle Hastane İnşaatı Etüt Projesi için 213.000- TL harcama gerçekleşmiştir.



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

4.1. Proje No: 2018K120200 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 4.887.000-TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2018 yılı gelir gerçekleşmesi 9.857.120,75 TL olmuştur. 2017 yılından devreden 3.699.000- TL' ödenek kaydı yıl içerisinde likit karşılı ödenek eklemesi yapılmış, gelir fazlası olan 4.945.120,75 TL ödenek bir sonraki yıla devretmiştir

2018 yılında özel hesaptan yatırım programı dâhilinde harcanan tutar 8.586.000.-TL olmuştur.

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

4.2. Proje No: 2011K120250 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde 2018 yılında 10.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 10.000-TL özel hesaba aktarılmıştır. 2018 yılında özel hesaptan bu projeye toplam 10.000- TL harcama yapılmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 23.069.000- TL. olup, 2017 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 23.0590.000- TL'dir

2018 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

IV-ÖNERİLER

- ✓ Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı	CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ										
Sektör Adı	EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ										(Bin TL)
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
417	2018H050640	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	1.500	0	0	1.500	-1.500	0
417	2018H030310	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	100	0	0	100		100
417	1974H030250	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	103.211	97.711	0	7.500		7.463
417	2003H030480	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	55.361	14.000	0	26.230		24.427
417	2018H030320	Muhlelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	6.068	0	1.070	13.762	+1.500	13.062
417	2018H030330	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	600	0	0	1.450		1.444
TOPLAM						166.840	111.711	1.070	50.542		46.496

Sektör Adı	SAĞLIK										
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
417	2018I000150	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	13.000	0	0	13.900		13.898
417	2015I000130	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	71.500	25.720	0	41.787	+9.787	41.545
417	2018I000160	Onkoloji Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Sivas	77.550	0	0	6.000	-6.000	0
417	2018I000540	Hastane İnşaatı Etüt Proje	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	4.000	0	0	4.000	-3.787	213
417	2018I000150	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2018	Sivas	2.000	0	0	2.000		0
TOPLAM						168.000	25.720		61.687		55.656
Sektör Adı	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA										
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
417	2018K120200	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	4.887	0	4.887	8.586		8.586
417	2011K120250	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	ÖZEL BÜTÇE	2018	Sivas	23.069	23.059	10	10		10
TOPLAM						27.956	23.059	4.897	8.596		8.596

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6		166.840			111.711			30.498			49.042			46.496
Sağlık	4		168.000			25.720			55.000			55.900			55.656
D.Kamu Hizm.	2		27.956			23.059			4.897			8.596			8.596
-İktisadi															
-Sosyal	2		27.956			23.059			4.897			8.596			8.596
TOPLAM	11		362.796			160.490			90.395			113.538			110.748

36

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1		2.000						2.000			2.000			0
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		2.000						2.000			2.000			0

