



## **2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**MART 2020**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**





*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin  
Eğitilmesi olacaktır.”*

*K. Atatürk*







# İÇİNDEKİLER

<b>I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....</b>	<b>9</b>
<b>II-GENEL DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Misyon ve Vizyon .....</b>	<b>11</b>
Miyon.....	11
Vizyon.....	11
<b>2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....</b>	<b>12</b>
Stratejik Amaç 1 .....	12
Stratejik Amaç 2 .....	12
Stratejik Amaç 3 .....	12
Stratejik Amaç 4 .....	13
Stratejik Amaç 5 .....	13
Stratejik Amaç 6 .....	14
<b>3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....</b>	<b>15</b>
3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi .....	15
3.2. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı .....	16
<b>4. Yatırım Uygulamaları .....</b>	<b>20</b>
4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	20
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: .....	21
<b>III- 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>21</b>
<b>1. Eğitim Sektörü .....</b>	<b>21</b>
1.1.Proje No: 2019H03-3289 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	21
1.2.Proje No: 1974H03-44 Proje Adı: Kampus Alt Yapı .....	21
1.3.Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler.....	21
1.4.Proje No: 2019H033290 Proje Adı: Muhtelif İşler .....	22
1.5.Proje No: 2019H03-3291 Proje Adı: Yayın Alımı .....	23
<b>2. Sağlık Sektörü .....</b>	<b>24</b>
2.1.Proje No:2019I00-3627 Proje Adı: Muhtelif İşler.....	24
2.2.Proje No:2015I00-2383 Proje Adı: Kadın Dogum ve Çocuk Hatanesi .....	25
2.3. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi .....	25
2.4.Proje no: 2018I00-17620 Proje Adı Hastane İnşaatı Etüt Projesi .....	25
<b>3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü.....</b>	<b>25</b>
3.1.Proje No: 2019K12-3863 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri .....	25
3.2.Proje No: 2011K12-1472 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı .....	26
<b>IV-ÖNERİLER.....</b>	<b>26</b>







## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısararak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde 2019 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %27'si Eğitim, % 68'i Sağlık, %5'i Teknolojik Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan Üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2019 yılı yatırım programı ile Üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 75.383.000 TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneklerin hazine yardımı karşılığı 70.799.000 TL, öz gelir karşılığı 4.584.000 TL dir .

2019 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 8.200.000 TL ve Yatırımları hızlandırma ödeneginden 5.000.000 TL olmak üzere toplam 13.200.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 88.583.000 TL olmuştur. Ödeneğimizin 60.735.000 TL'si harcanmış, 27.848.000 TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 69'dur.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

**Prof. Dr. Alim YILDIZ**  
**Rektör**





## II-GENEL DEĞERLENDİRME

### 1. Misyon ve Vizyon

#### **Misyon**

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektedir.

#### **Vizyon**

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

#### Stratejik Amaç 1

**Eğitim - öğretimin kalitesini arttırarak, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel değerlere açık olan bireyler yetiştirmek**

HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim altyapılarını oluşturmak ve sürekli geliştirmek

HEDEF 1.2: Mevcut akademik personelin yetkinliklerini arttırmak ve ihtiyaca yönelik nitelikli akademik personel istihdamını sağlamak

HEDEF 1.3: .Başarılı öğrencilerin Cumhuriyet Üniversitesini tercih etmesine yönelik şehirle birlikte ortak çalışmalar yapmak

HEDEF 1.4: Eğitim-öğretimi modern üniversite anlayışının gereklerine göre üretken ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirmek

HEDEF 1.5: Araştıran, sorgulayan, değer üreten ve bilimsel düşünceye sahip öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik ortam ve süreçleri tasarlayıp sürekli geliştirmek

#### Stratejik Amaç 2

**Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak**

HEDEF 2.1: Proje kültürünü ve bilincini oluşturmak

HEDEF 2.2: Başta bilimsel altyapıya değer katacak projeler olmak üzere sürece katkı sağlayan çalışmalar geliştirerek proje sayısını ve kalitesini arttırılmak

HEDEF 2.3: Araştırmacı kayıt sistemini tamamlamak, sürekli güncel tutmak ve Üniversitemizin sıralamalardaki yerini izleyerek gerekli önlemleri almak

#### Stratejik Amaç 3

**Şehir ile üniversite arasında yürütülecek olan faaliyetlerde üst düzey eşgüdüm, yüksek standartlara sahip kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların yaşam kalitesini arttırmak**

HEDEF 3.1: Üniversitemizin yerleşkelerinde paydaşlarımızın barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarına, yaşayan kampüs içinde çözüm bulmak



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF 3.2: Rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin şehre, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak ve bu hizmetlerle birlikte yabancı öğrenci ve engellilere ilişkin projeler yürütmek

HEDEF 3.3: Şehir ile Üniversitemiz (ilçeler dâhil) arasında ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek platformlar belirleyerek gerekli teknolojik altyapı ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek

HEDEF 3.4: Şehrimizin mazisindeki kültürel ve tarihsel birikimin ortaya çıkarılması ve bu potansiyel üzerinde geleceğin inşasında kamu kurumları ve STK'larla işbirliğini yürütmek

HEDEF 3.5: Ekolojik dengenin ve yeşil mirasın yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek

### **Stratejik Amaç 4**

***Üniversite-Sanayi-Kamu ve Üniversite-Kent işbirliğini artırarak ulusal ve yerel ekonomiye ve sosyo-kültürel yapının gelişimine katkıda bulunmak***

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda şehir yaşamına katkıda bulunmak

HEDEF 4.3: Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliğini geliştirmek

### **Stratejik Amaç 5**

***Üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak***

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, alanında uzmanlaşmış ve yüksek kalite standartlarına sahip bölge hastanesi olmak

HEDEF 5.2: Bölgemizde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçları karşılamak için ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve bakım merkezleri kurmak

HEDEF 5.3: Diş Hekimliği Fakültemizde genel anestezi ve sedasyon ile hastaların tedavilerinin yapılabilmesi için mevcut olan ameliyathanemizin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve 10 yataklı bir servis ile protez



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

laboratuvarları kurmak

HEDEF 5.4: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık hizmeti sunmak için farkındalık oluşturmak

### **Stratejik Amaç 6**

***Kurumsal yönetim sistemini geliştirerek paydaşlara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak.***

HEDEF 6.1: Yönetim bilgi sistemleri altyapısını geliştirerek sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak

HEDEF 6.2: Kurumsal insan kaynakları planlamasının yapılarak çalışanların niteliğini artırmak

HEDEF 6.3: Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması yönünde mali yönetim sistemini güçlendirmek

HEDEF 6.4: Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, birlikte iş yapabilme hissini geliştirmek



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

#### 3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuş ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir.

Üniversitemiz 127.965 m<sup>2</sup> kendi arazisi, 6.078.551m<sup>2</sup> hazinece tahsis edilen arazi, 39.525m<sup>2</sup> Üniversite vakıf arazisi, 32.438 m<sup>2</sup> tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m<sup>2</sup> özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi hastanesi, Dış Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Belediyesi sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 192 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık su arıtma tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

228.568m<sup>2</sup> eğitim, 109.007m<sup>2</sup> sağlık, 91.480m<sup>2</sup> idari, 18.080m<sup>2</sup> beslenme, 23.375m<sup>2</sup> kültür, 8.024m<sup>2</sup> sosyal tesis, 9.559m<sup>2</sup> diğer(Depo, Arşiv, vs.), 30.761m<sup>2</sup> lojman 53.054m<sup>2</sup> spor, 12.655m<sup>2</sup> araştırma alanları olmak üzere toplam 584.563m<sup>2</sup> kapalı alana sahip üniversitemizde; 40 adet toplantı salonu, 32 adet konferans salonu, 16 adet 50-250 kişilik amfi, 560 sınıf, 77 bilgisayar laboratuvarı, 193 adet diğer laboratuvarlar olmak üzere 918 adet derslik ile hizmet vermektedir.

267 Prof. 205 Doçent, 426 Dr. Öğretim Görevlisi, 382 Öğretim Görevlisi, 686 Araştırma Görevlisi, 2.841 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### **3.2.2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**

2019 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi için **Kampus altyapı projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için **Kampüs Alt Yapı İnşaatı** kapsamında; 4 Eylül Kültür Merkezi etrafına 250 metre dekoratif beton perde duvar yapımı. 4 Eylül Kültür Merkezi etrafına 300 metre panel çitli beton perde duvar yapımı. Turizm Fakültesi 261 metre Kanalizasyon yapımı. 900 m<sup>2</sup> etrafı perde duvar, üstü kaba telle çevrili kısmen kapalı hurdalık yapımı. Veteriner Fakültesi hayvan hastanesine 161 metre istinat duvarı. Gölet Kütük evi verandası 196 m<sup>2</sup> andezit kaplama yapımı. Spor Bilimleri Fakültesi spor salonu özel imalat 140 metre çatı deresi yapımı. Arıtma tesisine filtre binası yapımı ve Arıtmaya 48 metre 800 mm çapında baypas boru döşemesi, Turizm Fakültesi-Mihmandar Otel-Çim Saha- Heykel Bölümü ve Mimarlık Fakültesine toplam 4003 m<sup>2</sup> kilit parke yapıldı, 1070 metre beton bordür, 803 metre beton oluk döşendi. Eski kültür merkezi önü 166 m<sup>2</sup> bazalt kaplama yapıldı. Edebiyat Fakültesi- Dış Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tretuarlarına yağmur gideri içim oluk yapımı, HAVUZ ve MIHMANDAR OTEL'in su sıkıntısını gidermek için mevcut 160 mm anma çaplı plastik boruya paralel 500 mt boru ilavesi yapılarak giden su miktarı arttırılmıştır.

2019 yılında **Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında** 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılan Veteriner Fakültesi Eğitim Blokları İ k m a l İnşaatı bitirilmiş 2018 yılında ihalesi yapılan Gençlik Merkezi Bina İnşaatı yapımı devam etmekte ve Kangal Köpeği Araştırma Merkezine başlanmamıştır.

2019 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında Büyük Onarım işi kapsamında** iktisat fakültesinde 31 adet sınıf ve koridorları tabanlarına 4400 m<sup>2</sup> seramik döşeme kaplaması, tavanlara 4400 m<sup>2</sup> karopan kaplama, tavanlara led aydınlatmalar, 100 adet şaft kapağı değişimi ve 20 adet kapı yapılmış ve iktisat fakültesinde 3 adet bay ve bayan wc lerin komple tesisatı ,taban ve duvar fayansları, tavanları ve lavaboları yenilenmiştir. İlahiyat fakültesinde 21 adet sınıf, 1 adet kantin ve 1 adet koridor tabanlarına 2500 m<sup>2</sup> seramik döşeme kaplaması yapılmıştır. Eczacılık fakültesinde laboratuvarların olduğu kısımda, 3 eski laboratuvar birleştirilerek ve yeniden bölme duvarları yapılarak iki büyük laboratuvar dizayn edilmiş ve tabanları 350 m<sup>2</sup> 60x60 seramik döşeme kaplaması yapılmış, eski mermer ve mermeritten laboratuvar tezgâhları sökülüp yeni kompakt laminanttan 16 adet laboratuvar tezgâhları yapılmış, kapıları değişmiş ve bütün duvarlar, tavanlar alçı çekilip boyanmıştır. Araştırma Merkezlerinde ( eski kütüphane ) yeni bölmeler yapılarak 24 adet ofis oluşturulmuş, bu bölümlerde eski ahşap tavanlar sökülüp yerine 550 m<sup>2</sup> karopan tavan ve led aydınlatmalar yapılmıştır. Tabanlara 550 m<sup>2</sup> 60x60 ebatlarında seramik döşeme kaplaması yapılmıştır. 24 adet alüminyum kasa lamine kapı yapılmış ve bütün mekân duvarları alçı çekilip boyanmıştır. 2. Katta Tömer'e ait kısımda yeni bölmeler yapılarak 4 adet





## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ofis ve 4 adet sınıf oluşturulmuş, oluşan mahallere 8 adet Alüminyum kasa lamine kanat kapı yapılmış ve bütün mekân duvarları alçı çekilip boyanmıştır. Fen Fakültesinde bina yan cephelerindeki traverten kaplamalar sökülerek yerine 8 cm kalınlığında 1186 m<sup>2</sup>(6 adet cephe ) eps mantolamaları yapılmış ve boyanmıştır. Cüsem'de personel bay ve bayan tuvaletleri tuvalet taşları lavabolar, bataryalar yenilenip tabanlar ve duvarlar fayans, tavanlar ise alüminyum klipin tavan yapıldı ayrıca eski rektörlük binası bodrum katındaki eskiMatbaanın yeri duvar , tavanları ve yeni bölmeler 510 m<sup>2</sup> soğuk hava paneli ile kaplanmış , tabanları 320 m<sup>2</sup> Mermer kaplama yapılmış, taban kanal ve sıhhi tesisatları yapılmış, elektrikaydınlatma tesisatı yapılmış ve 9 adet soğuk hava panel kapısı yapılarak Süt İşleme Tesisine dönüştürülmüştür.

2019 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yapılan alımlarda:LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Alımı, Üniversitemiz Birimleri için Zebra Stor Perde Alımı, Üniversitemiz Birimleri için 250 Ton Kaloriferlik Kömür Alımı, Üniversitemiz Personel Taşıma Hizmeti Alımı, Üniversitemiz Benzin ve Motorin Alımı, Üniversitemiz 2 Kısım Personel Taşıma Hizmeti Alımı, Üniversitemiz 2020 Yılı Öğlen Yemeği Üretimi Dağıtım Servisi ile Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmeti Alımı,Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 7 Kalem Büro Mobilyası ve Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat Fakültesi için Devlet Malzeme Ofisinden 400 adet sabit sıra alınmıştır

2019 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Öz Gelir Karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; 2 Adet Davlumbaz, 26 Adet Yangın Tüpü, 2 Adet Telefon Makinesi, Projeksiyon Perdesi Storlu 180\*180, Döner Bıçağı, 12 Adet Kat Servis Arabası (2 Katlı), 2 Adet Kat Servis Arabası (Ahşap), Elektrikli Döner Bıçağı, 2 Adet Çamaşır Makinası, Taşınabilir Bilgisayar, 6 Adet Access Point (Erişim Noktası), Switch (Anahtarlama Cihazı), 3 Adet Salon Tipi İnverter Klima, Duvar Tipi Split Klima, 2 Adet Karcher Elektrikli Süpürge, Çim Biçme Traktörü alımı yapılmıştır.

2019 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yer alan **Bilgi Teknolojileri** alımlarında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır; PROLİZ Öğrenci ve Personel İşleri Yazılımı Bakım Ve Destek Anlaşması, AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, YORDAM Kütüphane Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, DİYOS E-İhale Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, SİNERJİ İcra Takip ve Dava Takip Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, DİYOS E-İhale Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, SİNERJİ Mevzuat ve İçtihat Programı Güncelleme, CBK-ENVISION EBYS Yazılımı Bakım ve Destek Anlaşması, 10 E-İmza Sertifikası Alımı, Handle.Net Üyeliği, NCS Sürekli İşçi Bordro Hesaplama Yazılımı Bakım ve Destek Anlaşması, Envision Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi E-Devlet Entegrasyonu Hizmeti, Globalsign SSL, Microsoft Kampüs Lisans Anlaşması, Personel İzinleri Entegrasyonu, Teamviewer Alımı, Yazılım Alımı: Trend Micro Antivirüs Deep Security, EMC2,



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Muhtelif Tamir Bakım ve Montaj Hizmetleri, Network Malzemeleri, Oracle ZF3 Disk Storage İçin Yedek Disk, Muhtelif Sarf Malzeme, CAT.6 UTP Kablo, Baskı Makinesi Alım İşi, Fotokopi Makinesi Yedek Parça, Alüminyum Montaj İşi, Kesintisiz Güç Kaynağı Ve Akü, Endüstriyel Etiket Yazıcısı, Hızlı Geçiş Sistemine İlave (Otoparklar İçin) İlave Cihaz, Muhtelif Malzeme, Endüstriyel Switch Ve Trafo, Ağ Güvenlik Duvarı Sistemi, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Turnike, Güvenlik Kamerası Sistemi, Dizel Jeneratör, Muhtelif Malzeme ve NAS Depolama Cihazı Alımı yapılmıştır.

2019 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır. 2019 yılı içerisinde; dergi kategorisinden 30.379 adet Fasikül Süreli Yayın, Merkezi Kütüphanemizde 91.000 diğer Fakülte/Yüksekokul/Yüksekokulları 78.000 toplamda 169.000 Basılı Kitap ile 100.000+ e-dergi, 3.000.000+ e-kitap ve 5.025 kayıtlı tez bulunmaktadır. Veri Tabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 18+13=31 dir.

2019 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamı için ayrılan ödeneklerle 10mm 30 Derece Teleskop, 4 Adet 12 Kanallı Ekg Cihazı, 300w Zenon Soğuk Işık Kaynağı, 5 Büyütmeli Biyomikroskop, Akülü Delme Vidalama Matkap, Ameliyat Mikroskopu, 2 Adet Ameliyathane Lambası Çift Başlı (160/160 Model), Ameliyathane Tavan Lambası Tekbaşlı (16 Et Model), 5 Adet Bifazik Defibrilatör Cihazı, 5 Adet Bipap St Cihazı (Seprey St-30d Model), Biyopsi Seti, Boy Ve Kilo Ölçer, Buhar Makinesi, Buhar Sterilizatörü, 15 Adet Büro Tipi Buzdolabı, Cerrahi Alet Seti (Yenidoğan), 6 Adet Cerrahi Aspiratör Cihazı, 3 Adet Çamaşır Kurutma Makinesi, 4 Adet Çamaşır Yıkama Makinesi, Ekokardiyografi Cihazı (Renkli Dopler), 2 Adet El Tipi Basınç Ölçme Cihazı, Elektrokoter Cihazı, Endoskopik Sistem Taşıma Arabası, Fiber Optik Işık Kablosu, Full Hd Endoskopik Kamera Ünitesi, Full Hd Otoklavlanabilir Endoskopik Kamera Kafası, Gazaltı Kaynak Makinası, Göğüs Cerrahi Alet Seti, 48 Adet İnfüzyon Cihazı Enjektörlü Volümetrik, Kbb Fess Seti, Kesintisiz Güç Kaynağı, Kırcı Delici Hilti, Kırcı Delici Matkap, 2 Adet Kimyasal Saklama Dolabı, Koaksiyel İlluminasyon Sistemi (Alın Lambası M14model), Kompresör, Laparoskopik El Alet Seti, 4 Adet Laringoskop Seti, 2 Adet Likid Tüp Çevrim Panosu (Oksijen), Makroskopi Kabini, Non Kontakt Tonometre, 3 Adet Noninvaziv Respiratör Cihazı (Omnio X Model), 2 Adet Paceli Bifazik Defibrilatör, 2 Adet Parafin Su Banyosu Cihazı, Paralel Bar Sistemi, 3 Adet Pediatrik Laringoskop Seti, 30 Adet Petaş Kma 900 Hastabaşı Monitörü, 2 Adet Renkli Dopler Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, Renkli Ultrason Doppler, Serum Isıtma Kabini, Soğutmalı Hava Kurutucu, 5 Adet Temassız Ateş Ölçer, Tft Lcd Medikal Mönitör, Vasküler El Dopleri (Pdıcv Model), 10 Adet Ventilatör Cihazı, Video Bronkoskop, Yağ Tutucu Aktif Karbon Kule, 16 Adet Yenidoğan Kuvözü, 4 Adet Zemin Yıkama Makinesi Binicili, 3 Adet 112 Acil Müdahale Arabası, 50 Adet



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3 LÜ Bank Tipi Sandalye, 20 Adet 3'lü Paravan, 70 Adet 4 Motorlu Hasta Karyolası, 10 Adet Alet Malzeme Arabası, 6 Adet Ameliyat Masası, 15 Adet Ameliyathane Dolabı, 2 Adet Ameliyathane Lambası, 7 Adet Ay Masa, 75 Adet Barkod Etiket Yazıcı Gc 420, 50 Adet Barkod Yazıcı Gc420t, 18 Adet Baza(Karyola) Tek Kişilik, 28 Adet Bekleme Koltuğu, 3 Adet Chart Projektör Cihazı, 260 Adet Çalışma Koltuğu, 5 Adet Çiftli Soyunma Dolabı, Duvar Tipi 12000 Btu/H Split Klima, 70 Adet Ekran Led Lcd, 215 Adet Ekranlı Masaüstü Telefon, 190 Adet Ekransız Masaüstü Telefon, 60 Adet Fileli Çalışma Koltuğu, 170 Adet Hasta Önü Yemek Masası, 75 Adet Hastabaşı Komidin, 10 Adet Havalı Şilte, Ipad Wifi 128 Gb Space Gray, 22 Adet İkili Bank Tipi Sandalye, 64 Adet İkili Kanepeler, 20 Adet İkili Koltuk, 15 Adet İlaç Arabası, 6 Adet Jinekolojik Obsterik Muayane Masası, 10 Adet Kan Alma Koltuğu, 9 Adet Kanepeler (Yuvarlak), 12 Adet Kanepeler Köşeli, 20 Adet Kanepeler Üçlü, 4 Adet Kep Bone Dolabı, Klima A7215, 110 Adet Köşe Sehpa, 4 Adet Kurşun Boyunluk, 4 Adet Kurşun Etek Yelek Model Kurşun Önlük, 3 Adet Lazer Yazıcı, 22 Adet Led Lcd Monitör 23inç, 50 Adet Led Tv 22 İnç, 40 Adet Led/Lcd Monitör, 10 Adet Masa Takımı, 11 Adet Masaüstü Bilgisayar, 9 Adet Masaüstü Bilgisayar Kasası, 2 Adet Masaüstü Tarayıcı, 15 Adet Mayo Masası, 90 Adet Misafir Koltuğu, 20 Adet Muayane Masası, 38 Adet Oturma Grubu(Kanepeler), 116 Adet Refakatçi Koltuğu, 50 Adet S Tipi Kanepeler, 140 Adet Sandalye, 19 Adet Sedyeler, 50 Adet Serum Askılık, 60 Adet Sınıf Dolabı, Taşınabilir Bilgisayar, 13 Adet Tek Kişilik Baza, 5 Adet Tekerlekli Sandalye (Hasta Taşıma), 11 Adet Telsiz Telefon, 20 Adet Toplantı Masası, 20 Adet Üçlü Bekleme Koltuğu (Metal), 23 Adet Üçlü Kanepeler, 4 Adet Üst Arama Dedektörü, Windows Tablet, 3 Adet Yazıcı, 19 Adet Yemek Masası, 50 Adet Yetişkin Karyola (Mespeler) gibi belirtilen hizmet, malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2019 yılında **Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde; Onkoloji hastanesi terasına çatı işi, hastanede ameliyathaneye PVC taban yapılması işi ile birlikte işin büyük kısmı sıcak çermik FTR hastanesi yenilemesinde gerçekleşmiştir. Çermikte bina dış boyası, odaların iç boyaları, balkon taban seramikleri, tüm banyoların taban seramikleri ve duvar fayansları, tüm banyoların asma tavanları yenilenmiş, mevcut Fuel-oil ile çalışan kalorifer kazanları sökülerek LNG ile çalışan doğal gaz sistemine dönüştürülmüştür. LNG basınç düşürme tesisi yapılarak bina doğalgaz sistemine dönüştürülmüştür. Eskiye ekonomik ömrünü tamamlayan; 2 adet eski kalorifer kazanı ve 2 adet brülörü doğalgaz kazanları ve brülörleriyle değiştirilmiştir. Eski boylerler sökülerek 2 adet çift serpantinli boyler ile değiştirilmiştir. Tüm banyolardaki temiz su ve pis su boruları ile lavabolar, tuvalet taşları ile aynaları da değiştirilmiş ve kazan dairesi elektrik işleri ile beraber tüm bina iç aydınlatmaları led armatürlerle değiştirilmiştir.

2019 yılında **Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi** kapsamında 2016 tarihinde ihalesi yapılan, CÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı işin 2019 yılında 15.000.000- TL ödeneğinin 11.000.000- TL'si harcanarak; 17.12.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2019 yılında **Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı Etüt Projesi** kapsamında; 188.000 m<sup>2</sup> ve 800 yataklı hastane inşaatı etüt projesi 2019 yılı içerisinde bitirilmiş ve 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılması planlanmaktadır.

2019 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında; Önceki yıllardan devreden 449 adet proje ve 2019 mali yılında desteklenen 184 adet proje ile birlikte 2019 mali yılında toplam 633 adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 329 adedi tamamlanmış ve 304 adet proje 2020 yılına devretmiştir.

C.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında merkezi laboratuvar inşaatı yapımı tamamlanmış olup yıl içerisinde kabulü yapılmıştır.

2018 yılında Eğitim, Sağlık, Spor, Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında hedeflenen amaçlar doğrultusunda tamamlanmıştır.

## 4. Yatırım Uygulamaları

### 4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 51.000.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2018 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 14.500.000- TL olmuştur. 2019 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 20.500.000-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize likit karşılığı 8.200.000- TL ödenek kaydı yapılmış toplam bütçe ödeneği 28.700.000- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 25.892.000- TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 543.700.000- TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2018 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 69.300.000- TL olmuştur. 2019 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 1.500.000-TL D ö n e r s e r m a y e v e 51.500.000-TL hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 5.000.000- TL ödenek kaydı eklenmiş. Toplam bütçe ödeneği 58.000.000-TL olmuştur. 2019 yılı sonu itibariyle 31.461.000- TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 30.198.000- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2018 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 26.815.000- TL olmuştur. 2019 yılı yatırım programı kapsamında Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 3.373.000-TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2019 yılı gelir gerçekleşmesi 12.138.395- TL olmuş gelir fazlası olan 8.765.395- TL ödenek bir sonraki yıla devretmiştir.



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

## III- 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 1. Eğitim Sektörü

#### 1.1- Proje No: 2019H03-3289 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2019 yılı yatırım programı kapsamında 100.000-TL ödenek öngörülmüştür. Toplam ödenek 100.000-TL olmuştur. Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 100.000- TL harcama yapılmıştır.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

#### 1.2- Proje No: 1974H03-44 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2019 yılı yatırım programı kapsamında 1.339.000- TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödenekten 2019 yılı sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, kampus asfalt, yol ve iş makinesi alımı için 1.339.000- TL harcanmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 8.300.000-TL olup, 2018 yılı kümülatif harcama tutarı 3.500.000- TL dir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

#### 1.3- Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında; Üniversitemiz detay programına göre bu projede Gençlik Merkezi Projesi devam etmekte, Veterinerlik Fakültesi Projesi bitirildi, Kangan Köpeği Araştırma Merkezi Projesine ise başlanmadı. 2019 yılı yatırım programında Derslik ve Merkezi Birimler projesi için 16.000.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 3.000.000.- TL ödenek kaydı yapılarak toplam bütçe ödeneği 19.000.000-TL olmuştur. 2019 yılı sonu itibariyle proje kapsamında 16.239.000-TL harcama gerçekleştirilmiştir.





## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Bu projenin toplam tutarı 34.300.000-TL. olup, 2018 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 11.000.000- TL. dir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 85 olmuştur.

### **1.4- Proje No: 2019H033290 Proje Adı: Muhtelif İşler**

#### **Rektörlük Büyük Onarım**

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 250.000- TL'si hazine yardımı, 460.000- TL öz gelir olmak üzere toplam 710.000- TL ödenek verilmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 710.000-TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

#### **Makine ve Teçhizat Alımı**

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 400.000.-TL hazine yardımı karşılığı, 751.000-TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 1.151.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olmak üzere 3.550.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 4701.000-TL olmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Makine teçhizat alımları için 4.657.000-TL, lik harcama yapılmıştır.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

#### **Bilgi Teknolojileri**


Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2019 yılında 600.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit karşılığı olarak 1.050.000.-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 1.650.000-TL olmuştur. 2019 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 1.649.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

<b>Muhtelif İşler</b>	<b>2019 Yılı Ödeneği</b>	<b>2019 Yılı Harcama</b>	<b>Gerçekleşme Oranı %</b>
<b>Rektörlük Büyük Onarım</b>	710.000	710.000	100
<b>Makine Teçhizat Alımı</b>	4.701.000	4.657.000	99
<b>Bilgi Teknolojileri</b>	1.650.000	1.649.000	99
<b>Toplam</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.016.000</b>	<b>99</b>



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

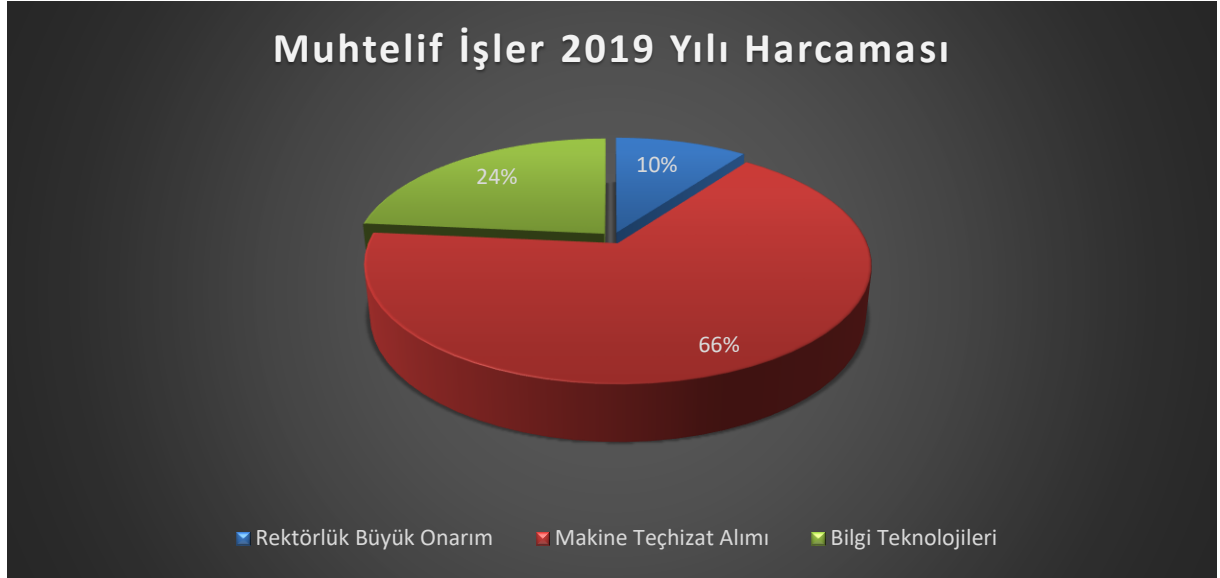

#### 1.5- Proje No: 2019H03-3291 Proje Adı: Yayın Alımı


Üniversitemiz kütüphane yayın alımları olarak Muhtelif İşler projesi kapsamında 2019 yılında 600.000-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde öz gelir karşılığı olarak 600.000-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. . Toplam bütçe ödeneği 1.200.000-TL olmuştur. 2019 yılı sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı, on-line veri tabanı olarak 1.199.000-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı için nakdi gerçekleştirme oranı % 100 olmuştur.

Eğitim Sektörü Projeler	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100
Kampus Alt Yapı	1.339.000	1.339.000	100
Derslik ve Merkezi Birimler	19.000.000	16.239.000	85
Muhtelif İşler	7.061.000	7.016.000	99
Yayın Alımı	1.200.000	1.199.000	100
<b>Toplam</b>	<b>28.700.000</b>	<b>25.893.000</b>	<b>90</b>



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

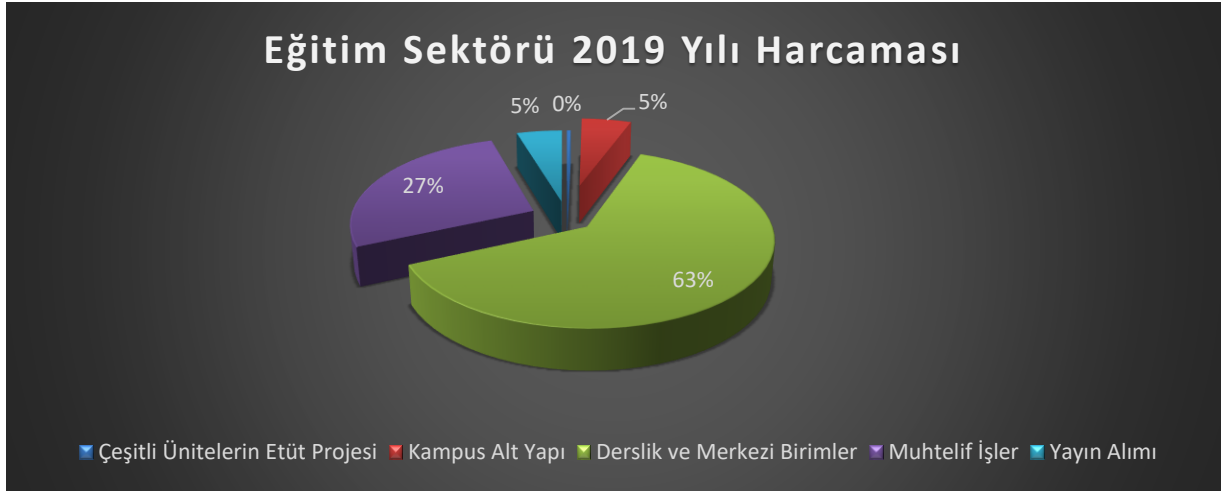

## 2. Sağlık Sektörü

### 2.1.Proje No:2019I00-3627 Proje Adı: Muhtelif İşler

#### **Büyük Onarım**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Büyük Onarım için, 1.500.000- TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı sonu itibariyle Hastane Büyük Onarımı için 1.400.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 94 olmuştur.

#### **Makine ve Teçhizat Büyük Onarım**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 2.500.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı sonu itibariyle Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 2.469.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 98 olmuştur

#### **Makine ve Teçhizat Alımı**

Üniversitemiz sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında mevcut hastanemiz ve yeni yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için makine teçhizat alımları amacıyla 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 5.000.000-TL ve Hastane İnşaatı Projesinden 9.000.000-TL ödenek toplam bütçe ödeneği 16.000.000-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle harcaması 16.000.000- TL'dir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.





## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### **2.2.Proje No:2015I00-2383 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı için; 15.000.000- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 11.000.000-TL, harcama gerçekleştirilerek inşaatın geçici kabulü 08.11.2019 tarihinde yapılmıştır. Hastanenin Makine Teçhizat alım ları sağlık muhtelif işler projesi kapsamında yürütülmektedir.

Bu projenin toplam tutarı 114.000.000- TL. olup, 2018 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 69.000.000-TL'dir

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 73 olmuştur

### **2.3. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastanesi inşaatı için; 28.000.000.- TL ödenek öngörülmüş bu ödeneği 9.000.000,00 TL'si Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin Makine teçhizatı alımı için Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Ayrıca etüt projesi yıl içerisinde bittiği için inşaatına başlanmamıştır.

### **2.4.Proje no: 2018I00-17620 Proje Adı Hastane İnşaatı Etüt Projesi**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane İnşaatı Etüt Projesi için; 2.500.000- TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı sonu itibariyle Hastane İnşaatı Etüt Projesi için 590.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 24 olmuştur

## **3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü**

### **3.1. Proje No: 2019K12-3863 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 3.373.000-TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2019 yılı gelir gerçekleşmesi 12.138.395- TL olmuş gelir fazlası olan 8.765.395- TL ödenek bir sonraki yıla devretmiştir

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.



## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### **3.2. Proje No: 2011K12-1472 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde 2019 yılında 10.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 10.000-TL özel hesaba aktarılmıştır. 2019 yılında özel hesaptan bu projeye toplam 10.000- TL harcama yapılmıştır.

Bu projenin toplam tutarı 26.825.000- TL. olup, 2018 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 26.815.000- TL'dir

2019 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

## **IV-ÖNERİLER**

- ✓ Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

## 2019 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ											
Kuruluş Adı	EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ										(Bin TL)
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mik.	Harcama Toplam
417	2019H03-3289	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Sivas	100	0	0	100		100
417	1974H03-44	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Sivas	8.300	3.500	0	1.339*		1.339
417	2003H03-651	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Sivas	34.300	11.000	+3.000	19.000		16.239
417	2019H033290	Muhlelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Sivas	7.100	0	+4.600	7.061**		7.016
417	2019H03-3291	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Sivas	1.200	0	+600	1.200		1.199
<b>TOPLAM</b>						<b>51.000</b>	<b>14.500</b>	<b>8.200</b>	<b>28.700</b>		<b>25.893</b>

\*Yatırım Programında 1.300.000 TL Olmasına karşın Bütçe Kanununda 1.339.000 TL olarak geçmiş ve harcamar bu doğrultuda gerçekleşmiştir.

\*\* Yatırım Programında 2.500.000 TL Olmasına karşın Bütçe Kanununda 2.461.000 TL olarak geçmiş ve harcamar bu doğrultuda gerçekleşmiştir

Sektör Adı	SAĞLIK										
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
417	2019I00-3627	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Sivas	4.500	0	0	20.000	+5.000* +9.000	19.869
417	2015I00-2383	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Sivas	114.000	69.000	0	15.000		11.000
417	2018I00-17620	Hastane İnşaatı Etüt Proje	ÖZEL BÜTÇE	2019	Sivas	2.800	300	0	2.500		590
417	2019I00-109658	Hastane İnşaatı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Sivas	422.400	0	0	19.000	-9.000	0
417	2019I00-3627	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2019	Sivas	1.500	0	0	1.500		0
TOPLAM						545.200	69.300		58.000		31.459
Sektör Adı	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA										
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
417	2019K12-3863	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	Sivas	3.373	0		3.373		3.373
417	2011K12-1472	Merkezi Araştırma Laboatuvarları	ÖZEL BÜTÇE	2019	Sivas	26.825	26.815		10		10
TOPLAM						30.198	26.815		3.383		3.383

\*5.000.000 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneginden Makine-Teçhizat Alımı için Aktarma Yapılmıştır.

**SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)**

**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	5		51.000			14.500			20.500			28.700			25.893
Sağlık	4		545.200			69.300			51.500			56.500			31.459
D.Kamu Hizm.	2		30.198			26.815			3.383			3.383			3.383
-İktisadi															
-Sosyal	2		30.198			26.815			3.383			3.383			3.383
<b>TOPLAM</b>	<b>11</b>		<b>626.398</b>			<b>110.615</b>			<b>75.383</b>			<b>88.583</b>			<b>60.735</b>

**Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1		1.500						1.500			1.500			0
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>		<b>1.500</b>						<b>1.500</b>			<b>1.500</b>			<b>0</b>

