



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2022
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----------|
| I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ..... | 9 |
| Prof. Dr. Alim YILDIZ | 9 |
| II-GENEL DEĞERLENDİRME | 11 |
| 1. Misyon ve Vizyon..... | 11 |
| Misyon | 11 |
| Vizyon..... | 11 |
| 2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri | 12 |
| Stratejik Amaç 1 | 12 |
| Stratejik Amaç 2 | 12 |
| Stratejik Amaç 3 | 12 |
| Stratejik Amaç 4 | 13 |
| Stratejik Amaç 5..... | 13 |
| Stratejik Amaç 6 | 14 |
| 3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları | 15 |
| 3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi | 15 |
| 3.2. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı..... | 16 |
| 4. Yatırım Uygulamaları | 22 |
| 4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu | 22 |
| 4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: | 22 |
| III- 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI..... | 23 |
| 1. Eğitim Sektörü | 23 |
| 1.1- Proje No: 2021H03-168121 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 23 |
| 1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapı | 23 |
| 1.3- ProjeNo:2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler | 23 |
| 1.4- Proje No: 2021H03-168234 Proje Adı: Muhtelif İşler | 24 |
| 1.5- Proje No: 2021H03-168125 Proje Adı: Yayın Alımı | 25 |
| 2. Sağlık Sektörü | 26 |
| 2.1.Proje No: 2021I00-168567 Proje Adı: Muhtelif İşler | 26 |
| 2.2.Proje No:2015I00-2383 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi | 27 |
| 2.3. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi | 27 |
| 3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü | 28 |
| 3.1. Proje No: 2021K12-167779Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 28 |
| IV-ÖNERİLER | 28 |



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kıskarak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde 2021 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %20,51'i Eğitim, %74,95'i Sağlık, %4,54'ü Teknolojik Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan Üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2021 yılı yatırım programı ile Üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 89.708.000TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneklerin hazine yardımı karşılığı 84.668.000 TL, öz gelir karşılığı 5.040.000 TL'dir.

2021 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 40.000.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 129.708.000 TL olmuştur. Ödeneğimizin 81.782.173 TL'si harcanmış, 47.925.827 TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 63'tür.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel, milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Eğitim - öğretimin kalitesini artırarak, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel değerlere açık olan bireyler yetiştirmek

HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim altyapılarını oluşturmak ve sürekli geliştirmek,

HEDEF 1.2: Mevcut akademik personelin yetkinliklerini arttırmak ve ihtiyaca yönelik nitelikli akademik personel istihdamını sağlamak,

HEDEF 1.3: Başarılı öğrencilerin Cumhuriyet Üniversitesini tercih etmesine yönelik şehirle birlikte ortak çalışmalar yapmak,

HEDEF 1.4: Eğitim-öğretimi modern üniversite anlayışının gereklerine göre üretken ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirmek,

HEDEF 1.5: Araştıran, sorgulayan, değer üreten ve bilimsel düşünceye sahip öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik ortam ve süreçleri tasarlayıp sürekli geliştirmek.

Stratejik Amaç 2

Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak

HEDEF 2.1: Proje kültürünü ve bilincini oluşturmak,

HEDEF 2.2: Başta bilimsel altyapıya değer katacak projeler olmak üzere sürece katkı sağlayan çalışmalar geliştirerek proje sayısını ve kalitesini arttırılmak,

HEDEF 2.3: Araştırmacı kayıt sistemini tamamlamak, sürekli güncel tutmak ve üniversitemizin sıralamalardaki yerini izleyerek gerekli önlemleri almak.

Stratejik Amaç 3

Şehir ile üniversite arasında yürütülecek olan faaliyetlerde üst düzey eşgüdüm, yüksek standartlara sahip kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.1: Üniversitemizin yerleşkelerinde paydaşlarımızın barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarına, yaşayan kampüs içinde çözüm bulmak,

HEDEF 3.2: Rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin şehre, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak ve bu hizmetlerle birlikte yabancı öğrenci ve engellilere ilişkin projeler yürütmek,



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF 3.3: Şehir ile üniversitemiz (ilçeler dâhil) arasında ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek platformlar belirleyerek gerekli teknolojik altyapı ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

HEDEF 3.4: Şehrimizin mazisindeki kültürel ve tarihsel birikimin ortaya çıkarılması ve bu potansiyel üzerinde geleceğin inşasında kamu kurumları ve STK'larla işbirliğini yürütmek,

HEDEF 3.5: Ekolojik dengenin ve yeşil mirasın yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek.

Stratejik Amaç 4

Üniversite-Sanayi-Kamu ve Üniversite-Kent işbirliğini artırarak ulusal ve yerel ekonomiye ve sosyo-kültürel yapının gelişimine katkıda bulunmak

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak,

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda şehir yaşamına katkıda bulunmak,

HEDEF 4.3: Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliğini geliştirmek.

Stratejik Amaç 5

Üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, alanında uzmanlaşmış ve yüksek kalite standartlarına sahip bölge hastanesi olmak,

HEDEF 5.2: Bölgemizde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçları karşılamak için ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve bakım merkezleri kurmak,

HEDEF 5.3: Diş Hekimliği Fakültemizde genel anestezi ve sedasyon ile hastaların tedavilerinin yapılabilmesi için mevcut olan ameliyathanemizin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve 10 yataklı bir servis ile protez laboratuvarları kurmak,

HEDEF 5.4: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık hizmeti sunmak için farkındalık oluşturmak.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Stratejik Amaç 6

Kurumsal yönetim sistemini geliştirerek paydaşlara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak.

HEDEF 6.1: Yönetim bilgi sistemleri altyapısını geliştirerek sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak,

HEDEF 6.2: Kurumsal insan kaynakları planlamasının yapılarak çalışanların niteliğini artırmak,

HEDEF 6.3: Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması yönünde mali yönetim sistemini güçlendirmek,

HEDEF 6.4: Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, birlikte iş yapabilme hissini geliştirmek.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuş ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir.

Üniversitemiz 127.965 m² kendi arazisi, 6.078.551m² hazinece tahsis edilen arazi, 39.525 m² üniversite vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 35 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Dış Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Köyü sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 186 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık Su Arıtma Tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

İdari hizmet alanları 59.721,19 m² eğitim hizmet alanları 91.018,07 m², sağlık alanları 140.539,81 m², beslenme alanları 25.217,66 m², kültür alanları 10.714,02 m², sosyal alanları 32.978,44 m², lojman alanları 25.420,00 m², diğer (depo, arşiv vb.) alanları 211.097,68 m², spor alanları 56.637,02 m², araştırma alanları 10.145,13 m² olmak üzere toplam 663.489,02 m² alana sahiptir.

282 Prof. 226 Doçent, 376 Dr. Öğretim Üyesi, 392 Öğretim Görevlisi, 715 Araştırma Görevlisi, 3.413 İdari personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2.2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2021 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi amacıyla **Kampus Altyapı Projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için;

Üniversitemiz trafoların bakım onarımı; ısı merkezi, çevre birimi ve destek birimine hırdavat ve nalbur malzemesi alımı,

Çim stadyum ve gölet yürüme yolları altına hasır çelik alımı,

Üniversitemiz kaldırım tamirlerinde ve yeni yol yapımları için (personel yemekhane önü otopark düzenleme, gölet ara yolu) parke ve bordür taşı alımı,

Gölet kale içi için otomatik sulama malzemesi alımı,

Mühendislik fakültesi A, B blok önleri ve kanalizasyon geçen yan yol parke ve bordür taşı döşeme işi yapımı,

Edebiyat fakültesi önü otopark yeri parke taşı ve bordür taşı döşeme işi yapımı,

Mimarlık fakültesi önü otopark yeri parke ve bordür taşı döşeme işi yapımı,

Kampüs içi yol ve kaldırımların tamirata, kampüs kanalizasyon ve su hatları bakım onarımları, kampüs içi genel temizlikleri ve yeşil alanlar sulama bakım ve biçme işlemleri yapılmıştır.

Kış ayının çok çetin ve karlı geçmesinden dolayı 1 kepçe 4 traktörle kampüsün bütün ana yolları ve otoparkların kar temizliği yapılmış ve yolların buzlanması sebebiyle kazalara mahal vermemek için tuzlama işlemleri de yapılmıştır.

2021 yılında **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi** kapsamında 25.08.2020 tarihide ihalesi yapılan Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul İnşaatı devam etmekte olup; A-B-C- D blokların tamamının kaba inşaatı bitirilmiş ince işleri ve çevre düzenleme işleri kalmıştır.Fiili gerçekleştirme oranı %45 seviyesindedir.

2021 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca **Büyük Onarım** işi içerisinde;

Mimarlık Fakültesi giriş fuaye üstü çatısı polikarbon yapımı,

Eczacılık fakültesi laboratuvar yapımı,

İktisat fakültesi giriş tabanı ve tavanı yapımı, bina yan cephelerindeki traverten mermerlerin sökülüp sıvanması işi,

Cüba ve satın alma ofisleri yapımı ,(yemekhanenin üstüne)

Gürün MYO istinat duvarı yapımı,

Divriği MYO oluk ve galeri boruları değişimi,

Lojmanlar misafirhane banyo kapıları değişimi,

Veterinerlik fakültesi hayvan hastanesi muayene bölmeleri yapımı, oda bölmeleri yapımı, giriş cam yapımı, oda aydınlatmaları yapımı, pvc doğramadan temizlik bölmesi yapımı,



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Rektörlük teraslarının cam balkon ile kapatılması,
Gölet kale çevresi baskı beton yol yapım işi,
Daire başkanlıkları dış mermer merdivenlerin yapımı,
Kangal köpeği barınak ve idari bina çatıları yapımı,
Köpek barınakları yapımı çiftli 10 adet, barınak ve saha çevresi hatıl, baba ve tel tamir ve değişimleri yapımı,
İdari bina dış cephe yalıtımı, dış ve iç kapıları, wc ve depo fayansları, mutfak tezgâhları ve doğalgaz işi yapımı,
Barınak saha ve barınak çevreleri parke ve bordür taşı döşeme işi yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan alımlarda:

Üniversitemiz çeşitli birimleri için 1000 m² Zebra Stor Perde alımı,
Rektörlük 87 adet yangın söndürme tüpü alımı,
Rektörlük 10 adet Atatürk portresi alımı,
Rektörlük 1 adet ilaçlama makinası 1 adet çim biçme makinası alımı,
Rektörlük 60 m² perde 1 adet halı alımı,
Rektörlük 1 adet kombi 1 adet radyatör alımı,
Rektörlük 1 adet yazıcı alımı,
Rektörlük 50 adet Telefon alımı,
Rektörlük 10 adet telsiz telefon alımı,
Rektörlük 114 adet yangın yönlendirme levhası alımı,
Rektörlük 1 adet bilgisayar alımı,
Genel Sekreterlik 20 adet telefon, 6 adet telsiz telefon, 2 adet telefon santrali alımı,
Genel Sekreterlik 1 adet halı, 1 adet kitaplık 11 adet soyunma dolabı, 1 adet dinlenme amaçlı mobilya, 1 adet kanepa, 1 adet yemek masası, 4 adet sandalye alımı,
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 45 adet elektrik- elektronik malzemesi alımı,
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 adet seyyar tank 1 adet hidrofor alımı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 1 adet telefon santrali alımı,
Merkezi Satınalma 2 adet tezgah alımı,
Merkezi Satınalma hava perdesi alımı,
Merkezi Satınalma 1 adet su arıtma cihazı, 1 adet buzdolabı 1 adet bulaşık makinası 1 adet çay ocağı alımı,
Merkezi satınalma 1 adet kahve Makinası, 1 adet Çay Makinası ,1 adet semaver 7 adet ısıtıcı alımı,
Kangal Köpeği Araştırma Merkezi el arabası alımı,
Baskı Grafik Birimi 21 adet tesisler yedek parça alımı,
Matbaa tek dikiş makinası alımı,
Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 120 adet tabure alımı,
İletişim Fakültesi 1 adet radyo vericisi alımı,



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Hukuk Fakültesi 1 adet çay kazanı alımı,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1 adet renkli yazıcı alımı,

Üniversitemiz Merkezi Satın Alma Birimi ve Maaş Tahakkuk Birimi kurulmuş olup 20 adet çalışma koltuğu, 1 adet üçlü misafir koltuğu, 15 adet soyunma dolabı, 5 adet yemek masası, 4 adet çalışma koltuğu, 2 adet misafir koltuğu, 4 adet bekleme koltuğu alımı,

Üniversitemiz çeşitli birimleri için 330 adet Türk Bayrağı-Flama alımı,

Marangoz atölyesi 107 adet suntalam, 42 adet MDF, 30 adet boyalı MDF, 100 adet ceviz suntalam alımı gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında öz gelir karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca;

1 adet komprasör, 1 adet sayısal tel, 1 adet sebil, 1 adet semaver, 1 adet kahve makinesi, 1 adet su arıtma, 2 adet elektrik süpürgesi, 99 adet sandalye, 3 adet çim biçme makinesi, 11 adet muhtelif malzeme, 1 adet banket arabası, 1 adet aktif hopörlör, 1 adet switch, 2 adet su arıtma, 4 adet bar sandalyesi, ip kablolu tel alımı gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca **Bilgi Teknolojileri** alımlarında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır;

1 adet bariyer kolu, hdmi kabloları, 16 adet projeksiyon perdesi, 26 adet askı aparatı, 11 adet gbic modül, 3000 metre utb kablo, 4 gb bellek, 4 adet kamera bataryası, 2 adet kamera direği, kare buat kamera kutusu, 10 adet adaptör, 8 adet kamera poe switch, 2 adet video capture kartı 2 , 200 metre kablo kanalı, 122 adet akü, 3 adet disk 8 adet 16 gbps fiber ara yüz , 4 paket araç geçiş bariyer plastik vida, 21 adet all-in-one bilgisayar, 15 adet projeksiyon, disk tabanlı yedekleme cihazı, storage sistemine ilave malzeme alımı, fotokopi makinesi yedek parça alımı, radyo vericisi anten kablosu değişimi, mitac bilgisayar anakart proliz öğrenci ve personel işleri yazılımı bakım ve destek anlaşması , amp hakediş ve yaklaşık maliyet yazılımının güncellenmiş sürüm kullanım hakkı, yordam kütüphane yazılımının güncellenmiş sürüm kullanım hakkı, diyos e-ihale yazılımının güncellenmiş sürüm kullanım hakkı, sinerji icra takip takip yazılımının güncellenmiş sürüm kullanım hakkı, sinerji dava takip yazılımının güncellenmiş sürüm kullanım hakkı, sinerji mevzuat ve içtihat programı güncelleme cbk-envision ebys yazılımı bakım ve destek anlaşması, solidworks mekanik çizim programı, ncs işçi maaş programı güncellenmiş sürüm kullanım hakkı, kvkk süreç yönetim yazılımı, lisansüstü sınavlar uzaktan eğitim sanal sınıf yazılımı, wildcard ssl sertifikası, microsoft kampus lisans anlaşması, zoom webinar, zoom meeting, teamviewer, e-imza sertifikası, video konferans yazılımı alımı gerçekleştirilmiştir.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2021 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları Projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır.

2021 yılı içerisinde; dergi kategorisinden 39.385 adet fasikül süreli yayın, Merkezi Kütüphanemizde 95.000 diğer Fakülte/Yüksekokul/Yüksekokulları 69.000 toplamda 164.000 basılı kitap ile 100.000+ e-dergi, 4.500.000+ e-kitap ve 5.586 kayıtlı tez bulunmaktadır. Veri tabanı aboneliği ise; (TÜBİTAK ve Üniversite) 18+15=33'tür

2021 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamı için ayrılan ödeneklerle;

Yazıcı, faksimile cihazı, fotokopi ve baskı makinesi malzemeleri, küçük el aletleri ve gereçleri, kaynak malzemeleri, tutturucular, kaplayıcılar, elektrik-elektronik ve aydınlatma malzemeleri ağaç ürünleri, metal ürünler, plastik ürünler, makineler ve aletler grubu yedek parçaları, cihazlar ve aletler grubu yedek parçaları, büro makineleri grubu yedek parçaları, su ve sıhhi tesisatı yedek parçaları, diğer yedek parçalar, medikal malzemeler, sıvı yakıtlar, temizlik malzemeleri, temizlik araç ve gereçleri, mefruşat ürünleri, pompalar kbb muayene ünitesi alımları gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında **Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde;

Acil servis hastane yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden revize edilmiş, 11. kat göğüs hastalıkları ve uyku servisine dönüştürülmüş, 12.kat dahiliye ve palyatif servisine dönüştürülmüş, hastane E-F-G blokları Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi tarafına bakan cepheler boyanmış, sıcak çermik FTR hastanesi yangın ihbar sistemi kurulmuştur.

2021 yılında **Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi** kapsamında 2016 tarihinde ihalesi yapılan, CÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İnşaatı işi 17.12.2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak bitmiş makine teçhizat alımı devam etmektedir bu kapsamda :

2 adet acil çantası, 1 adet dermatolojik amaçlı portable cryo cihazı termosu, 2 adet baskül (tartı) 15 adet laringoskop, 1 adet cmos zoom camera head, 1 adet laparoscope 10mm 30 deg 10 mm optik, 1 adet torakoskopik cerrahi el aleti makas, 1 adet wood lambası, 1 adet kan aklama dolabı, 1 adet çift akülü vidalama makinası, 2 adet kırıcı delici hilti, 1 adet şarjlı matkap, 2 adet acil çantası, 2 adet masaüstü santrifüj, 14 adet kart okuyuculu şifreli panel, 5



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

adetön sırt koruma çocuk kurşun önlük, 10 adet ön sırt koruma yetişkin kurşun önlük, 2 adet yangın dolabı, 1 adet transservikal rezeksiyon sistemi, 1 adet transüretal rezeksiyon sistemi, 5 adet şarjlı laringoskop, 2 adet webcam, 2 adet boy ölçer (stadiometre), 1 adet distile su için arıtma cihazı, 2 adet yetişkin 0 derece teleskop, 1 adet lcd tv, 1 adet yenidoğan bebek bakım maketi, 2 adet teleskop 30 derece, 1 adet teleskop 0 derece, 6 adet aspiratör cihazı, 1 adet çalkalayıcı, 2 adet 20 g mikro kapsül makası rumex, 2 adet mikro capsulorhexis forceps rumex, 15 adet cpr destekli monitörlü defibrilatör, 1 adet kuru hava sterilizatörü, 12 adet kaset blok arşiv dolabı, 1 adet görüntü arşivleme ve iletişim sistemi (pacs), 3 adet hasta ısıtma cihazı, 1 adet vidalı kompresör, 16 adet ilaç arabası, 50 adet hasta başı monitörler, 5 adet ön koruma kurşun önlük, 1 adet benzinli misinalı tırpan, 8 adet süt sağım cihazı, 2 adet çim biçme makinesi, 2 adet karekod barkod okuyucu, 1 adet ultrasonik yıkama cihazı, 10 adet laboratuvar çalışma koltuğu, 4 adet kamera, 25 adet asansör içi tam tuş takımlı gömme telefon, 1 adet salon tipi klima, 1 adet kontrollü turnike alımı ve kurulumu, 4 adet kuvöz , 4 adet fototerapi cihazı , 2 adet ekg, 2 adet süt sağım cihazı, 1 adet kurşunlu koruyucu paravan, 2 adet laparoskopi sistemi, 10 adet serum askısı ayaklı, 1 adet şok dalga tedavisi (eswt) cihazı, 2 adet aspiratör cihazı, 3 adet elektrokoter cihazı, 3 adet buzdolabı, 10 adet tabure, 1 adet üroflowmetre, 1 adet kimyasal madde saklama dolabı, 1 adet buhar sterilizatörü, 1 adet hastabaşı monitörü, 1 adet buharlı sterilizatör (otoklav), 1 adet teleskop (5 mm 30 derece), 1 adet elektrokoter cihazı, 2 adet anestezi cihazı , 1 adet bataryalı sternum testeresi, 1 adet otomatik formaldehit dozajlama cihazı, 2 adet akülü şarjlı matkap, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet hd video endoskopi sistemi, 1 adet opak enjektör cihazı, 1 adet opak enjektör cihazı, 1 adet hasta paravan, 1 adet salon tipi klima, 45 adet, hastabaşı komidini , 1 adet hd video dudenoskop, 1 adet ultarince teleskop, 1 adet intraa-aortik balon pompası, 4 adet tekli koltuk/kanepes (sabit), 2 adet 6'lı masa takımı, 16 adet çalışma koltuğu, 2 adet ikili koltuk/kanepes (sabit), 2 adet otoskop oftalmoskop set (duvara monte), 1 adet abr (bera) cihazı, 1 adet üretero fiberskop, 1 adet radyocerrahi ünitesi, 1 adet videorinolaringoskop cihazı, 9 adet cerrahi alet setleri alınmıştır.

2021 yılında **Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı** kapsamında;

Hastane inşaatı 2021 yılı sonu itibarı ile %13 oranında olup 15 blok ve katlı otopark binası olarak temelleri yapılmıştır. Bloklarda toplam 119 tabliye olup bunun 62 sinin tabliyesi yapılmıştır. Katlı otopark binasında 5 tabliye olup tabliye dökülmemiştir. Bina inşaatı karkas inşaatın yanında toprak altı temel ve perdelerin su yalıtımı drenajları, ytong duvarları yapılmaktadır.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2021 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında;

Önceki yıllardan devreden 264 adet proje ve 2021 mali yılında desteklenen 143 adet proje ile birlikte 2021 mali yılında toplam 407 adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. bu projelerden 154 adedi tamamlanmış, 6 adedi iptal edilmiş ve 247 adet proje 2022 yılına devretmiş ve bu projeler için ; 1 adet web sitesi hazırlanması, 1 adet total aminoasit(41 parametre) metabolit 45 hasta x 45 kontrol x 20 parametre, 1 adet ir nem tayin cihazı, 1 adet dneasy powerwater kit 100 reaksiyon, 2 adet rna izolasyonu rneasy plus mini kiti (200 test), 1 adet kablosuz fetal izleme sistemi/doppler, 1 adet flow cell v3 600 cycle, 1 adet xf 10 24 mm f+ ois objektif, 0,20 mg rat için il-10 antikor, 0,20 mg rat için osteoprotegerin antikor, 0,20 mg 17 antibody, 1 adet sniffin sticks testi , 1 adet thermal cycler, 1 adet nebulizer assy , 1 adet 55 mm f2.8 r lm wr objektif, 1 adet mobil tabanlı gebelik ve doğumda uygulanan yoga eğitimi yazılımı, 1 adet marka yönetimi ve ürün tasarımı, 1 adet akademik teşvik ödeneği süreç yönetim sistemi, 1 adet maestro schrödinger bilgisayar programı, 1 adet x-t4 aynasız fotoğraf makinesi, 1 adet tek ışın yollu spektrofotometre, 0,10 mg rat için il-1 beta antikor, 0,10 mg rat için rankl antikor, 0,10 mg del-1 antibody, 1 adet pil kaplama cihazı, 1 adet distilasyon ünitesi, 1 adet veri tabanı alımı, 1 adet thermal cycler, 1 adet döner disk elektrot , 1 adet evaporatör vakum pompası ile 1 adet pet hayvanı davranış ve ses analiz modülü, 1 adet 3d yazıcı, 1 adet korneal cross-linking sistem, 1 adet dijital taramalı retina anjiyografi ile kombine optik koherans tomografi gibi belirtilen, malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2021 yılı içerisinde ; Eğitim, Sağlık ve Teknolojik Araştırma Projeleri için hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. Yatırım Uygulamaları

4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 51.049.000 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2020 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 7.000.000 TL olmuştur. 2021 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 11.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize likit karşılığı 6.000.000 TL ödenek kaydı yapılmış toplam bütçe ödeneği 17.000.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 16.775.637 TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 636.055.000 TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2020 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 129.941.000 TL olmuştur. 2021 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 75.000.000 TL hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı 34.000.000 TL ödenek kaydı eklenmiş. Toplam bütçe ödeneği 109.000.000 TL olmuştur. 2021 yılı sonu itibariyle 61.298.536 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 3.708.000 TL'dir. 2021 yılı yatırım programı kapsamında Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 3.708.000 TL ödenek tahmini yapılmıştır.

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması,
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması,
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması,
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

III- 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2021H03-168121 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2021 yılı yatırım programı kapsamında 200.000 TL ödenek öngörülmüş ve Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 200.000 TL harcama yapılmıştır.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2021 yılı yatırım programı kapsamında 750.000 TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödenekten üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, yerleşke asfaltı vb işler için 749.767 TL'si harcanmıştır.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

1.3- Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz detay programına göre 2 proje bulunmakta bu projeden Sivas Meslek Yüksekokulu inşaatı devam etmekte ve Kangal Köpeği Araştırma Merkezi inşaatına iz bütçe konularak başlanmamıştır.

a-)Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat: 2021 yılında 5.000.000 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde 5.000.000 TL eklenerek toplam bütçesi 10.000.000 TL olmuştur bu ödeneğin 9.873.852 TL'si harcanarak inşaatı devam etmektedir.

b-)Kangal Köpeği Araştırma Merkezi :1.000 TL İz Bütçe Konulmuştur.

Bu projenin toplam tutarı 35.300.000 TL olup, 2020 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 3.500.000 TL'dir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.4- Proje No: 2021H03-168234 Proje Adı: Muhtelif İşler

Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 816.000,00 TL'si hazine yardımı, 1.113.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 1.929.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 400.000 TL likit karşılığı olarak ödenek eklenerek toplam bütçesii 2.329.000 TL olmuştur. 2021 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 2.324.873 TL harcama gerçekleştirmiştir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 500.000 TL hazine yardımı karşılığı, 219.000 TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 719.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olmak üzere 300.000 TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 1.019.000 TL olmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Makine teçhizat alımları için 992.23 TL'lik harcama yapılmıştır.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 97 olmuştur.

Bilgi Teknolojileri


Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2021 yılında 1.400.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit karşılığı olarak 300.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 1.700.000 TL olmuştur. 2021 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 1.699.280 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

| Muhtelif İşler | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Harcama | Gerçekleşme Oranı % |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Rektörlük Büyük Onarım | 2.329.000 | 2.324.873 | 100 |
| Makine Teçhizat Alımı | 1.019.000 | 992.236 | 97 |
| Bilgi Teknolojileri | 1.700.000 | 1.699.280 | 100 |
| Toplam | 5.048.000 | 5.016.389 | 99 |



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

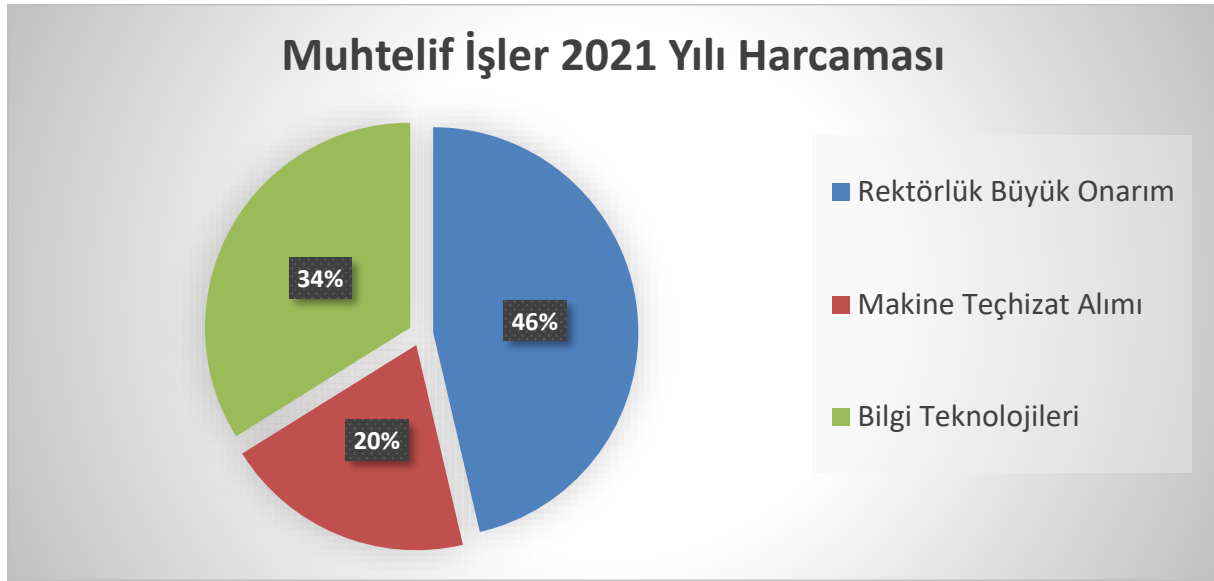

1.5- Proje No: 2021H03-168125 Proje Adı: Yayın Alımı


Üniversitemiz yayın alımları projesi için 2021 Yılı Yatırım Programında 1.000.000 TL ödenek öngörülmuş bu ödeneğin 935.630 TL'si harcanarak kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere elektronik kitap, elektronik dergi, süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı ve veri tabanı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 94 olmuştur.

| Eğitim Sektörü Projeler | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Harcama | Gerçekleşme Oranı % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000 | 200.000 | 100 |
| Kampus Alt Yapı | 750.000 | 749.767 | 100 |
| Derslik ve Merkezi Birimler | 10.000.000 | 9.873.852 | 99 |
| Muhtelif İşler | 5.048.000 | 5.016.38 | 99 |
| Yayın Alımı | 1.000.000 | 935.630 | 94 |
| Toplam | 16.998.00 | 16.775.638 | 99 |



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

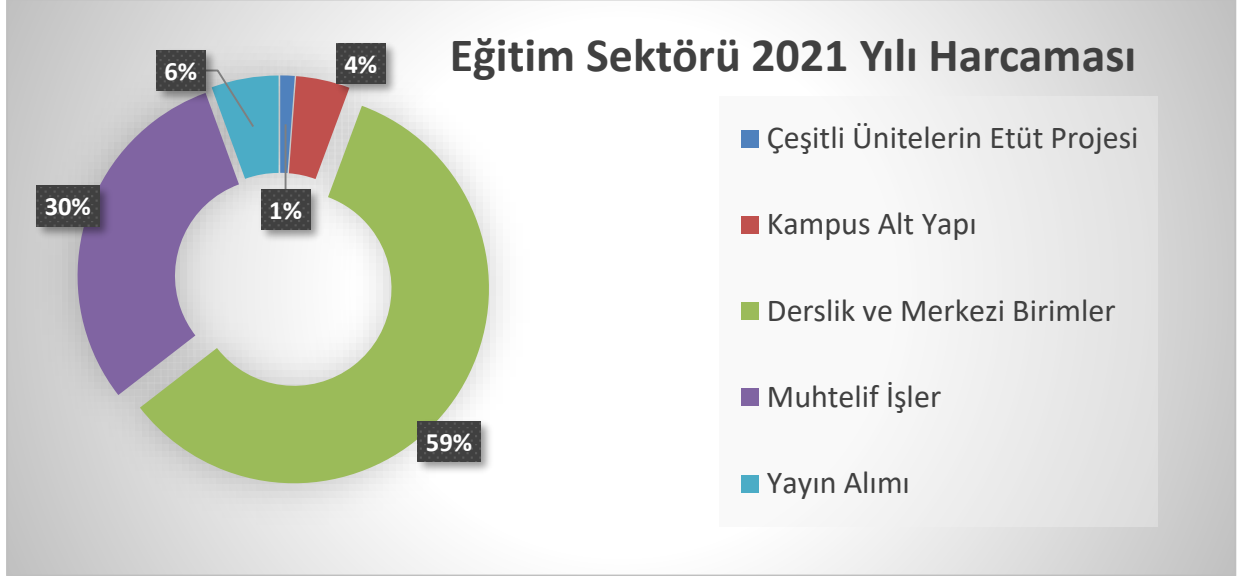

2. Sağlık Sektörü

2.1.Proje No: 2021I00-168567 Proje Adı: Muhtelif İşler

Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde hastane büyük onarım için, 4.000.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı içerisinde 1.000.000 TL Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesine aktarılarak toplam bütçesi 3.000.000 TL olmuştur bu ödeneğin 2.999.991 TL harcanarak hastanemizin ihtiyaç duyduğu bakım onarımlar gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 3.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı sonu itibarıyla hastane makine-teçhizat büyük onarımı için 2.993.332 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında mevcut hastanemiz için makine teçhizat alımları amacıyla 3.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 2.447.888 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 82 olmuştur.

2.2.Proje No:2015100-2383 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı bitirilmiş olup Makine-Teçhizat alımları devam etmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında 10.000.000 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde 1.000.000 TL Sağlık Muhtelif İşler projesine aktarılarak ve toplam bütçesi 11.000.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanarak hastane hizmetinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 121.355.000 TL. olup, 2020 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 104.355.000 TL'dir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

2.3. Proje no: 2019100-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi

Söz konusu proje kapsamında hastane inşaatı için; 55.000.000 TL ödenek öngörülmüş ve yıl içerisinde 34.000.000 TL eklenerek toplam bütçe ödeneği 89.000.000 TL olmuştur. Bu ödenekten 41.857.325 TL harcanarak 2021 yılında inşaatına devam edilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 504.700.000 TL. olup, 2020 yıl sonu kümülatif harcama tutarı. 25.586.000 TL'dir.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 48 olmuştur



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

3.1.Proje No: 2021K12-167779Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde Üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 3.708.000 TL ödenek tahmini yapılmış ve yıl içerisinde aktarımı yapılarak bilimsel proje desteklenmesi sağlanmıştır.

2021 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

IV-ÖNERİLER

- ✓ Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

| Proje Adı/ Tanıtımı | Kodu | Sektörü | Proje Başlangıç Tarihi | Proje Tamamlanma Tarihi | Proje Tutarı | 2020 yılı Kümülatif Harcama | 2021 Bütçesi | Eklenen | Düşülen | Toplam Bütçesi | 2021 Harcaması |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| HASTANE İNŞAATI | 2019I00-109658 | Sağlık | 2019 | 2024 | 504.700.000 | 25.586.000 | 55.000.000 | 34.000.000 | | 89.000.000 | 41.857.325 |
| KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ | 2015I00-2383 | Sağlık | 2015 | 2022 | 121.355.000 | 104.355.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | | 11.000.000 | 11.000.000 |
| İnşaat | 2015I00-2383-A | Sağlık | 2015 | 2019 | 92.355.000 | 92.355.000 | | | | 0 | |
| Makine ve Teçhizat | 2015I00-2383-B | Sağlık | 2015 | 2022 | 29.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | | 11.000.000 | 11.000.000 |
| MUHTELİF İŞLER | 2021I00-168567 | Sağlık | 2021 | 2021 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 1.000.000 | 9.000.000 | 8.441.211 |
| KAMPÜS ALTYAPISI* | 2020H03-152731 | Eğitim, Kültür | 2020 | 2022 | 10.500.000 | 3.500.000 | 750.000 | | | 750.000 | 749.767 |
| DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJELERİ* | 2003H03-651 | Eğitim, Kültür | 2003 | 2022 | 35.300.000 | 3.500.000 | 5.001.000 | 5.000.000 | | 10.001.000 | 9.873.852 |
| Kangal Köpeği Araştırma Merkezi | 2003H03-651-A | Eğitim, Kültür | 2017 | 2022 | 4.300.000 | | 1.000 | | | 1.000 | 0 |
| Sivas MYO | 2003H03-651-B | Eğitim, Kültür | 2020 | 2022 | 31.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 10.000.000 | 9.873.852 |
| YAYIN ALIM | 2021H03-168125 | Eğitim, Kültür | 2021 | 2021 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 935.630 |
| MUHTELİF İŞLER** | 2021H03-168234 | Eğitim, Kültür | 2021 | 2021 | 4.049.000 | | 4.049.000 | 1.000.000 | | 5.049.000 | 5.016.389 |
| ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | 2021H03-168121 | Eğitim, Kültür | 2021 | 2021 | 200.000 | | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 |
| REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | 2021K12-167779 | Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal | 2021 | 2021 | 3.708.000 | | 3.708.000 | | | 3.708.000 | 3.708.000 |
| TOPLAM | | | | | 690.812.000 | 136.941.000 | 89.708.000 | 41.000.000 | 1.000.000 | 129.708.000 | 81.782.173 |

*2021 Yılı Yatırım Programında 5.001.000 TL olarak çıkmış fakat 2021 yılı bütçe kanununda 5.002.000 TL ödenek verilmiştir.

**2021 Yılı Yatırım Programında 4.049.000 TL olarak çıkmış fakat 2021 yılı bütçe kanununda 4.048.000 TL ödenek verilmiştir
