



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**MART 2024
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör

İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	9
Prof. Dr. Alim YILDIZ	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME.....	11
1. Misyon ve Vizyon.....	11
Misyon	11
Vizyon	11
Temel İlkelerimiz.....	11
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	12
Stratejik Amaç 1	12
Stratejik Amaç 2	12
Stratejik Amaç 3	12
Stratejik Amaç 4	13
Stratejik Amaç 5.....	13
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	14
3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	14
3.2. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	15
4. Yatırım Uygulamaları	20
4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	20
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	20
III- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	21
1. Eğitim Sektörü	21
1.1- Proje No: 2023H03-211611 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	21
1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapısı	21
1.3- Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler.....	21
1.4- Proje No: 2023H03-211613 Proje Adı: Muhtelif İşler	21
1.5- Proje No: 2023H03-211609 Proje Adı: Yayın Alımı	23
2. Sağlık Sektörü	24
2.1. Proje No: 2023I00-192082 Proje Adı: Muhtelif İşler	24
2.2. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi	25
3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü	25
3.1. Proje No: 2023K12-192061 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	25
IV-ÖNERİLER	26



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kıyarak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınmamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2023 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %79'u Sağlık, %20'si Eğitim, %1'i Teknolojik Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

2023 yılı yatırım programı ile üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 218.859.000 TL ödenek öngörülmüş ve öz gelir (likit) karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden olmak üzere toplam 541.000.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 759.859.000 TL olmuştur. Ödeneğimizin 588.488.320 TL'si harcanmış, 171.370.680 TL si yılsonu itibarıyla harcanmamıştır. 2023 yılında nakdi gerçekleştirme oranı %77,44'tür.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışıyla milli ve manevi değerlerine bağlı, eleştirel düşünebilen, rekabet edebilen, insana ve doğaya karşı saygılı öğrenci ve akademisyen yetiştirmek; bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunacak başta sağlık, eğitim ve araştırma alanlarında olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmak.

Vizyon

Nitelikli eğitim ve araştırmalarla bölgemizin ve ülkemizin her açıdan gelişmesine ve kalkınmasına yön vermek.

Temel İlkelerimiz

- Çevre ve doğaya saygı
- Toplumsal sorunlara duyarlılık
- Eleştirel Düşünce
- Liyakat
- Etik değerlere bağlılık
- Öğrenci merkezlilik



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Ulusal ve Uluslararası Standartları Sağlayan Gelişime Açık, Rekabet Edebilen, Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Bulunmak

HEDEF 1.1: Çağın İhtiyaçları Doğrultusunda Nitelikli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Bulunmak,

HEDEF 1.2: Eğitim Öğretim Ortamlarının Fiziksel İmkânlarını Artırmak,

HEDEF 1.3: Öğretim Elemanlarının Yetkinliğini Artırmak,

HEDEF 1.4: Lisansüstü Öğrenci ve Öncelikli Alan Lisansüstü Program Sayısını Artırmak,

HEDEF 1.5: Akredite Olan Program Sayısını Artırmak.

Stratejik Amaç 2

Bilimsel Araştırma Odaklı Üniversite Kimliği Geliştirmek

HEDEF 2.1: Fiziki ve Teknolojik Araştırma Altyapısını Nicelik ve Nitelik Yönünden Güçlendirmek,

HEDEF 2.2: Nitelikli ve Etkin Araştırma Yapabilme Becerilerini Geliştirerek Proje Sayılarını Artırmak,

HEDEF 2.3: Patent ve Bilimsel Yayın Sayısını ve Niteliklerini Artırmak,

HEDEF 2.4: Öğrencilerimizin Akademik Araştırma Süreçlerine Katılımını Desteklemek.

Stratejik Amaç 3

İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Faaliyetlerinde Nitelik ve Niceliği Artırmak

HEDEF 3.1: Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kaliteyi Artırmak,

HEDEF 3.2: Sağlık Hizmeti Sunan Birimlerin Kendi Kendine Yetebilirliğini Artırmak,

HEDEF 3.3: Sağlık Turizmini Geliştirmek,

HEDEF 3.4: Çevre Sağlığı Okur-Yazarlığını Artırmak,

HEDEF 3.5: Hayvan Hakları Okur-Yazarlığın Artırılması.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Stratejik Amaç 4

Toplumsal Katkı Sağlamaya ve Sosyal Sorumluluğa Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Artırmak

HEDEF 4.1: Topluma Katkı Sağlamaya Yönelik Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Artırmak ve Paydaşların Katılım ve Katkılarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak,

HEDEF 4.2: Kamu, Üniversite, Sanayi ve Şehir İşbirliğini Artırarak Ulusal ve Bölgesel Faaliyetlere Öncü Olmak; Yeni İşbirliği Oluşturarak Toplumsal Fayda Sağlamak,

HEDEF 4.3: Üniversitenin Sağlık, Kültür, Sanat ve Spor ile İlgili Etkinliklerinde Topluma Dönük Yüzünün Geliştirilerek Sosyal Yaşama Sağladığı Katkırı Artırmak,

HEDEF 4.4: Yaşayan ve Yaşanabilir Kampüs Sayesinde Öğrenci, Çalışan ve Yerleşkeyi Kullanan Diğer Paydaşların Yaşam Kalitesini Artırmak,

HEDEF 4.5: Şiddetle ve Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Artırılması.

Stratejik Amaç 5

Gelişime Açık Sürdürülebilir Kurumsal Yapıyı Oluşturmak

HEDEF 5.1: İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemlerini Geliştirmek,

HEDEF 5.2: İnsan Kaynakları Yetkinliğini Artırmak ve Kurumsal Aidiyeti Geliştirmek,

HEDEF 5.3: Bilişim Donanım/Yazılım Altyapısını ve Kullanıcı Destek Hizmetlerini Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak,

HEDEF 5.4: Alt ve Üst Yapıyı Güçlendirmek.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuş ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir.

Üniversitemiz 127.965 m² kendi arazisi, 6.078.551m² hazinece tahsis edilen arazi, 39.525 m² üniversite vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 35 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Dış Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Köyü sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 200 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık Su Arıtma Tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

İdari hizmet alanları 59.721,19 m² eğitim hizmet alanları 91.018,07 m², sağlık alanları 140.539,81 m², beslenme alanları 25.217,66 m², kültür alanları 10.714,02 m², sosyal alanları 32.978,44 m², lojman alanları 25.420,00 m², diğer (depo, arşiv vb.) alanları 211.097,68 m², spor alanları 56.637,02 m², araştırma alanları 10.145,13 m² olmak üzere toplam 663.489,02 m² alana sahiptir.

305 Profesör, 273 Doçent, 439 Dr. Öğretim Görevlisi, 348 Öğretim Görevlisi, 524 Araştırma Görevlisi ve 3.428 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2023 yılı yatırım programında yer alan **Etüt Projesi** kapsamında; 14 binanın (Gürün MYO ve Ek Binası, Merkezi Kafeterya, BESYO, Lojmanlar A,N,O Blokları, Daire Başkanlıkları Binası A ve B Blokları, Personel Yemekhanesi, Koyulhisar Ek Binası, Şarkışla Aşık Veysel MYO Yurt Binası, Sivas Teknik Bilimler MYO D ve E Blok Binaları) deprem performans analizleri ve güçlendirme projeleri hazırlanmış ve Gürün MYO yeni bina inşaatı için mimari, statik, elektrik, mekanik hesaplamaları yapılmıştır.

2023 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi amacıyla **Kampus Altyapı Projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için; Hayvan Hastanesi ve Veteriner Fakültesi binaları çevresi yağmur suyu hattı yapımı, Enstitüler binası ve Konservatuar binası giriş yolları bazalt yapımı, Gençlik Merkezi önü yeni gidiş geliş ve kaldırımlı parke taşından yol yapımı, parke taşından otopark yapımı, yemekhane çevre aydınlatma yapımı, Veteriner Fakültesi çadırlar arası yaya yolu parke taşı yapımı, Kampüs içerisindeki muhtelif yerlere yangın dolabı yapımı, Yıldızeli MYO Binası önü parke yapımı, Suni çim saha etrafı parke taşı yapımı, Rektörlük Konutu önü kaldırımın baskı beton kaplama yapımı, A101 ve kafeleri arkası beton parke taşından kaldırım yapımı, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina trafosu güçlendirilmesi, Yıldızeli MYO su deposu yapımı ve kalorifer kazanının doğalgaza dönüşümü, Edebiyat Fakültesi A Binası kazan dairesi dönüşümü işleri yapılmıştır.

2023 yılında **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi** kapsamında Sivas MYO inşaatı tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

2023 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca;

1) CÜSEM Binası Altına Öğrenci Yemekhanesi Yapımı Kapsamında; CÜSEM binası altı derslik duvarları kaldırıldı, mutfak ve bulaşikhane, wc ve duş mahalleri oluşturuldu, ters tavan ve tamiratları yapıldı, komple duvar ve tavan boya yapıldı.

2) SCÜ Büyük Onarım İnşaatı İşi Kapsamında; Mediko tuvaletlerinin tadilatı yapımı, Suşehri Sağlık Yüksekokulu deposunun ikiye bölünmesi, Eczacılık Fakültesi giriş markizi, su deposunun kapatılması ve ayrı bir depo yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi basketbol ve voleybol sahası yapımı, Diş Hekimliği Fakültesi saçak tamirati, Sivas Teknik Bilimler MYO cam kapı ve ilave kapı işleri yapımı, Marangozhane ve Demiratölyesine ek bina yapımı, Veteriner Fakültesi hayvan hastanesi tarafı çıkışına markiz yapılmıştır.

3) SCÜ Binaların Doğalgaz Dönüşümü Kapsamında; Konservatuar binası, Spor Bilimleri Fakültesi binası, Enstitüler binası, Edebiyat Fakültesi B binası, Merkezi amfi binası ve Hamza Yerlikaya Spor Salonu olmak üzere 6 adet binanın doğalgaz dönüşümü yapılmıştır.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4) Kampüs ve İlçeler Onarım İhalesi Kapsamında; Yıldızeli MYO çevresine beton perde duvar yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi A ve B blokları girişine bazalt taşı ile kaplama yapımı, Personel Yemekhanesi giderlerine yağ ayırıcı takılması ve kanalizasyon hatlarının yeniden yapımı, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller Fakültesi yolları ve otoparkı parke taşı kaplama yapımı, İlahiyat Fakültesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesine çıkan yolun kenarlarına parke taşından kaldırım yapılması, Sivas Teknik Bilimler Fakültesi anayol girişi ve öğrenci yaya yolları parke taşı yapımı, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Fakültesi önü, etrafı ve bahçesi parke taşı kaplama yapılması, Edebiyat Fakültesi basamakları bazalt kaplama taşı yapımı ve yolları parke taşı kaplama yapılması, A101 ve kafeler önündeki anayol ortasına bordür ve parke taşından refüj yapımı gerçekleştirilmiştir.

5) CÜSEM Altı Yemekhane Onarım 2 İhalesi Kapsamında; Yemekhane tabanına 60x60 seramik kaplama yapılması, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık koridoruna halı kaplama yapılması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlık koridoruna ahşap laminat parke yapımı ve İşletme Bölümü hoca odaları koridoruna 60x120 seramik kaplama yapılmıştır.

6) Koyulhisar MYO Onarım İhalesi Kapsamında; Kazan dairesi ve kömürlük binaları yapımı, Kalorifer kazanının eski binadan çıkarılıp yeni yapılan kazan dairesine taşınması ve montajı gerçekleştirilmiştir.

7) Gençlik Merkezi Sinema Salonları Onarım İhalesi Kapsamında; 3 adet sinema salonunun taban koltuk gelen basamakları genişletildi, tabanları laminat parke kaplaması yapıldı, duvarları siyah ses yalıtım kumaşı ile kaplandı, ters tavan karopanlar sökülüp tavandaki klima ve diğer sistemler yükseltildi ve tavanlar siyah renge boyandı, gerekli yerler alçıpanla kapatıldı.

8) Kavşak Düzenleme Peyzaj İhalesi Kapsamında; Hilal Kapı girişinde ana nizamiye önündeki yeşil alana süs havuzları yapıldı, çevre yeşil alan kenar bordürleri yapıldı, yeşil alan ağaç dikimleri yapıldı, alana dolomit taşı, ponza taşı ve mıcır taşı döşendi.

9) Büyük Onarım 3 İhalesi Kapsamında; Personel Yemekhanesi mutfak kısmının iki girişine markiz yapıldı, yemekhane içindeki personel ve öğrenci tuvaletleri kapıları yenilendi, Eski Kültür Merkezi (100 yıl kültür merkezi) protokol salonu duvarları duvar kâğıdı kaplandı ve ahşap kapılara kapotene giydirmesi kaplaması yapıldı, Veteriner Fakültesi kantinden yangın çıkış kapısı kısmı alçıpan duvar ile ayrıldıktan sonra koridorlardaki karopan ters tavanların tamirata yapıldı ve fakülte binası çatısına karlık yapıldı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi personel tuvaletlerine 7 adet klozet yapıldı, Enstitüler binasında giriş katındaki iki oda büyütüldü ve mutfak kısmı tezgâhı ve dolabı yapıldı.

10) Gürün MYO Ek Bina Güçlendirme İşİ Kapsamında; Gürün ek binasının deprem performans analizi sonucu çıkan projesine göre güçlendirme betonarme perdeleri yapıldı.

11) Büyük Onarım Kapsamında Yapılan Diğer İşler; Mühendislik Fakültesi laboratuvarı boya, bölme odaları, üstü sac kapalı garaj, eski tuvaletlerinin laboratuvarlara katılımı, İletişim Fakültesi reji odaları yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi hoca odaları yapımı, İktisadi ve İdari Bilimler



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Fakültesi hoca odaları yapımı, 4 Eylül Kültür Merkezi çatı oluk ve karlık işleri yapımı, Tıp Fakültesi parazitoloji laboratuvarı tezgâh yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi yangın çıkış koridorlarının açılması ve dekan odası yapımı, Spor Bilimleri Fakültesi dekan odası yapımı ve alüminyum doğramadan güvenlik binası yapımı, İletişim Fakültesi dekan odası yapımı, Veteriner Fakültesi dekan odası yapımı, İlahiyat fakültesi dekan odası yapımı, Dış Hekimliği Fakültesi dekan odası yapımı, Misafirhane duvar kâğıdı yapımı, Misafirhane merdivenler tamiri, Divriği Nuri Demirağ MYO kanalizasyon basan mutfak kısmının tamir fayans boya işleri yapımı, Gürün MYO nun taşındığı eski Atatürk İlkokulu binalarının onarımı (iç, dış boya, wc ler fayans yapımı, kapı ve pencereler onarımı boyası, Kalorifer tesisatı yapımı, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı) yapımı, 26.11.2023 tarihinde ilimizde meydana gelen fırtınalardan dolayı üniversitemizdeki daire başkanlıkları A blok çatısı, Eski Sivas meslek binası E blok çatısı, Edebiyat fakültesi B binası polikarbon ışıklık çatısı, Lojmanlar açık otopark polikarbonları, Merkezi anfi giriş markizi polikarbonu ve Yemekhane 2 giriş markizi polikarbonları yapılmıştır.

2023 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca; Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 31 adet Telefon, 120 adet Bilgisayar, 16 adet Projeksiyon Cihazı, 2 adet Baskı Makinesi, 10 adet Lazer Yazıcı, 5 takım Makam Takımı, 5 adet Çalışma Koltuğu, 20 adet Misafir Koltuğu, 500 adet Klasör, 520 adet Temizlik Ürünü, 8 Kalem Büro Mobilyası, 1 adet Fotokopi Makinası, 1 adet Baskı Makinası, 231 adet Derslik Sırası, Arama Kurtarma Biriminin (CAK) İhtiyacı olan 8 Kalem malzeme alınmış ve Üniversitemiz Özel Güvenlik Giyimi ve Çevre Birimi için İş Kıyafeti Alım ihalesi, Akülü Zemin Yıkama Makinası ve Paspas Alımı ihalesi, 2024 Yılı Öğlen Yemeği Üretimi Dağıtım Servisi ile Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmeti Alımı İhalesi, Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında öz gelir karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; 5 adet Projeksiyon, 4 adet Taşınabilir Bilgisayar, 1 adet Buhar Kazanlı Ütü 10 adet DI Box Mono, 10 adet IN EAR Kulaklık Preamfisi, 1 adet Buzdolabı, 1 adet Bulaşık Makinesi, 1 adet Zemin Yıkama Makinesi, 2 adet Benzinli Çim Biçme Makinesi, 1 adet Canlı Yayın Mikseri alımı gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca **Bilgi Teknolojileri** alımları kapsamında; 58 adet Switch, 12 adet Endüstriyel Adaptör, 2 adet Djital Video Kayıt Cihazı, 20 adet Analog Kamera, 64 adet Dış Ortam Güvenlik Kamerası, 5.205 metre UTP Cat6 Kablo, 1.085 metre Elektrik Kablosu, 644 metre Coax Kablo, 54 adet IP Telefon Cihazı, 11 adet IP Dect El Ünitesi, 2 adet IP Dect Baz İstasyonu, 300 adet SSD Disk, 60 adet Bellek, 150 adet DDR 3 Ram, 60 adet MSI Adaptör, 15 adet MSI Fan, 300 metre Mavi Kangal Boru, 2 adet Levha Sac Alımı, 1 adet Canlı Yayın Stüdyo Kamera Seti Alımı, 2.800 metre Fiber Kablo Alımı, 6 adet Kamera Direği Alımı, 10 adet GBIC Modül, 5 Takım Araç Yedek Parça Alımı, 192 adet Kesintisiz Güç Kaynağı Aküsü, 1 adet Otopark Bariyeri Alımı, 20 adet Projeksiyon Cihazı, 20 adet Projeksiyon Askı Aparatı Alımı, 2 adet Kabinet Alımı, 1 adet Kesintisiz Güç Kaynağı, 5 adet Monitör, 5 adet Masa Üstü Bilgisayar, 38 adet Mini Kart Okuyucu, 221 adet 3 Yıllık Nitelikli



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Elektronik Sertifika, 1 adet 1 Yıllık Elektronik Mühür, 1 adet PROLİZ Öğrenci ve Personel Otomasyonu İşleri Yazılımı Bakım ve Destek Hizmeti Alımı, 1 adet AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, 1 adet YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi Güncellenmiş Sürümü Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet Kütüphane Kitap Cihaz Okuyucu Alımı, 1 adet DİYOS E-ihale Süreçleri Yönetim Yazılımı Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet SİNERJİ Hukuk Programları Alımı, 1 adet CBK-ENVISION EBYS Yazılımı Revizyon ve Güncelleme Hizmeti Alımı, 1 adet Keyps Alımı, 1 adet Kamutech İşçi Bordro Programı Alımı, 1 adet Sanal Sınıf Sistemi Alımı, 1 adet IP Telefon Yönetim Yazılımı, 1 adet Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması, 1 adet Ağ Giriş Kontrol Sistemi Alımı, 1 adet Teamviewer Yazılımının Güncellenmiş Sürümü Kullanım Hakkı, 4.000.000 adet Toplu Kısa Mesaj Servisi Kontör Alımı, 1 adet Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi Programı Lisansı (AVESİS) Alımı, 1 adet Veeam Backup Alımı, 1 adet Drone (İnsansız) Hava Aracı Alımı, 1 Adet YÖK Mutabakat Modülü Alımı, 1 adet CAD VE GBS Yazılımlarının Alımı, 1 adet Globalsign SSL Dijital Sertifikaların Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları Projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır.

2023 yılı içerisinde; dergi kategorisinden 45.901 adet Fasikül Süreli Yayın, Merkezi Kütüphanemizde 113.198 diğer Fakülte/Yüksekokul/Yüksekokulları 80.889 toplamda 194.096 basılı kitap ile 100.000+ e-dergi, 4.500.000+ e-kitap ve 8.612 kayıtlı tez bulunmaktadır. Veri Tabanı aboneliği ise; (TÜBİTAK ve Üniversite) 18+13=31'dir

2023 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamı için ayrılan ödeneklerle; 3 adet Telsiz Telefon, 1 adet Sıralı Pnömatik Kompresyon Cihazı, 30 adet Acer LED/LCD Monitor, 12 adet Asus Masaüstü Bilgisayar, 1 adet Video Laringoskop Cihazı, 1 adet Elektronik/Pnömatik Turnike Cihazı, 1 adet Profesyonel Koşu Bandı, 1 adet HP LED/LCD Monitör, 1 adet HP Thin Client İnce İstemci, 1 adet Duvar Tipi Klima 1 adet Şok Dalga Tedavisi (ESWT) Cihazı, 1 adet 64 Kanal NVR Cihazı, 1 adet 128 Kanal NVR Cihazı, 1 adet 128 Kanal NVR Cihazı Tip 1, 1 adet Teleskop, 1 adet Doku Takip Cihazı, 1 adet Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı, 4 adet Endoskop Yıkama ve Dezanfej-Kasiyon Cihazı, 1 adet Yarı Motorize Frozen Cihazı, 1 adet Vakum Santrali, 2 adet Kimyasal Hava Kurutucu Cihazı, 35 adet Oksijen Tüpü (5 LT), 35 adet Oksijen Tüpü (10 LT), 1 adet Göğüs Cerrahisi Ameliyathane Cerrahi Seti, 1 adet KBB Poliklinik El Aletleri ve Cerrahi Seti, 6 adet Hemodiyaliz Cihazı, 6 adet Ritim Holter, 6 adet Taşınabilir Kan Basınç Monitörü (Tansiyon Holter), 1 adet Klinik Tip Yüksek Frekans Timpanometre, 3 adet KBB Muayene Ünitesi, 1 adet Klinik Tip Yüksek Frekans Odyometre Cihazı, 1 adet 1. Kısım Ameliyathane Seti, 1 adet 2. Kısım Ameliyathane Seti alımları gerçekleşmiştir.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2023 yılında **Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde;

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için; giriş cephesi boyunca (ambulans yolu) markiz yapımı, cephe yağmursuyu olukları yapımı, trafo binası arası yol kısmında bozuk olan bazalt kaplama sökölüp parke taşı kaplaması yapımı, kanalizasyon hat tamiri yapılmıştır.

Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi için; etrafı çevre düzenleme kapsamında kaldırım, refüj, bordür ve parke taşı döşeme işleri yapımı, 2 adet terasın yalıtımları yenilenip yağmur suyu hatları yenilenmesi, Yanık Bölümü ve Acil Personel girişlerine alüminyum doğrama kapılar yapımı, 2. katta 5 odaya ters tavan karopan kaplaması yapımı, boyler alımı, çatısı bakım ve onarımı, Hastane Derslikler Binası girişi kompozit kaplaması, ısı yalıtım levhaları yapımı ile mutfak kısmındaki taban gider kanalları yenileme işi, mutfak tabanları seramik kaplama işi, elektrik tesisatı yenileme işi, doğalgaz hatları yenileme işi, havalandırma kanalları yenileme işi, iç kapılar alüminyum doğrama yapım işi gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında **Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı** kapsamında; Yeni Hastane inşaatı 2023 yılı sonu itibarı ile % 51'lerde olup 15 blok ve katlı otopark binası olarak kaba (betonarme karkas, duvar ve çatı)inşaatı bitmiştir. İnşaat ince işleri olarak dış cephe kaplamaları, sıva, boya, şap, ters tavanlar, seramik ve mermer işleri, elektrik işleri (kablo, trafo, aydınlatma) sıhhi tesisat(temiz su, pisu, ısıtma, havalandırma imalatları) devam etmektedir. İnşaat dış kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılmakta ve çevre düzenleme işleri devam etmektedir.

2023 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında;Önceki yıllardan devreden 259 adet proje ve 2023 mali yılında desteklenen 112 adet proje ile birlikte 2023 mali yılında toplam 371 adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 154 adedi tamamlanmış, yıl içinde 2 adet proje iptal edilmiştir. 216 adet proje 2024 yılına devretmiş ve bu projeler için; 1 adet DSLR Fotoğraf Makinesi,1 adet Makro Lens, 1 adet Real-Time PCR Cihazı, 1 adet Yatay Derin Dondurucu, 1 adet Isıtmalı Yatak, 1 adet Ameliyathane Masası Üstü İçin Sıcak Hava Üflemleri hasta ısıtma cihazı, 1 adet Lazer Işın Görüntüleyici, 1 adet Sonik Aktivasyon Cihazı, 1 adet Dijital Mamografi Cihazı, 2 adet Premium Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi, 1 adet Dental Loop, 1 adet Yüksek Safılık Gaz Azot Jeneratörü, 1 adet Lidar Sensör, 1 adet Kuru Blok Isıtıcı, 1 adet Su Distile Cihazı, 1 adet Ultrasonik Aktivasyon Cihazı, 1 adet Elektrikli Pulpa Testi, 1 adet Videomediastinokopi Seti, 1 adet UV-Visible Spektrofotometre, 1 adet Veteriner Amaçlı Röntgen Cihazı, 1 adet Biyomikroskop, 1 adet Ünit,Foreopter, 1 adet Otorefraktometre, 1 adet Keratometre, 1 adet Nonkontakt Pakimetre, 2 adet LCD Chart Projektör, 2 adet EKG Ölçüm Cihazı, 8 adet WiFi/BLE/UWB Geliştirme Kartı, 1 adet Denge ölçüm sistemi, 1 adet Baskı Makinesi, 4 adet Erkek-Kadın Kateterizasyon Simülatörü, 3 adet Nagozastrik Tüp Besleme Paketi, 4 adet İntravenöz Kol Enjeksiyon Maketi, 1 adet UV-VIS Spektrofotometre gibi malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2023 yılı içerisinde ; Eğitim, Sağlık ve Teknolojik Araştırma Projeleri için hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. Yatırım Uygulamaları

4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 104.250.000 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2022 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 54.050.000 TL olmuştur. 2023 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 50.200.000 TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize likit karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 100.000.000 TL ödenek kaydı yapılmış toplam bütçe ödeneği 150.200.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 103.203.455 TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 756.126.520 TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2022 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 264.126.520 TL olmuştur. 2023 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 160.000.000 TL hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 441.000.000 TL ödenek kaydı eklenmiş. Toplam bütçe ödeneği 601.000.000 TL olmuştur. 2023 yılı sonu itibariyle 476.625.865 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 8.659.000 TL'dir. 2023 yılı yatırım programı kapsamında Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 8.659.000 TL ödenek tahmini yapılmıştır.

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması,
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması,
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması,
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

III- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2023H03-211611 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2023 yılı yatırım programı kapsamında 100.000 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde kurumiçi aktarma ile 4.800.000 TL ödenek aktarılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 4.900.000 TL olmuştur. Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için yıl içerisinde 2.446.020,40 TL TL harcama yapılmıştır.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 49,92 olmuştur.

1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapısı

Söz konusu proje için 2023 yılı yatırım programı kapsamında 5.000.000 TL ödenek verilmiş ve yıl içerisinde 2.500.000 TL eklenerek toplam bütçesi 7.500.000 TL olmuştur. Bu ödenekten yıl içerisinde üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, yerleşke asfaltı vb. işleri için 7.314.921,18 TL'si harcanmıştır.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 97,53 olmuştur.

1.3- Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaatı için; 2023 yılında 35.000.000 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde 8.500.000 TL ödenek düşülmüştür. Toplam bütçesi 26.500.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneğin 26.410.591,21 TL'si harcanmıştır. Proje tamamlanmış , geçici kabulü yapılmıştır.

Bu projenin sözleşme tutarı KDV hariç 22.445.960 TL olup, 2023 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 97.260.263 TL'dir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.4- Proje No: 2023H03-211613 Proje Adı: Muhtelif İşler

Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 1.000.000,00 TL'si hazine yardımı, 1.909.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 2.909.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 71.450.000 TL ödenek eklenerek toplam bütçesi 74.359.000 TL olmuştur. 2023 yılı sonu itibariyle üniversitemiz detay programına göre rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 31.820.940,26 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 42,93 olmuştur.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.000.000 TL hazine yardımı karşılığı, 500.000 TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 19.600.000 TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 21.100.000 TL olmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Makine teçhizat alımları için 20.918.655,23 TL'lik harcama yapılmıştır.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99,14 olmuştur.

Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2023 yılında 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 3.000.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 5.500.000 TL olmuştur. 2023 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanımı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 5.257.578,59 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 95,59 olmuştur.

Makine Teçhizat Büyük Onarım

Üniversitemiz Makine Teçhizat Büyük Onarımı Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2023 yılında 609.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 4.650.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 5.259.000 TL olmuştur. 2023 yılı sonu itibariyle bu ödenekten makine teçhizat büyük onarım giderleri için 4.072.859,75 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 77,44 olmuştur.

Hammadde Alımları


Üniversitemiz Hammadde Alımları Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2023 yılında özgelir karşılığı 82.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde hazine yardımı karşılığı 2.500.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 2.582.000 TL olmuştur. 2023 yılı sonu itibariyle bu ödenekten hammadde alımları için 2.464.104,25 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 95,43 olmuştur.

Muhtelif İşler	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	74.359.000	31.820.940	42
Makine Teçhizat Alımı	21.100.000	20.918.655	99
Bilgi Teknolojileri	5.500.000	5.257.578	95
Makine Teçhizat Büyük Onarım	5.259.000	4.072.859	77
Hammadde Alımları	2.582.000	2.464.104	95
Toplam	108.800.00	64.534.138	59



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

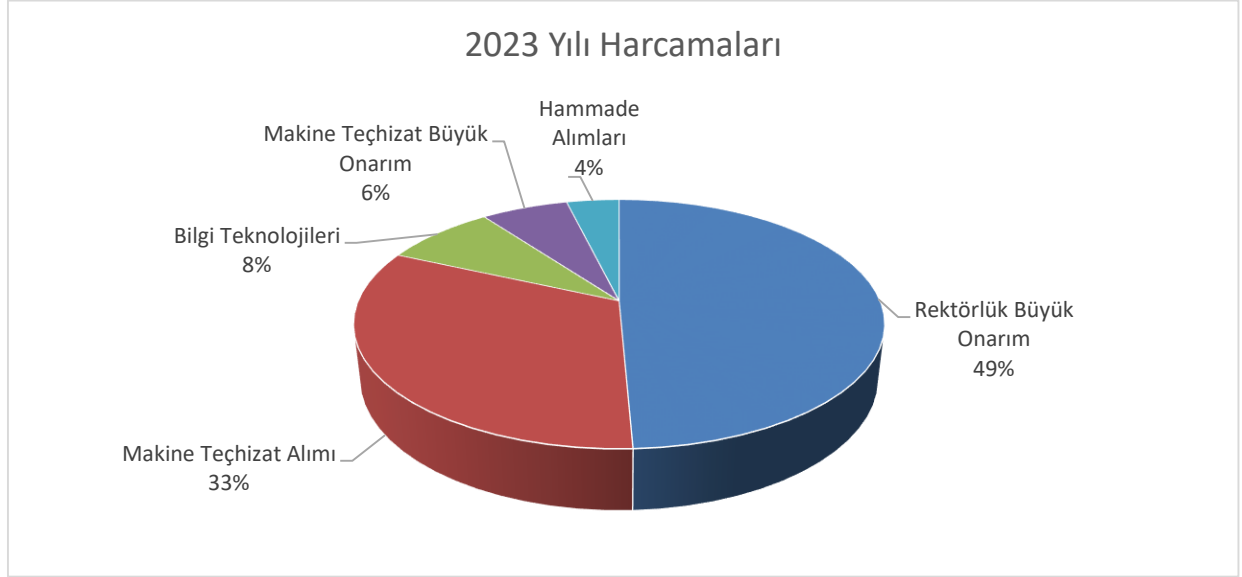

1.5- Proje No: 2023H03-211609 Proje Adı: Yayın Alımı


Üniversitemiz yayın alımları projesi için 2023 Yılı Yatırım Programında 2.500.000 TL ödenek öngörülmüş bu ödeneğin 2.497.785,55 TL'si harcanarak kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere elektronik kitap, elektronik dergi, süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı ve veri tabanı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99,99 olmuştur.

Eğitim Sektörü Projeler	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	4.900.000	2.446.020	50
Kampus Alt Yapı	7.500.000	7.314.921	98
Derslik ve Merkezi Birimler	26.500.000	26.410.590	100
Muhtelif İşler	108.800.000	64.534.138	59
Yayın Alımı	2.500.000	2.497.785	100
Toplam	150.200.000	103.203.455	69



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

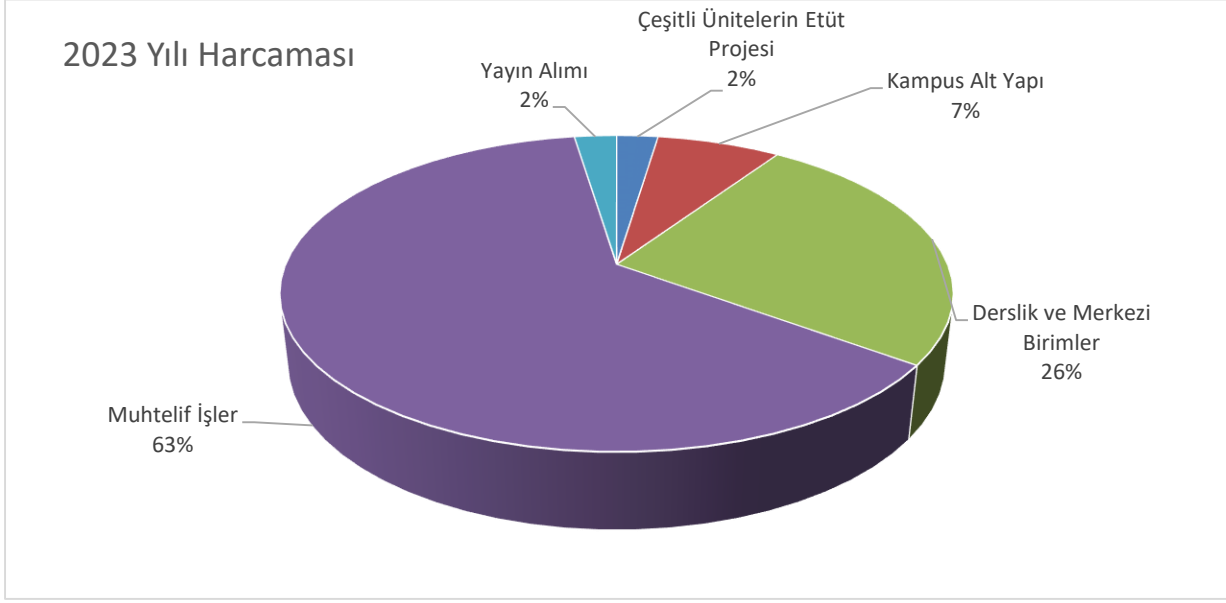

2. Sağlık Sektörü

2.1. Proje No: 2023I00-192082 Proje Adı: Muhtelif İşler

Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde hastane büyük onarımı için, 5.000.00.000 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 4.965.818,94 TL' si harcanarak hastanemizin ihtiyaç duyduğu bakım onarımlar gerçekleşmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 3.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı sonu itibariyle hastane makine-teçhizat büyük onarımı için 2.935.792,32 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında mevcut hastanemiz için makine teçhizat alımları amacıyla 17.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 22.000.000 TL eklenerek toplam bütçe ödeneği 2023 yılı için 39.000.000 TL olmuş ve yılsonu itibariyle 15.091.240,31 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 38,69 olmuştur.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.2. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi

Söz konusu proje kapsamında hastane inşaatı için; 135.000.000 TL ödenek öngörülmüş ve yıl içerisinde 19.000.000 TL Likit Karşılığı eklenmiştir. Yedek ödenekten 400.000.00 TL ödenek aktarılmış, toplam bütçe ödeneği 554.000.000 TL olmuştur. Bu ödenekten 453.633.012,71 TL harcanarak 2023 yılında inşaatına devam edilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 2.614.483.232 TL olup, 2023 yıl sonu kümülatif harcama tutarı 1.414472.232 TL'dir.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 81,18 olmuştur



3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

3.1. Proje No: 2023K12-192061 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 8.659.000 TL ödenek tahmini yapılmış ve yıl içerisinde aktarımı yapılarak bilimsel proje desteklenmesi sağlanmıştır.

2023 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV-ÖNERİLER

- ✓ Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

2023 Yılı Üniversitemiz Yatırımları Özet Tablosu

Proje Adı/ Tanıtımı	Kodu	Sektörü	İlçe	Proje Başlangıç Tarihi	Proje Tamamlanma Tarihi	Proje Durumu	Proje Tutarı/Maliyeti	2022 yılı Kümülatif Harcama	2023 Bütçesi	Eklene	Düşülen	Toplam Bütçesi	2023 Harcaması
HASTANE İNŞAATI	2019I00- 109658	Sağlık	Merkez	2019	2025	DevamEdiyor	729.126.520	264.126.520	135.000.000	419.000.000	0	554.000.000	453.633.013
MUHTELİF İŞLER	2023I00- 193117	Sağlık	Merkez	2023	2023	Tamamlandı	27.000.000	0	25.000.000	22.000.000	0	47.000.000	22.992.852
KAMPÜS ALTYAPISI	2020H03- 152731	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2020	2023	DevamEdiyor	22.250.000	12.250.000	10.000.000	0	2.500.000	7.500.000	7.314.921
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJELERİ	2003H03- 651	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2003	2023	DevamEdiyor	71.800.000	41.800.000	30.000.000	0	3.500.000	26.500.000	26.410.590
Sivas MYO	2003H03- 651	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2020	2023	Tamamlandı	71.800.000	41.800.000	30.000.000	0	3.500.000	26.500.000	26.410.590
YAYIN ALIMI	2023H03- 211609	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2023	2023	Tamamlandı	2.500.000	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.497.786
MUHTELİF İŞLER	2023H03- 211613	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2023	2023	Tamamlandı	7.500.000	0	7.500.000	178.450.000	77.250.000	108.700.000	64.534.138
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	2023H03- 211611	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2023	2023	Tamamlandı	200.000	0	200.000	4.800.000	0	5.000.000	2.446.020
REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	2023K12- 192061	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	Merkez	2023	2023	Tamamlandı	8.659.000	0	8.659.000	0	0	8.659.000	8.659.000
TOPLAM							869.035.520	318.176.520	218.859.000	624.250.000	83.250.000	759.859.000	588.488.320
