



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**MART 2025
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL
Rektör

İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	9
Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME.....	11
1. Misyon ve Vizyon.....	11
Misyon	11
Vizyon	11
Temel İlkelerimiz.....	11
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	12
Stratejik Amaç 1	12
Stratejik Amaç 2	12
Stratejik Amaç 3	12
Stratejik Amaç 4	13
Stratejik Amaç 5.....	13
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	14
3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	14
3.2. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	15
4. Yatırım Uygulamaları	19
4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	19
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	19
III- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	20
1. Eğitim Sektörü	20
1.1- Proje No: 2024H03-233346 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	20
1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampüs Alt Yapısı	20
1.3- Proje No: 2024H03-234210 Proje Adı: Büyük Onarım	20
1.4- Proje No: 2024H03-233348 Proje Adı: Muhtelif İşler	20
1.5- Proje No: 2024H03-233344 Proje Adı: Yayın Alımı	22
2. Sağlık Sektörü	23
2.1. Proje No: 2024I00-219848 Proje Adı: Muhtelif İşler	23
2.2. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi	24
3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü	24
3.1. Proje No: 2024K12-234051 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	24
3.2. Proje No: 2024K12-234049 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	24
IV-ÖNERİLER	25



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısararak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2024 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %84'ü Sağlık, %15'i Eğitim, %1'i Teknolojik Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

2024 yılı yatırım programı ile üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 833.183.000 TL ödenek öngörülmüş ve özgelir (likit) karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden olmak üzere toplam 321.999.800 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 1.155.182.800 TL olmuştur. Ödeneğimizin 1.132.084.339 TL'si harcanmış, 23.098.460 TL si yıl sonu itibariyle harcanamamıştır. 2024 yılında nakdi gerçekleşme oranı %98'dir.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL
Rektör



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışıyla milli ve manevi değerlerine bağlı, eleştirel düşünebilen, rekabet edebilen, insana ve doğaya karşı saygılı öğrenci ve akademisyen yetiştirmek; bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunacak başta sağlık, eğitim ve araştırma alanlarında olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmak.

Vizyon

Nitelikli eğitim ve araştırmalarla bölgemizin ve ülkemizin her açıdan gelişmesine ve kalkınmasına yön vermek.

Temel İlkelerimiz

- Çevre ve doğaya saygı
- Toplumsal sorunlara duyarlılık
- Eleştirel Düşünce
- Liyakat
- Etik değerlere bağlılık
- Öğrenci merkezlilik



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Ulusal ve Uluslararası Standartları Sağlayan Gelişime Açık, Rekabet Edebilen, Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Bulunmak

HEDEF 1.1: Çağın İhtiyaçları Doğrultusunda Nitelikli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Bulunmak,

HEDEF 1.2: Eğitim Öğretim Ortamlarının Fiziksel İmkânlarını Artırmak,

HEDEF 1.3: Öğretim Elemanlarının Yetkinliğini Artırmak,

HEDEF 1.4: Lisansüstü Öğrenci ve Öncelikli Alan Lisansüstü Program Sayısını Artırmak,

HEDEF 1.5: Akredite Olan Program Sayısını Artırmak.

Stratejik Amaç 2

Bilimsel Araştırma Odaklı Üniversite Kimliği Geliştirmek

HEDEF 2.1: Fiziki ve Teknolojik Araştırma Altyapısını Nicelik ve Nitelik Yönünden Güçlendirmek,

HEDEF 2.2: Nitelikli ve Etkin Araştırma Yapabilme Becerilerini Geliştirerek Proje Sayılarını Artırmak,

HEDEF 2.3: Patent ve Bilimsel Yayın Sayısını ve Niteliklerini Artırmak,

HEDEF 2.4: Öğrencilerimizin Akademik Araştırma Süreçlerine Katılımını Desteklemek.

Stratejik Amaç 3

İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Faaliyetlerinde Nitelik ve Niceliği Artırmak

HEDEF 3.1: Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kaliteyi Artırmak,

HEDEF 3.2: Sağlık Hizmeti Sunan Birimlerin Kendi Kendine Yeterliliklerini Artırmak,

HEDEF 3.3: Sağlık Turizmini Geliştirmek,

HEDEF 3.4: Çevre Sağlığı Okur-Yazarlığını Artırmak,

HEDEF 3.5: Hayvan Hakları Okur-Yazarlığın Artırılması.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Stratejik Amaç 4

Toplumsal Katkı Sağlamaya ve Sosyal Sorumluluğa Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Artırmak

HEDEF 4.1: Topluma Katkı Sağlamaya Yönelik Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Artırmak ve Paydaşların Katılım ve Katkılarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak,

HEDEF 4.2: Kamu, Üniversite, Sanayi ve Şehir İşbirliğini Artırarak Ulusal ve Bölgesel Faaliyetlere Öncü Olmak; Yeni İşbirliği Oluşturarak Toplumsal Fayda Sağlamak,

HEDEF 4.3: Üniversitenin Sağlık, Kültür, Sanat ve Spor ile İlgili Etkinliklerinde Topluma Dönük Yüzünün Geliştirilerek Sosyal Yaşama Sağladığı Katkırı Artırmak,

HEDEF 4.4: Yaşayan ve Yaşanabilir Kampüs Sayesinde Öğrenci, Çalışan ve Yerleşkeyi Kullanan Diğer Paydaşların Yaşam Kalitesini Artırmak,

HEDEF 4.5: Şiddetle ve Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Artırılması.

Stratejik Amaç 5

Gelişime Açık Sürdürülebilir Kurumsal Yapıyı Oluşturmak

HEDEF 5.1: İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemlerini Geliştirmek,

HEDEF 5.2: İnsan Kaynakları Yetkinliğini Artırmak ve Kurumsal Aidiyeti Geliştirmek,

HEDEF 5.3: Bilişim Donanım/Yazılım Altyapısını ve Kullanıcı Destek Hizmetlerini Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak,

HEDEF 5.4: Alt ve Üst Yapıyı Güçlendirmek.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuş ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir.

Üniversitemiz 127.965 m² kendi arazisi, 6.078.551m² hazinece tahsis edilen arazi, 39.525 m² üniversite vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 37 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Dış Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Köyü sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 200 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampüs ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık Su Arıtma Tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

İdari hizmet alanları 59.721,19 m² eğitim hizmet alanları 91.018,07 m², sağlık alanları 140.539,81 m², beslenme alanları 25.217,66 m², kültür alanları 10.714,02 m², sosyal alanları 32.978,44 m², lojman alanları 25.420,00 m², diğer (depo, arşiv vb.) alanları 211.097,68 m², spor alanları 56.637,02 m², araştırma alanları 10.145,13 m² olmak üzere toplam 663.489,02 m² alana sahiptir.

349 Profesör, 310 Doçent, 427 Dr. Öğretim Üyesi, 338 Öğretim Görevlisi, 456 Araştırma Görevlisi, 3.529 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2024 yılında **Eğitim Sektörü Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi** kapsamında; Hukuk Fakültesi Binası Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme Projesi yapımı ile Perseonel Yemekhanesi inşaatı için mimari, statik, elektrik, mekanik hesaplamalar yapılmıştır.

2024 yılında **Eğitim Sektörü Kampus Altyapı Projesi** kapsamında; üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için;

- Eski yıkılan kız yurdunun yerinin düzenlenip beton kilit parke döşenerek 165 araçlık otopark yapılması ve poliklinik önü yolda kavşak düzenlemesi yapılmıştır.
- Tıp fakültesi önü (kadın doğum hastanesine bakan kısım) genişletilip düzenlenerek beton kilit parke taşı döşenerek otopark yapılmıştır.
- Tıp fakültesi binası bina aralarının iki adet düzenlenip beton kilitli parke döşenerek otopark yapılmıştır.
- Tenis kortlarının bulunduğu alanda bulunan beton tribünlerinin yenilenerek düzenlenmesi ve antrenman duvarı yapılması, kapalı tenis kortunun sehimleyen çadırın onarılması, Kapalı halı sahanın üst havalandırma çatı kısmının onarılması yapılmıştır.
- Edebiyat fakültesi girişi ve yukarıdaki yaya yolu bazalt kaplaması yapılması, merdivenlerin üstüne markiz yapılmıştır.
- İleri Teknoloji Araştırma Merkezi , Diş Hekimliği önü, CÜSEM –İktisat Fakültesi önü ,15 Temmuz Spor Salonu arkası , İlahiyat Fakültesi arkası-anayol arası ve lojmanlar D-E bloklar kanalizasyon hatları yapılmıştır.
- Cumhuriyet MYO kazan dairesi dönüşümü yapılmıştır.
- Rektörlük önündeki gölet alanının sulama sistemi ve su deposu yapılmıştır.
- SCÜ Göleti'nin aydınlatma işi yapılmıştır.
- İmranlı MYO yeni yapılan bina etrafı çevre duvarı ve okul bahçesi parke taşı düzenleme işleri yapılmıştır.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2024 yılında **Eğitim Sektörü Büyük Onarım Projesi** kapsamında;

- Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası D ve E blokları daire başkanlıklarına uygun hale getirilmesi için; mevcut duvarlar, ters tavanlar, sıralar ve tezgâhlar sökülüştür. Yeni projeye göre duvar imalatları, ters tavan, taban seramik ve laminatları, kapıları ve alçı-boya işleri yapılmıştır.
- Hukuk Fakültesi binasının güçlendirilmesi amacıyla perde duvar gelen yerlerinin duvarları yıkılıp bütün katların betonarme perde duvarları yapılmış ince seramik, laminat, kapı ters tavan ve elektrik işleri yapılmıştır.
- Öğrenci Yemekhanesi İnşaatının yapımına başlanmıştır.
- Dış Hekimliği Fakültesinde muayene alanlarına dış üniteleri yapılmıştır.
- Gürün Meslek Yüksekokulu inşaatı bitirilerek çevre düzenleme işleri yapılmıştır.

2024 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca; Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 20 adet Bilgisayar, 3 adet Projeksiyon Cihazı, 2 adet Barok Makinesi, 12 adet Lazer Yazıcı, 15 adet Çalışma Koltuğu, 40 adet Misafir Koltuğu, 15 adet Masa Takımı alımları gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca **Bilgi Teknolojileri** alımları kapsamında; 1 adet Dell Emc PowerStore Yedekleme Ünitesi (Storage) Alımı, 10 adet All-in-One PC alımı, 20 adet Projeksiyon Alımı, 2 adet LED TV Alımı, 2 adet Otopark Bariyeri Alımı, 1 adet HGS Bariyeri Alımı, 1 adet Konferans Salonu Ses Sistemi Seti Alımı, 12 adet Oracle ZFS Storage Disk Alımı, 4 adet IP Telefon Alımı, 2 adet IP Telefon Baz İstasyonu Alımı, 4 adet Elektrik Panosu Alımı, 10 adet Klavye Alımı, 10 adet Mouse Alımı, 10 adet Notebook için Power Kablosu Alımı, 5 adet USB Yazıcı Kablosu Alımı, 5 adet Notebook Adaptör Alımı, 1 adet SSD Disk Alımı, 2 adet HDMI Kablo Alımı, 1 adet ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası Hizmet Alımı, 20000 adet Öğrenci/Personel Kurumsal Kimlikkart Basım Hizmeti Alımı, 1 adet Elektronik Mühür Sertifikası, 224 adet Nitelikli Elektronik İmza Sertifikası, 1 adet PROLİZ Öğrenci ve Personel Otomasyonu İşleri Yazılımı Bakım ve Destek Hizmeti Alımı, 1 adet DİYOS İhale Süreçleri Yönetim Otomasyonu Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet AMP Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet AVESİS Akademik Veri Envanter Sistemi Revizyon ve Sürüm Güncelleme İşleri Alımı, 1 adet YORDAM Kütüphane Otomasyonu Yazılımı Bakım ve Destek Hizmeti Alımı, 1 adet CBK ENVISION Elektronik Belge Yönetim Sistemi Bakım ve Destek Hizmeti Alımı, 1 adet SİNERJİ Dava-İcra-Mevzuat Takip Programı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet GLOBALSIGN SSL Sertifikası Alımı, 2 adet KEYPS Akademik Birim Akreditasyon Süreç Yönetim Yazılımı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet Dış Ticaret Yönetimi Detay Beyan Uygulaması Yazılımı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet TEAMVIEWER Uzak Destek Programı Yıllık Kullanım Hakkı Alımı, 1 adet Microsoft Eğitim Çözümleri Anlaşması (Yıllık Lisans Alımı), 1 adet CBDDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreçleri Takip Yazılımı Alımı, 1 adet KAMUTECH



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sürekli İşçi Bordro Programı Alımı, 1 adet Zoom Video Konferans Lisansı Alımı, 1 adet Perculus Uzaktan Eğitim Video Konferans Yazılım Lisansı Alımı, 1 adet KGK Tamir/Bakım Hizmeti Alımı, 1 adet CÜRADYO Radyo Vericisi Tamir/Bakım Hizmeti Alımı, 1 adet Bariyer Tamir/Bakım Hizmeti Alımı, 1 adet Jenaratör Tamir/Bakım Hizmeti Alımı gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında **Makine-Teçhizat** olarak Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığınca; 2 adet Dac Otoglav Cihazı, 2 adet Fizyodispenser Cihazı, 2 adet Güç Kaynağı, 1 adet Pacs Sistemi için Server, 2 adet Elektrokoter Cihazı, 3 adet Endomotor, 2 adet Pulpa Test Cihazı, 1 adet Gutta Doldurma ve Kesme Cihazı, 1 adet Aktivatör Cihazı, 1 adet Ultrasonik Aktivatör Cihazı, 1 Adet Endomotor alınmıştır.

2024 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları Projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır.

2024 yılı içerisinde; dergi kategorisinden 47.348 adet Fasikül Süreli Yayın,, Merkezi Kütüphanemizde 130.125 diğer Fakülte/Yüksekokul/Yüksekokulları 80.889 toplamda 211.203 basılı kitap ile 100.000+ edergi, 4.500.000+ e-kitap ve 9.496 kayıtlı tez bulunmaktadır. Veri Tabanı aboneliği ise; (TÜBİTAK ve Üniversite) 18+12=30'dur

2024 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamı için ayrılan ödeneklerle; 1 adet Tur Ve Shaver Mikromotor Cihazı, 1 adet Polisomnografi Cihazı, 1 adet Kemik Dansitometre (DEXA) Cihazı, 1 adet Doppler Kılavuzlu Hemoroid Arter Ligasyon Cihazı, 1 adet Flexible Video Bronkoskop Ve Zor Entübasyon Seti, 1 adet Floresan Atışman, 1 adet HD Video Endoskopi Sistemi, 1 adet Konturlama Sistemi, 50 adet Dmr El Telsizi Seti, 2 adet Dmr Uhf Sabit Merkez Telsizi, 1 adet Dmr Uhf Röle, 1 adet Kompresör Sistemi, 1 adet Ultra Hd 4k Artroskopisi Sistemi, 2 adet Ultra Hd 4k Laparoskopisi Endovizyon Sistemi (ICG özellikli), 2 adet Video Bronkoskop Cihazı, 1 adet Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Tümör Uçları Ve Tubing Set, 1 adet Dokunmatik Kontrollü Yüksek Hızlı Delgi Cihazı, 100 adet Yüksek Devirli Kraniotom ve Drill Ucu, 1 adet Yarı Motorize Mikrotom Cihazı, 200 adet Oksijen Flowmetresi, 200 adet Medikal Gaz Prizleri Kapsülü, 120 adet Terapi Cihazı, 10 adet 10 L Dikişsiz Çelik Gaz Silindiri, 8 adet 40 L Dikişsiz Çelik Gaz Silindiri (karbondioksit için), 8 adet 40 L Dikişsiz Çelik Gaz Silindiri (kuru hava için), 55 adet 50 L Dikişsiz Çelik Gaz Silindiri, 50 adet Basınç Düşürücü Ambulans Regülatörü, 1 adet Hedeflenmiş Isı Yönetim Sistemi Kontrol Ünitesi, 1 adet Anjiyografi Cihazı (DMO), 3 bakım Medikal Hava Ve Vakum Santrali Bakım Onarımı, 12 bakım Asansör Bakım Arıza Kontrolü Hizmet İş, 6 bakım Hastane Ve Bağlı Birimlerinin Hijyenik Klima Santrallerinin Yıllık Bakım Onarım İş 1 adet Otomatik Enjektör Cihazı, 1 adet Tam Otomatik Eksternal Defibrilatör, 1 adet Bilirubinmetre Cihazı, 1 adet Laringoskop Cihazı, 2 Adet Sabit Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alımları gerçekleşmiştir.

2024 yılında **Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde;

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Merkezinin sıcak su hattı, kanalizasyon hattı ve yangın merdiveni yenilenmiş, bina çevresi ve yolları beton kilit parke taşı döşenmiştir.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

• Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tuvaletlerinin tamiri. Çatısının bakımı yapılarak hastane dışarısına güvenlik nizamiye binası yapılmıştır.

2024 yılında **Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı** kapsamında; Yeni Hastane inşaatı 2024 yılı sonu itibarı ile % 75’lerde olup 15 blok ve katlı otopark binası olarak kaba (betonarme karkas, duvar ve çatı) inşaatı bitmiştir. İnşaat ince işleri olarak dış cephe kaplamaları, sıva, boya, şap, ters tavanlar, seramik ve mermer işleri, elektrik işleri (kablo, trafo, aydınlatma) sıhhi tesisat(temiz su, pisu, ısıtma, havalandırma imalatları) devam etmektedir. İnşaat dış kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılmakta ve çevre düzenleme işleri devam etmektedir.

2024 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında; Önceki yıllardan devreden 212 adet proje, 2024 mali yılında desteklenen 148 adet proje ile birlikte 2024 mali yılında toplam 360 adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 134 adedi tamamlanmış olup bu projeler için; 1 adet Beşli Eğitim Başlıklı Araştırma Mikroskopu, 1 adet Uzaktan Kumandalı Flat Panel Dedektörlü Dijital Floroskopi Cihazı, 1 adet Yatay Derin Dondurucu, 1 adet Hall sistemi 77-300 K Upgrade, 1 adet Nomarski Modlu Malzeme Mikroskobu, 1 adet Epitaksiyel Atomik Kuvvet Mikroskobu, 1 adet Wet Bench (ıslak tezgah), 1 adet Polycarbon-fiberglass şeffaf tezgah koruma kapakları (özel üretim), 4 adet Polipropilen vana ve mikron filtreli azot tabancaları, 2 adet Bej simona polipropilen asit-baz tankı (özel üretim), 1 adet Tenis top atma makinası, 1 adet Real-Time PCR Cihazı, 33 adet Rigol DS1102Z-E 100MHz 2 Kanallı 1GS/s Dijital Osiloskop, 1 adet Online Kesintisiz Güç Kaynağı, 28 adet Tümleşik Bilgisayar, 9 adet ARM Uygulamaları Seti, 1 adet Bilgisayarlı Tomografi, 1 adet Server Bilgisayar, 1 adet 3B Yazıcı (FDM), 18 adet Ergonomic Dış Ünitisi gibi malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2024 yılında **Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi Projesi** kapsamında makine-teçhizat bakım-onarımı, alımı ihale yapılamaması sebebiyle alınamamıştır.

2024 yılı içerisinde ; Eğitim, Sağlık ve Teknolojik Araştırma Projeleri için hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

4. Yatırım Uygulamaları

4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 239.200.000 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2023 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 10.000.000 TL olmuştur. 2024 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 135.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut ödeneklerimize likit karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 50.300.000 TL ödenek kaydı yapılmış toplam bütçe ödeneği 185.300.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 168.354.600 TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 2.699.481.232 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2023 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 1.414.477.232 TL olmuştur. 2024 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 680.000.000 TL hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 271.999.800 TL ödenek kaydı eklenerek toplam bütçe ödeneği 951.999.800 TL olmuştur. 2024 yılı sonu itibarıyla 948.505.479 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 18.183.000 TL'dir. 2024 yılı yatırım programı kapsamında Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 ve Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin %30'u bilimsel araştırmaları finanse etmek için öngörülmüş ve harcaması gerçekleşmiştir ayrıca hazine yardımları kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesinde 41.260 TL harcama yapılarak toplam 15.224.260 TL ödenek harcaması yapılmıştır.

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması,
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması,
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması,
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşme sürecini geciktirmektedir.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

III- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2024H03-233346 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2024 yılı yatırım programında 200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde kurum içi aktarma ile 5.000.000 TL ödenek eklenmiş daha sonra Büyük onarım projesine 4.500.000 TL aktarılaraq toplam bütçe ödeneği 2024 yılı için 700.000 TL olmuş ve yıl sonu itibarıyla 359.496 TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 51,36 olmuştur.

1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampüs Alt Yapısı

Söz konusu proje için 2024 yılı yatırım programı kapsamında 15.000.000 TL ödenek verilmiş ve yıl içerisinde tasarruf tedbirleri kapsamında 6.700.000 TL iptal edilerek toplam bütçesi 8.300.000 TL olmuştur. Bu ödenekten yıl içerisinde üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, yerleşke asfaltı vb. işleri için 8.300.000 TL'si harcanmıştır.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.3- Proje No: 2024H03-234210 Proje Adı: Büyük Onarım

Söz konusu proje deprem kaynaklı hasar gören binaların bakım onarımı ve yeniden inşası için kullanılmakta olup 2024 yılında 90.800.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 40.000.000 TL Likit Karşılığı 4.500.000 TL Etüt Projesinden aktarma yapılarak toplam bütçesi 135.300.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneğin 129.177.052 TL'si harcanmıştır.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 95,47 olmuştur.

1.4- Proje No: 2024H03-233348 Proje Adı: Muhtelif İşler

Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Özgelirden karşılanmak üzere büyük onarım giderleri için 1.409.000 TL ödenek verilmiş olup yıl içerisinde üniversitemiz detay programına göre birimlerin büyük onarımları yapılarak 937.698 TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 66,55 olmuştur.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2024 yılında 6.091.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit Karşılığı 2.000.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam bütçe ödeneği 8.091.000 TL olmuştur. 2024 yılı sonu itibariyle bu ödenekten makine teçhizat alımları için 7.542.077 TL'lik harcama yapılmıştır.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 93,22 olmuştur.

Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2024 yılında 8.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinde 8.000.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam bütçe ödeneği 16.000.000 TL olmuştur. 2024 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanı, yazılımı, altyapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 6.835.006 TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 42,72 olmuştur.

Makine Teçhizat Büyük Onarım

Üniversitemiz Makine Teçhizat Büyük Onarımı Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2024 yılında 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit Karşılığı 2.000.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 4.500.000 TL olmuştur. 2024 yılı sonu itibariyle bu ödenekten makine teçhizat büyük onarım giderleri için 4.286.254 TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 95,25 olmuştur.

Hammadde Alımları


Üniversitemiz Hammadde Alımları Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2024 yılında 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde bu ödenekten hammadde alımları için 1.942.140 TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 97,11 olmuştur.

Muhtelif İşler	2024 Yılı Ödeneği	2024 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	1.049.000	937.698	66,55
Makine Teçhizat Alımı	8.091.000	7.542.077	93,22
Bilgi Teknolojileri	16.000.000	6.835.006	42,72
Makine Teçhizat Büyük Onarım	4.500.000	4.286.254	95,25
Hammadde Alımları	2.000.000	1.942.140	97,11
Toplam	32.000.000	21.542.175	67,32



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

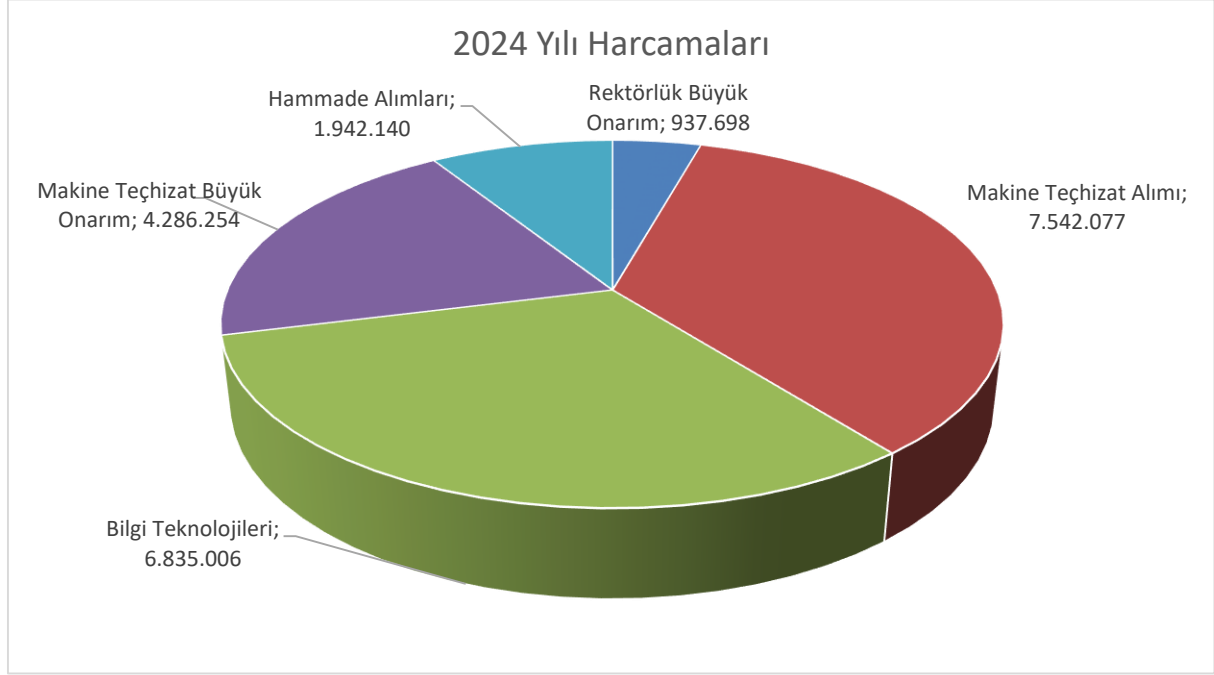

1.5- Proje No: 2024H03-233344 Proje Adı: Yayın Alımı

Üniversitemiz yayın alımları projesi için 2024 Yılı Yatırım Programında 9.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin 8.974.877 TL'si harcanarak kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere elektronik kitap, elektronik dergi, süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı ve veri tabanı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.


2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99,72 olmuştur.

Eğitim Sektörü Projeler	2024 Yılı Ödeneği	2024 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	700.000	359.496	51,36
Kampus Alt Yapı	8.300.00	8.300.000	100
Büyük Onarım	135.300.000	129.177.052	95,47
Muhtelif İşler	32.000.000	21.543175	67,32
Yayın Alımı	9.000.00	8.974.877	99,72
Toplam	185.300.000	168.354.600	90,85



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2024 Yılı Harcaması

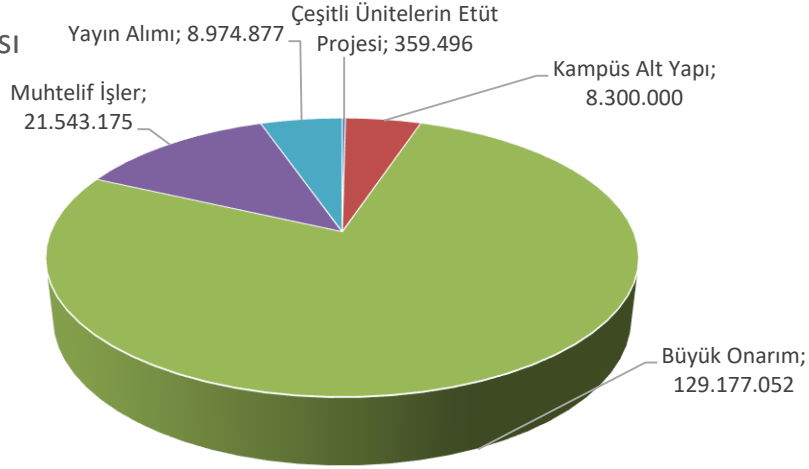

2. Sağlık Sektörü

2.1. Proje No: 2024I00-219848 Proje Adı: Muhtelif İşler

Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde hastane büyük onarımı için, 10.000.00.000 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 9.978.176 TL' si harcanarak hastanemizin ihtiyaç duyduğu bakım onarımlar gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99,78 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 20.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl sonu itibariyle hastane makine-teçhizat büyük onarımı için 16.713.814 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 83,57 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında mevcut hastanemiz için makine teçhizat alımları amacıyla 49.998.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 22.000.000 TL Likit karşılığı eklenerek toplam bütçe ödeneği 2024 yılı için 71.998.000 TL olmuş ve yıl sonu itibariyle 71.856.072 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99,80 olmuştur.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.2. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi

Söz konusu proje kapsamında hastane inşaatı için; 600.000.000 TL ödenek öngörülmüş ve yıl içerisinde 100.000.000 TL Likit Karşılığı eklenmiştir. Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 150.000.00 TL ödenek aktarılmış, toplam bütçe ödeneği 850.000.000 TL olmuştur. Bu ödenekten 849.957.417 TL harcanarak 2024 yılında inşaatına devam edilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 2.614.483.232 TL olup, 2023 yıl sonu kümülatif harcama tutarı 1.414.472.232 TL'dir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

3.1. Proje No: 2024K12-234051 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 15.183.000 TL ödenek tahmini yapılmış ve yıl içerisinde aktarımı yapılarak bilimsel proje desteklenmesi sağlanmıştır.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

3.2. Proje No: 2024K12-234049 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi

Söz konusu proje için 2024 yılı yatırım programında 3.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş fakat tasarruf tedbirleri kapsamında 300.000 TL ödenek iptal edilmiştir. Yıl içerisinde Mamul mal bakım onarımları için 958.000 TL aktarma yapılarak toplam bütçe ödeneği 2024 yılı için 3.658.000 TL olmuş ve yıl sonu itibarıyla 41.260 TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 1,13 olmuştur.



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV-ÖNERİLER

- ✓ Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

2024 Yılı Üniversitemiz Yatırımları Özet Tablosu

Proje Adı/ Tanıtımı	Kodu	Sektörü	İlçe	Proje Başlangıç Tarihi	Proje Tamamlanma Tarihi	Proje Durumu	Proje Tutarı/Maliyeti	2023 yılı Kümülatif Harcama	2023 Bütçesi	Eklenen	Düşülen	Toplam Bütçesi	2024 Harcaması
HASTANE İNŞAATI	2019I00- 109658	Sağlık	Merkez	2019	2026	Devam Ediyor	2.614.483.232	1.414.477.232	600.002.000	250.000.000	200	850.001.800	849.957.417
MUHTELİF İŞLER	2024I00- 219848	Sağlık	Merkez	2024	2024	Devam Ediyor	84.998.000	0	79.998.000	22.000.000	0	101.998.000	98.548.062
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	2024H03- 233346	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2024	2024	Devam Ediyor	200.000	0	200.000	5.000.000	4.500.000	700.000	359.496
KAMPÜS ALTYAPISI	2020H03- 152731	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2020	2025	Devam Ediyor	35.000.000	10.000.000	15.000.000	0	6.700.000	8.300.000	8.300.000
YAYIN ALIMI	2024H03- 233344	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2024	2024	Devam Ediyor	9.000.000	0	9.000.000	0	0	9.000.000	8.974.877
MUHTELİF İŞLER	2024H03- 233348	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2024	2024	Devam Ediyor	20.000.000	0	20.000.000	12.000.000	0	32.000.000	21.543.175
BÜYÜK ONARIM	2024H03- 234210	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2024	2026	Devam Ediyor	175.000.000	0	90.800.000	74.186.000	29.686.000	135.300.000	129.177.052
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ	2024K12- 234049	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	Merkez	2024	2024	Devam Ediyor	3.000.000	0	3.000.000	958.000	1.258.000	2.700.000	41.260
REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	2024K12- 234051	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	Merkez	2024	2024	Devam Ediyor	15.183.000	0	15.183.000	0	0	15.183.000	15.183.000
TOPLAM							2.956.864.232	1.424.477.232	833.183.000	364.144.000	42.144.200	1.155.182.800	1.132.084.339
