



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2026
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL
Rektör

İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	1
Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL	1
II-GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
1. Misyon ve Vizyon.....	3
Misyon	3
Vizyon	3
Temel İlkelerimiz.....	3
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	4
Stratejik Amaç 1	4
Stratejik Amaç 2	4
Stratejik Amaç 3	4
Stratejik Amaç 4	5
Stratejik Amaç 5.....	5
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	6
3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	6
3.2. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	7
4. Yatırım Uygulamaları	11
4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	11
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	12
III- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	12
1. Eğitim Sektörü	12
1.1- Proje No: 2024H03-233346 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	12
1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampüs Alt Yapısı	12
1.3- Proje No: 2024H03-234210 Proje Adı: Büyük Onarım	13
1.4- Proje No: 2024H03-233348 Proje Adı: Muhtelif İşler	13
1.5- Proje No: 2024H03-233344 Proje Adı: Yayın Alımı	14
2. Sağlık Sektörü	15
2.1. Proje No: 2024I00-219848 Proje Adı: Muhtelif İşler	15
2.2. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi	16
3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü	17
3.1. Proje No: 2024K12-234051 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	17
3.2. Proje No: 2024K12-234049 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	17
IV-ÖNERİLER	18
2025 YILI YATIRIM ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	19



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-Üst Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiş; hesap verebilirlik, mali saydamlık ve performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde, idarelerin gerçekleştirdikleri harcamaların etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesini sağlayan raporlama mekanizmaları tesis edilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf kavramı, harcamaların azaltılmasından ziyade kaynakların yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara uygun biçimde kullanılmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen yatırımlar ile temin edilen makine ve teçhizatın sınırlı bir ekonomik ömre sahip olduğu dikkate alındığında, yatırım süreçlerinin uzaması söz konusu varlıkların etkin kullanım süresini kısaltmakta ve beklenen faydanın azalmasına yol açmaktadır.

1974 yılında kurulan ve fiziki altyapı gelişimini sürdürmekte olan üniversitemizde, 2025 yılı yatırım harcamalarının sektörel dağılımı incelendiğinde; toplam harcamaların %80'inin sağlık, %17'sinin eğitim ve %3'ünün teknolojik araştırmalar alanına yönlendirildiği görülmektedir.

Gelişen teknolojik imkânlarla uygun olarak donatılmış bina, derslik ve laboratuvar altyapısı aracılığıyla, öğrencilere nitelikli eğitim-öğretim sunulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, fiziki altyapı yatırımlarının etkin bir planlama çerçevesinde ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Üniversitemiz, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra sağlık hizmeti sunumunda da önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilirliğin artırılması ve çağdaş sağlık hizmeti sunumunun sürdürülebilmesi amacıyla, mevcut hastanenin fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve ileri teknolojiye sahip makine ve teçhizat eksikliklerinin giderilmesine yönelik yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

2025 yılı yatırım programı kapsamında üniversitemiz bünyesinde yürütülen projeler için başlangıçta 1.261.697.000 TL ödenek öngörülmüş; yıl içerisinde öz gelir (likit) ve yatırımları hızlandırma ödeneği kapsamında toplam 158.000.000 TL ilave kaynak tahsis edilmiştir. Bu çerçevede, yıl sonu toplam ödenek tutarı 1.419.697.000 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödeneğin 1.090.188.394 TL'si kullanılmış, 329.508.606 TL'si ise yıl sonu itibarıyla harcanmamıştır. Böylelikle, 2025 yılı nakdi gerçekleşme oranı %77 olarak kaydedilmiştir.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL
Rektör



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II-Genel Değerlendirme

Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışıyla milli ve manevi değerlerine bağlı, eleştirel düşünebilen, rekabet edebilen, insana ve doğaya karşı saygılı öğrenci ve akademisyen yetiştirmek; bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunacak başta sağlık, eğitim ve araştırma alanlarında olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmak.

Vizyon

Nitelikli eğitim ve araştırmalarla bölgemizin ve ülkemizin her açıdan gelişmesine ve kalkınmasına yön vermek.

Temel İlkelerimiz

- Çevre ve doğaya saygı
- Toplumsal sorunlara duyarlılık
- Eleştirel Düşünce
- Liyakat
- Etik değerlere bağlılık
- Öğrenci merkezlik



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Ulusal ve Uluslararası Standartları Sağlayan Gelişime Açık, Rekabet Edebilen, Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Bulunmak

HEDEF 1.1: Çağın İhtiyaçları Doğrultusunda Nitelikli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Bulunmak,

HEDEF 1.2: Eğitim Öğretim Ortamlarının Fiziksel İmkânlarını Artırmak,

HEDEF 1.3: Öğretim Elemanlarının Yetkinliğini Artırmak,

HEDEF 1.4: Lisansüstü Öğrenci ve Öncelikli Alan Lisansüstü Program Sayısını Artırmak,

HEDEF 1.5: Akredite Olan Program Sayısını Artırmak.

Stratejik Amaç 2

Bilimsel Araştırma Odaklı Üniversite Kimliği Geliştirmek

HEDEF 2.1: Fiziki ve Teknolojik Araştırma Altyapısını Nicelik ve Nitelik Yönünden Güçlendirmek,

HEDEF 2.2: Nitelikli ve Etkin Araştırma Yapabilme Becerilerini Geliştirerek Proje Sayılarını Artırmak,

HEDEF 2.3: Patent ve Bilimsel Yayın Sayısını ve Niteliklerini Artırmak,

HEDEF 2.4: Öğrencilerimizin Akademik Araştırma Süreçlerine Katılımını Desteklemek.

Stratejik Amaç 3

İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Faaliyetlerinde Nitelik ve Niceliği Artırmak

HEDEF 3.1: Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kaliteyi Artırmak,

HEDEF 3.2: Sağlık Hizmeti Sunan Birimlerin Kendi Kendine Yetebilirliğini Artırmak,

HEDEF 3.3: Sağlık Turizmini Geliştirmek,

HEDEF 3.4: Çevre Sağlığı Okuryazarlığını Artırmak,

HEDEF 3.5: Hayvan Hakları Okuryazarlığın Artırılması.



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Stratejik Amaç 4

Toplumsal Katkı Sağlamaya ve Sosyal Sorumluluğa Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Artırmak

HEDEF 4.1: Topluma Katkı Sağlamaya Yönelik Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Artırmak ve Paydaşların Katılım ve Katkılarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak,

HEDEF 4.2: Kamu, Üniversite, Sanayi ve Şehir İşbirliğini Artırarak Ulusal ve Bölgesel Faaliyetlere Öncü Olmak; Yeni İşbirliği Oluşturarak Toplumsal Fayda Sağlamak,

HEDEF 4.3: Üniversitenin Sağlık, Kültür, Sanat ve Spor ile İlgili Etkinliklerinde Topluma Dönük Yüzünün Geliştirilerek Sosyal Yaşama Sağladığı Katkırı Artırmak,

HEDEF 4.4: Yaşayan ve Yaşanabilir Kampüs Sayesinde Öğrenci, Çalışan ve Yerleşkeyi Kullanan Diğer Paydaşların Yaşam Kalitesini Artırmak,

HEDEF 4.5: Şiddetle ve Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Artırılması.

Stratejik Amaç 5

Gelişime Açık Sürdürülebilir Kurumsal Yapıtı Oluşturmak

HEDEF 5.1: İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemlerini Geliştirmek,

HEDEF 5.2: İnsan Kaynakları Yetkinliğini Artırmak ve Kurumsal Aidiyeti Geliştirmek,

HEDEF 5.3: Bilişim Donanım/Yazılım Altyapısını ve Kullanıcı Destek Hizmetlerini Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak,

HEDEF 5.4: Alt ve Üstyapıtı Güçlendirmek.



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1.Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin ilanının 50. yıl dönümünü bilimsel bir eserle kalıcı hale getirmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihli ve 1788 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitenin adı, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile **Sivas Cumhuriyet Üniversitesi** olarak değiştirilmiştir.

Üniversite; 127.965 m² kendi mülkiyetinde bulunan arazi, 6.078.551 m² Hazine tarafından tahsis edilen arazi, 39.525 m² vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişiliklere ait arazi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi olmak üzere geniş bir yerleşke üzerinde faaliyet göstermektedir. Kurum bünyesinde 18 fakülte, 4 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastane) ile birlikte toplam 37 uygulama ve araştırma merkezi ile Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Dış Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Kalın Köyü sınırları içerisinde yer alan 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de üniversite bünyesinde hizmet vermektedir.

Üniversitenin fiziki altyapısı; rektörlük konutu ve 200 Adetlojman, merkezi kütüphane, çeşitli spor branşlarına hizmet veren kapalı spor salonları (basketbol, voleybol, hentbol ve güreş), Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, açık spor sahaları, mini golf sahası, dinlenme ve rekreasyon alanları, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane ve öğrenci yurtları gibi sosyal ve sportif tesisleri içermektedir. Ayrıca yarı olimpiik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, teknik altyapı birimleri (trafolar, ısı merkezleri), PTT ve banka hizmet birimleri, ibAdetalanları, Kangal Köpeği Üretme Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık Su Arıtma Tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Merkezi ve Teknokent ile idari hizmet binaları üniversitenin fiziki olanakları arasında yer almaktadır.

Üniversitenin hizmet alanları incelendiğinde; 59.721,19 m² idari hizmet alanı, 91.018,07 m² eğitim alanı, 140.539,81 m² sağlık alanı, 25.217,66 m² beslenme alanı, 10.714,02 m² kültür alanı, 32.978,44 m² sosyal alan, 31.420,00 m² lojman alanı, 211.097,68 m² diğer alanlar (depo, arşiv vb.), 56.637,02 m² spor alanı ve 10.145,13 m² araştırma alanı olmak üzere toplam 669.489,02 m² kapalı alana sahip olduğu görülmektedir.

Akademik ve idari insan kaynağı açısından değerlendirildiğinde; üniversitede 394 profesör, 291 doçent, 474 doktor öğretim üyesi, 330 öğretim görevlisi ve 428 araştırma görevlisi ile birlikte 3.542 idari personel görev yapmakta olup, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri bu kadro ile yürütülmektedir.



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2025 Yılı Eğitim Sektörü Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında; İleri Teknoloji Araştırma Merkezi (CÜTAM) B Binası, Konukevi-1, Konukevi-2 (Mahir Tevruz) binaları ile Eğitim Fakültesi B Binası için deprem performans analizleri gerçekleştirilmiştir.

2025 Yılı Eğitim Sektörü Kampüs Altyapı Projesi Çerçevesinde, üniversite yerleşkesinde mevcut altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda; Dış Hekimliği Fakültesi trafosu ile hastane karşısında yer alan otopark trafoları yenilenmiş, Personel Yemekhanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi arasındaki orta gerilim (OG) hatları rehabilite edilmiştir. Ayrıca İlahiyat Fakültesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) binası ve Fen Fakültesinde kullanılan kazan sistemlerinin doğalgaza dönüşümü sağlanmış; Edebiyat Fakültesine ait yağmur suyu hattı inşa edilmiştir.

2025 Yılı Eğitim Sektörü Büyük Onarım Projesi Kapsamında; üniversite yerleşkesinde çeşitli bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda;

- Dış Hekimliği Fakültesinde yangın merdivenleri yenilenmiş, yeni üniteler (muayene odaları) oluşturulmuş ve boya ile bakım-onarım işlemleri tamamlanmıştır.
- Fen Fakültesinde altı takım bay ve bayan WC yenilenerek alüminyum klipsin ters tavan ve aydınlatma sistemleri modernize edilmiştir.
- Öğrenci yemekhanesi inşaatı gerçekleştirilmiştir.
- İlahiyat Fakültesi Camisinin çatı onarımı yapılmıştır.
- Merkezi amfinin WC, mutfak ve ofis alanları yenilenmiştir.
- Gençlik Merkezinin alüminyum doğrama işleri yapılmıştır.
- Yüzme havuzuna ilişkin tadilat çalışmaları tamamlanmıştır.
- 100. Yıl Kültür Merkezinde alçıpan bölme imalatları gerçekleştirilmiştir.
- Gemerek Meslek Yüksekokulunda aydınlatma sistemleri yenilenmiştir.
- Lojmanlar binası çatı yapımı ,cephe tamirleri ve kanalizasyon işleri yapılmıştır.
- Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu WC' leri yenilenmiştir.
- Suşehri Sağlık Yüksekokulu iç boya işleri yapılmıştır.



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2025 Yılında Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi Kapsamında; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca;

- 10.01.2025 tarihinde 2 Güzergah Tek Kısım Personel Taşıma Hizmeti pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiştir.
- 15.04.2025 tarihinde Özel Güvenlik, Çevre, Arama Kurtarma Birimleri İçin Kıyafet ve Malzeme Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- 12.09.2025 tarihinde Yangın Tüpü Alımı ve Dolumu ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- 13.10.2025 tarihinde Malzemeli, Personel Öğle Yemeği Üretimi ve Dağıtım ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- 27.10.2025 tarihinde Personel Taşıma Hizmeti (2026 YILI) ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- 10.12.2025 tarihinde Pasif Araç Geçiş Etiket (HGS TAG) Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 112 Adet Misafir Koltuğu, 8 Adet Masa Takımı, 12 Adet Çalışma Koltuğu olmak üzere büro mobilyası alınmıştır.
- Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 50 Adet Bilgisayar , 32 Adet Lazer Yazıcı , 40 Adet Projeksiyon Cihazı alınmıştır.
- Üniversitemizin Araç İşletme ve Bakım Biriminde Araçların Bakım Onarımı için 416 litre Araç Yağı, 320 kg Antifriz, 200 litre Egzoz Sıvısı alınmıştır.
- Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 20 Adet Masa Takımı, 50 adet Çalışma Koltuğu, 40 Adet Misafir Koltuğu alınmıştır.
- Üniversitemizin Özel Güvenlik biriminde kullanılmak üzere 5 Adet Kasis Kapan, 200 Adet Hız Kesici Yol Kasisi, 150 Adet Trafik Konisi 75 cm, 300 adet Delinatör olmak üzere Trafik-Otopark Güvenlik malzemesi alınmıştır.

2025 Yılında Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi Kapsamında; Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Bilgi Teknolojileri alımları kapsamında; 1 Adet Veri Merkezi Sistemi Alımı, 1 Adet PROLİZ Öğrenci ve Personel İşleri Programı Yıllık Revizyon Hizmeti Alımı, 1 Adet CBK-ENVISION İhale Süreçleri Yönetim Programı Yıllık Revizyon Hizmeti Alımı, 1 Adet AMP Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Yıllık Revizyon Hizmeti Alımı, 1 Adet PERCULUS Uzaktan Eğitim için Sanal Sınıf Sistemi Yıllık Revizyon Hizmeti Alımı, 1 Adet CBK-ENVISION Elektronik Belge Yönetim Sistemi Programı Revizyon Hizmeti Alımı, 1 Adet AVESİS Akademik Veri Envanter Sistemi Yıllık Revizyon Hizmeti Alımı, 1 Adet YORDAM Kütüphane Otomasyonu Programı Yıllık Revizyon Hizmeti Alımı, 1 Adet KAMUTECH İşçi Bordro Programı Alımı, 1 Adet MICROSOFT Kampus Anlaşması, 1 Adet SİNERJİ Hukuk Yazılımları Yıllık Revizyon Hizmeti Alımı, 2 Adet KEYP Akreditasyon Programı Alımı (Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için), 1 Adet Global Sign SSL Sertifikası Alımı, 1 Adet Kütüphane Kitap



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ödünç/İade ve Güvenlik Sistemleri Bakım Anlaşması, 1 Adet Optik Form Okuyucu Yazılımı Alımı (Hukuk Fakültesi İçin), 1 Adet Araç Takip Sistemi Alımı (23 araçlık), Personel için E-İmza Sertifika ve Okuyucu Alımı, 1 Adet Güvenlik Duvarı (Firewall) Alımı, 1 Adet Jeneratör Bakım Hizmeti Alımı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için Renkli Baskı Makinesi Alımı, IP Telefon Alımı, Bellek, Disk, Board vb. Muhtelif Bilişim Malzemeleri Alımı, Elektrik Prizi, Elektrik Kablosu, Pano, Sigorta vb. Elektrik Malzemesi Alımı, UTP Kablo, Rj45 Plug, Keystone Jack, Patch Panel vb. Network Malzemesi Alımı, Muhtelif Bilgisayar/Yazıcı/Fotokopi vb. Diğer Donanım Tamir Bakım Hizmeti Alımı, Kurumsal Kimlik Kart Basım Hizmeti Alımı (20.000 Adet öğrenci/personel), Sivas Teknik Bilimler MYO 2 Adet laboratuvar için toplam 62 bilgisayar Alımı, Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO laboratuvar için toplam 31 Adet bilgisayar Alımı, Şarkışla Uygulamalı Bilimler YO laboratuvarı için toplam 31 Adet bilgisayar Alımı, Kütüphane Daire Başkanlığı laboratuvarı için toplam 50 Adet bilgisayar Alımı, Üniversite personeline dağıtmak üzere 69 Adet bilgisayar Alımı, Konferans salonları için 6 Adet bilgisayar Alımı, 3 Adet Otopark Bariyeri Alımı, 7 Adet Turnike Alımı, 200 Adet Güvenlik Kamerası Alımı, 14 Adet Güvenlik Kamerası Harddisk Alımı, 4 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı, Akü Alımı, 3 Kollu Turnike Alımı, Temizlik malzemesi Alımı gerçekleştirilmiştir

2025 yılında Eğitim Sektörü Yayın Alımları Projesinde; bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesi koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunmaktadır.

2025 yılı içerisinde; dergi kategorisinden 54.109 Adet Fasikül Süreli Yayın, Merkezi Kütüphanemizde 144.772; diğer Fakülte/Yüksekokul/Yüksekokulları 105,534 toplamda 250,309 basılı kitap ile 100.000+ e-dergi, 4.500.000+ e-kitap ve 12.225 kayıtlı tez bulunmaktadır. Veri Tabanı aboneliği ise; (TÜBİTAK ve Üniversite) 26+19=45'tir.

2025 Yılında Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesinde; ayrılan ödeneklerle; 1 Adet Göz Lazer Cihazı, 1 Adet Çok Fonksiyonlu Çivili Başlık Sistemi, 1 Adet Bilgisayarlı Dijital Görüntü Aktarım ve Arşivleme Sistemi Pacs Entegrasyonu, 1 Adet Doku Gömme Cihazı, 1 Adet Doku Takip Cihazı Modülü, 1 Adet Otomatik Lazer Kaset ve Lam Sistemi, 1 Adet Hemodiyaliz Cihazı, 1 Adet Hemodiyaliz Cihazı İçin Mobil Ters Ozmos Su Arıtım Sistemi, 1 Adet Tansiyon Holter Cihazı, 1 Adet Otomatik Enjektör Cihazı, 1 Adet Vasküler Lazer Cihazı, 1 Adet Kablosuz Yüksek Frekans Lineer Prob, 1 Adet BBL Cilt Onarım Cihazı, 1 Adet Mr Uyumlu Otomatik Ventilatorlü Anestezi Cihazı, 1 Adet Diffüzyonlu Solunum Fonksiyon Test Cihazı, 2 Adet Cerrahi Aletler Seti, 4 Bakım Medikal Gaz Atölyesi Hava Ve Vakum Santralleri Bakım Onarım Hizmet İşi, 1 Adet Vidalı Vakum Pompası, 12 Bakım Asansör Bakım Arıza Kontrolü Hizmet İşi, 12 Bakım Hastane ve Bağlı Birimlerinin Hijyenik Klima Santrallerinin Yıllık Bakım Onarım İşi, 2 Adet Yarı Otomatik Eksternal Defibrilatör (DMO), 4 Adet Ventilator Cihazı (DMO), 2 Adet 12 Kanal EKG Cihazı, 1 Adet CPR Destekli Monitörlü Defibrilatör (DMO), 1 Adet Sabit Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı (DMO) alımları gerçekleşmiştir.

2025 Yılında Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında Hastane Büyük Onarım İşinde; Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin ahşap oturtma çatıları yanmaz alçıpan ile kapatıldı, arızalan kazan değişimi yapıldı, ana yol yağmur suyu hattı ve asfalt kaplama işleri ile hastane girişine engelli asansörü yapılmıştır.



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2025 Yılında Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı Kapsamında; Yeni Hastane inşaatı 2025 yılı sonu itibariyle % 95’lerde olup 15 blok ve katlı otopark binası olarak kaba (betonarme karkas, duvar ve çatı)inşaatı bitmiştir. İnşaat İnce işleri olarak dış cephe kaplamaları, sıva, boya, şap, ters tavanlar, seramik ve mermer işleri, elektrik işleri (kablo, trafo, aydınlatma) sıhhi tesisat(temiz su, pissu, ısıtma, havalandırma imalatları) devam etmektedir. İnşaat dış kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılmış ve çevre düzenleme işleri devam etmektedir.

2025 Yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında; önceki yıllardan devreden 218 Adet proje, 2025 mali yılında desteklenen 161 Adet proje ile birlikte 2025 mali yılında toplam 379 Adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 141 adedi tamamlanmış olup söz konusu projeler kapsamında araştırma ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla toplam 84 kalem makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 1 Adet sonik aktivasyon cihazı, 1 Adet pasif ultrasonik cihaz, 1 Adet 3,5x dental loupe ve soft touch ışık kaynağı, 1 Adet yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazı, 1 Adet dijital refraktometre, 2 Adet vorteks karıştırma cihazı, 1Adet hamur yoğurucu, 1 Adet ısı ayarlamalı çalkalamalı su banyosu, 1 Adet stomacher cihazı, 1 Adet mikrosantrifüj, 2 Adet yazıcı, 2 Adet masaüstü bilgisayar, 5 Adet projeksiyon cihazı, 1 Adet kompozit ısıtma cihazı, 1 Adet dental izolasyon sistemi, 1 Adet Jetson Orin Nano Super geliştirme kiti, 1 Adet Nvidia Jetson AGX Orin geliştirme kiti (64 GB), 1 Adet bluetooth kayıt cihazı/yaka mikrofonu, 3 Adet tek kart bilgisayar (SBC), 1 Adet SBC aktif soğutucu, 1 Adet ARM uygulamaları seti, 1 Adet çapa makinası, 1 Adet benzinli motorlu sırt tırpanı yabancı ot kesme makinası, 1 Adet taşınabilir röntgen cihazı, 30 Adet dış üniteli bilgisayar, 1 Adet taşınabilir nem ve sıcaklık ölçer, 1 Adet taşınabilir desibelmetre, 1 Adet taşınabilir anemometre, 1 Adet klima, 11 Adet manyetik karıştırıcı ısıtıcı, 1 Adet endüstriyel kamera, 3 Adet periapikal röntgen cihazı, 2 Adet panoramik röntgen cihazı, 1 Adet dental mikroskop, 3 Adet ağız içi tarayıcı, 1 Adet ağız içi görüntüleme ve büyütme cihazı, 1 Adet ağız içi tasarım yazılımı ve bilgisayarı, 1 Adet açık sistem 3D yazıcı, 1 Adet kapalı sistem 3D yazıcı, 1 Adet pil punta kaynak makinası, 1 Adet programlanabilir DC güç kaynağı, 1 Adet ultrasonik su banyosu, 2 Adet havya tabanca lehim makinası, 5 Adet kalem havya lehim makinası, 12 Adet dış ünite, 30 Adet VESA uyumlu dış üniteli kolu, 1 Adet nofrost buzdolabı, 3 Adet analitik terazi, 1 Adet tablet, 22 Adet bilgisayar, 1 Adet şarjlı pipet pompası, 1 Adet dijital masaüstü santrifüj cihazı, 1 Adet çeker ocak, 1 Adet mikropalakalı ELISA okuyucu, 2 Adet sessiz hava kompresörü, 1 Adet üç boyutlu yazıcı, 1 Adet çalkayıcı inkübatör, 1 Adet yüksek performanslı bilgisayar, 1 Adet SPECT/BT sistemi ve envanterleri, 4 Adet pH metre masaüstü, 2 Adet etüv, 1 Adet çok noktalı manyetik karıştırıcı (4 noktalı), 1 Adet refraktometre (Abbe), 1 Adet kül fırını, 1 Adet UV-Vis spektrofotometre, 2 Adet vakumlu filtrasyon sistemi, 1 Adet Adetmonitör, 1 Adet dizüstü bilgisayar, 1 Adet bilgisayar (laptop), 1 Adet çok fonksiyonlu lazer yazıcı ve 1 Adet derin dondurucu (-20 °C) temin edilerek ilgili birimlerin kullanımına sunulmuştur.

2025 Yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi Projesi kapsamında;

- İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin çatı ve oluklarının onarımı, tretuvar yapımı, bina dış cephesi minaral sıva ve boyası ile bina girişi mermer kaplama işleri yapılmıştır.
- Uzun Okuma Tabanlı Dizileme Sistemi Mal Alımı gerçekleştirilmiştir.
- HPLC ve GC-MS Laboratuvar Cihazı Bakım Onarım işi,



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- ICP-MS Laboratuvar Cihazı Bakım Onarım işi.
- GPC Laboratuvar Cihazı Bakım Onarım işi.
- MİSEQ model Dizileme Laboratuvar cihazının Bakım Onarım işi yaptırılmıştır.

2025 yılı içerisinde; Eğitim, Sağlık ve Teknolojik Araştırma Projeleri için hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür.

4. Yatırım Uygulamaları

4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin eğitim sektöründe toplam proje tutarları 343.300.000 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2024 yılı kümülatif harcama tutarı 153.300.000 TL olmuştur. 2025 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 180.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut ödeneklerimize likit karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 55.000.000 TL ödenek kaydı yapılmış ve toplam bütçe ödeneği 235.000.000 TL olmuştur. 2025 yılı sonu itibarıyla 191.059.007 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin sağlık sektöründe toplam proje tutarları 4.170.481.232 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2024 yılı kümülatif harcama tutarı 2.757.851.499 TL olmuştur. 2025 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 1.050.000.000 TL hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak yatırımları hızlandırma ödeneğinden 100.000.000 TL ödenek kaydı eklenerek toplam bütçe ödeneği 1.150.000.000 TL olmuştur. 2025 yılı sonu itibarıyla 867.460.288 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe toplam proje tutarları 35.226.000 TL'dir. 2024 yılı yatırım programı kapsamında Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 ve Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin %30'u bilimsel araştırmaları finanse etmek için öngörülmüş olan 21.697.000TL'nin tamamının harcaması gerçekleşmiştir. Ayrıca hazine yardımları kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi İçin 2025 yılında 10.000.000 TL Ödenek öngörülmüş yıl içerisinde likit karşılığı 3.000.000 TL ödenek eklenerek toplam bütçesi 13.000.000 TL olmuştur. yıl sonu itibarıyla 9.972.099 TL harcanarak toplam 31.669.099 TL ödenek harcaması yapılmıştır.

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması,
- Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması,
- Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması,



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşme sürecini geciktirmektedir.

III- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1. Proje No: 2025H03-258630 – Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje kapsamında 2025 yılı yatırım programında başlangıç ödeneği olarak 1.000.000 TL tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 7.000.000 TL likit karşılığı ödenek ilavesi yapılarak toplam ödenek 8.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Yıl sonu itibarıyla 1.575.838,75 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, nakdi gerçekleşme oranı %19,69 olarak hesaplanmıştır.

1.2. Proje No: 2020H03-152731 – Kampüs Altyapı Projesi

2025 yılı yatırım programı kapsamında projeye 25.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 24.943.379 TL'si; çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz ve yerleşke asfaltlama çalışmaları için kullanılmıştır. Yıl sonu itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı %99,77 olarak gerçekleşmiştir.

1.3. Proje No: 2024H03-234210 – Büyük Onarım Projesi

Deprem kaynaklı hasar gören yapıların bakım, onarım ve yeniden inşası amacıyla yürütülen proje kapsamında 2025 yılı için 100.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten 35.000.000 TL ilave edilmiş, ayrıca 10.000.000 TL muhtelif işler projesine aktarılmış ve toplam ödenek 125.000.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 93.516.749 TL'si kullanılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı %74,81 'dir.

1.4. Proje No: 2025H03-258626 – Muhtelif İşler Projesi

a) Rektörlük Büyük Onarım Giderleri

Muhtelif İşler Projesi kapsamında, özgelirlerden karşılanmak üzere büyük onarım giderleri için 1.842.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak yıl sonu itibarıyla bu kalemden herhangi bir harcama yapılmamış olup, nakdi gerçekleşme oranı %0 olarak gerçekleşmiştir.

b) Makine ve Teçhizat Alımları

Eğitim ve destek hizmetlerine yönelik makine ve teçhizat alımları için 2025 yılında başlangıçta 21.158.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Büyük Onarım Projesinden 10.000.000 TL aktarma yapılmış ve 13.000.000 TL likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 44.158.000 TL'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla 43.454.644 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, nakdi gerçekleşme oranı %98,40 olmuştur.



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

c) Bilgi Teknolojileri Alımları

Bilgi teknolojileri yatırımları için 2025 yılında 10.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda bilgisayar donanımı, yazılım, altyapı, bakım ve onarım giderleri için toplam 8.324.656 TL harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı %83,24 olarak gerçekleşmiştir.


d) Makine-Teçhizat Büyük Onarım Giderleri

Makine ve teçhizatın büyük onarım giderleri için 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl sonu itibarıyla 4.843.266 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda nakdi gerçekleşme oranı %93,86 olmuştur.

e) Ham Madde Alımları

Ham madde alımları için 2025 yılı kapsamında 6.000.000 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibarıyla 4.424.582 TL harcama yapılmıştır. Bu doğrultuda nakdi gerçekleşme oranı %73,74 olarak gerçekleşmiştir.

Muhtelif İşler	2025 Yılı Ödeneği	2025 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	1.842.000	0	0
Makine Teçhizat Alımı	44.158.000	43.454.644	98,40
Bilgi Teknolojileri	10.000.000	8.324.656	83,24
Makine Teçhizat Büyük Onarım	5.000.000	4.843.266	96,86
Ham Madde Alımları	6.000.000	4.424.582	73,74
Toplam	67.000.000	61.047.148	91,11

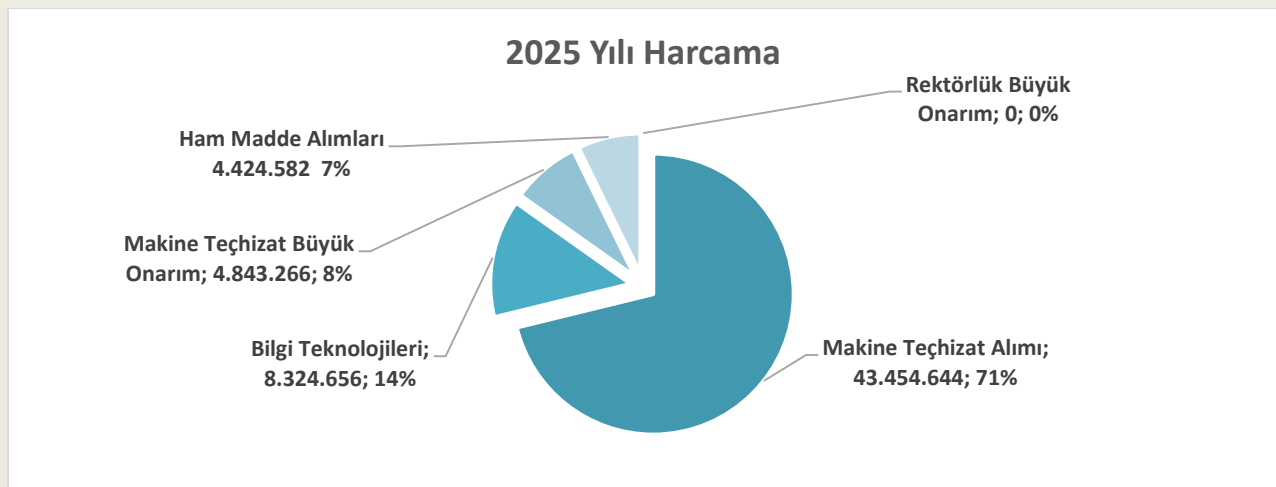




2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.5. Proje No: 2025H03-258628 – Yayın Alımı Projesi

Üniversitemiz yayın alımları kapsamında, 2025 yılı yatırım programında 10.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Söz konusu ödeneğin 9.975.892 TL'si kullanılarak kütüphane hizmetlerinde değerlendirilmek üzere elektronik kitap, elektronik dergi, süreli yayın abonelikleri, yerli ve yabancı basılı kitap alımları ile veri tabanı abonelik ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2025 yılı sonu itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı %99,75 olarak gerçekleşmiştir.

Eğitim Sektörü Projeler	2025 Yılı Ödeneği	2025 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	8.000.000	1.575.839	19,70
Kampüs Alt Yapı	25.000.000	24.943.379	99,77
Büyük Onarım	125.000.000	93.516.749	74,81
Muhtelif İşler	67.000.000	61.047.148	91,15
Yayın Alımı	10.000.000	9.975.892	99,76
Toplam	235.000.000	191.059.007	81,30

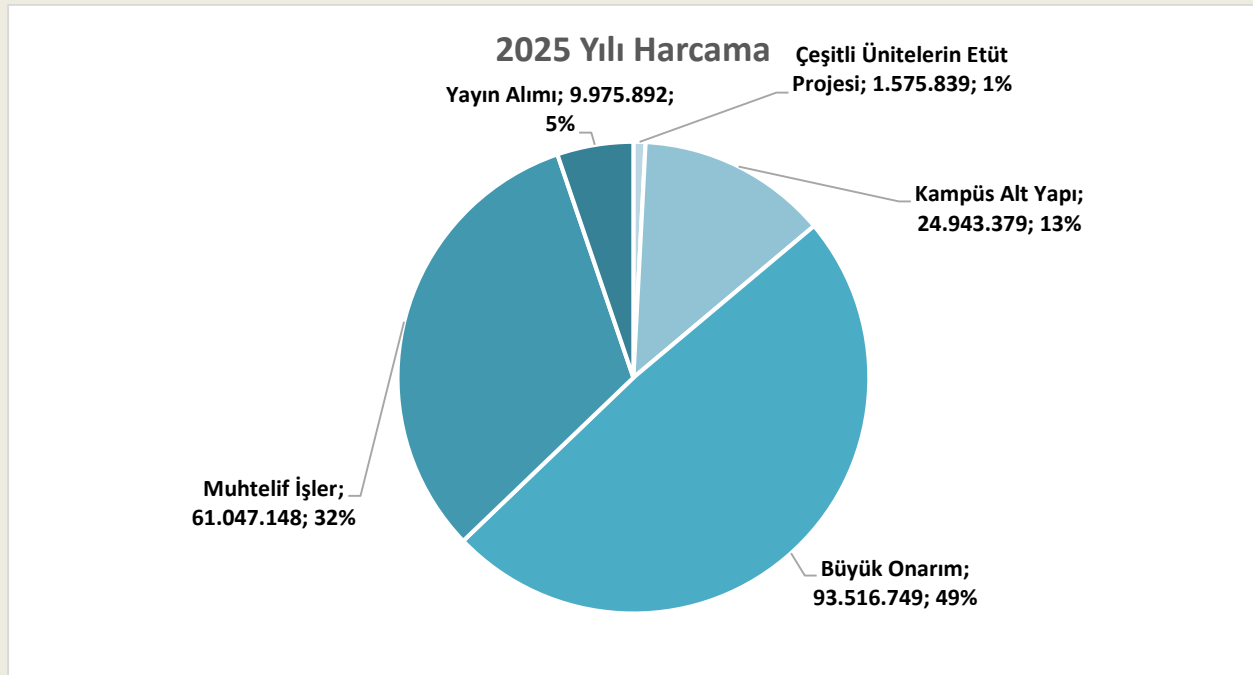



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Sağlık Sektörü

2.1. Proje No: 2025I00-241819 – Muhtelif İşler Projesi

a) Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu proje kapsamında, yatırım programı çerçevesinde hastane büyük onarım işleri için 14.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl sonu itibarıyla bu ödeneğin 13.999.427 TL'si kullanılarak hastanenin ihtiyaç duyduğu bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda nakdi gerçekleşme oranı %99,99 olarak gerçekleşmiştir.

b) Makine ve Teçhizat Büyük Onarım Giderleri


Hastane makine ve teçhizatının büyük onarım giderleri için 11.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibarıyla 9.947.736 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, nakdi gerçekleşme oranı %90,43 olarak hesaplanmıştır.

c) Makine ve Teçhizat Alımları

Mevcut hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda makine ve teçhizat alımları için 24.998.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibarıyla bu ödeneğin 24.955.170 TL'si kullanılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı %99,98 olarak gerçekleşmiştir.

Muhtelif İşler	2025 Yılı Ödeneği	2025 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Büyük Onarım	14.000.000	13.999.427	99,99
Makine Teçhizat Büyük Onarım	11.000.000	9.947.737	90,43
Makine Teçhizat Alımı	24.998.000	24.955.170	99,98
Toplam	49.998.000	48.902.334	97.80

2025 Yılı Harcama

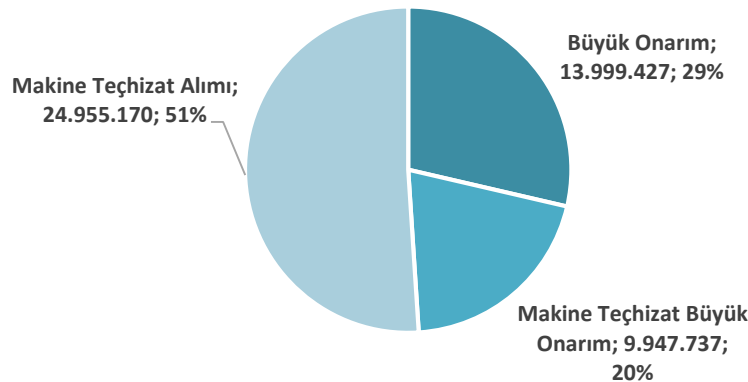



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.2. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı : Hastane İnşaatı Projesi

Söz konusu proje kapsamında hastane inşaatı için; 1.000.002.000 TL ödenek öngörülmüş ve yıl içerisinde 100.000.000 TL yedek ödenekten aktarılmış, toplam bütçe ödeneği 1.100.000.000 TL olmuştur. Bu ödenekten 818.557.954 TL harcanarak 2025 yılında inşaatına devam edilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 4.114.483.232 TL olup, 2024 yıl sonu kümülatif harcama tutarı 2.757.851.499 TL'dir.

2025 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 74,41 olmuştur.





2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

3.1. Proje No: 2025K12-259962 – Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında, üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan %5 karşılığı ve Tezsiz yüksek lisans gelirlerinin %30'u ile 2025 yılı yatırım programında yatırım harcamaları için 21.697.000 TL ödenek tahmini yapılmış ve yıl içerisinde bu ödenek aktarılmıştır.

Böylece bilimsel projelerin desteklenmesi sağlanmıştır.

2025 yılı nakdi gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

3.2. Proje No: 2024K12-234049 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi

Söz konusu proje için 2025 yılı yatırım programında 10.000.000 TL ödenek öngörülmüş olup, yıl içerisinde yedek ödenekten 3.000.000 TL aktarılmış ve toplam bütçe ödeneği 13.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Bu ödenekten 9.972.099 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Projenin toplam tutarı 13.529.000 TL olup, 2024 yıl sonu itibarıyla kümülatif harcama 3.529.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı nakdi gerçekleşme oranı %76,70 olmuştur.



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV. Öneriler

Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri, yöresel ve iklimsel özellikler dikkate alınarak kurum tarafından uygun görülen talepler doğrultusunda uygulanmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Çok yıllık projelerde yıllık ödeneğin talep edilenden düşük tahsis edilmesi, yatırımların tamamlanma sürecini uzatmakta ve yatırım maliyetlerinin her yıl artmasına neden olmaktadır.

2025 Yılı Üniversitemiz Yatırımları Özet Tablosu

Proje Adı/ Tanıtımı	Kodu	Sektörü	İlçe	Proje Başlangıç Tarihi	Proje Tmm. Tarihi	Proje Durumu	Proje Tutarı/Maliyeti	2024 yılı Kümülatif Harcama	2025 Bütçesi	Eklenen	Düşülen	Toplam Bütçesi	2025 Harcaması
Hastane İnşaatı	2019I00- 109658	Sağlık	Merkez	2019	2027	Devam Ediyor	4.114.483.232	2.757.851.499	1.000.002.000	100.000.000	0	1.100.002.000	818.557.954
Muhtelif İşler	2025I00- 241819	Sağlık	Merkez	2025	2025	Tmm.	55.998.000	0	49.998.000	0	0	49.998.000	48.902.334
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2025H03 -258630	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2025	2025	Tmm.	1.000.000	0	1.000.000	7.000.000	0	8.000.000	1.575.839
Kampüs Altyapısı	2020H03 -152731	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2020	2025	Tmm.	43.300.000	18.300.000	25.000.000	0	0	25.000.000	24.943.379
Yayın Alımı	2025H03 -258628	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2025	2025	Tmm.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	9.975.892
Muhtelif İşler	2025H03 -258626	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2025	2025	Tmm.	44.000.000	0	44.000.000	23.000.000	0	67.000.000	61.047.148
Büyük Onarım	2024H03 -234210	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2024	2026	Devam Ediyor	245.000.000	135.000.000	100.000.000	35.000.000	10.000.000	125.000.000	93.516.749
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	2024K12 -234049	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	Merkez	2024	2025	Devam Ediyor	13.529.000	3.529.000	10.000.000	3.000.000	0	13.000.000	9.972.099
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2025K12 -259962	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	Merkez	2025	2025	Tmm.	21.697.000	0	21.697.000	0	0	21.697.000	21.697.000
TOPLAM							4.549.007.232	2.914.680.499	1.261.697.000	168.000.000	10.000.000	1.419.697.000	1.090.188.394
